

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Brasília, 15 de julho de 2026

Índice

1. INTRODUÇÃO	4
2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	4
2.1. Manutenção	4
2.1.1. Preditiva	4
2.1.2. Manutenção Preventiva	5
2.1.3. Manutenção Corretiva	5
a. Manutenção Emergencial	8
2.1.4. Furtos e Vandalismos	8
2.1.5. Ações de Melhorias	8
2.1.6. Projetos e Obras	9
2.1.6.1. Projetos de Expansão	9
2.4.6.2. Obras	10
2.1.7. Modernização	10
2.1.8. Resumo do Parque de Iluminação Pública por tipo e potência no mês	11
2.1.9. Receitas Acessórias	13
3. INDICADORES DE DESEMPENHO	13
3.1. Apuração dos Indicadores	14
3.1.1 Indicador de Pontos Aceso à Noite – IPAN	14
3.1.2 Indicador Iluminância e Uniformidade – IIL	14
3.1.3 Indicador de Temperatura de Cor – ITC	15
3.1.4 Indicador de Reprodução de Cor – IRC	15
3.1.5 Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização - ICL	15
3.1.6 Indicador da Conformidade da Potência Total - ICP	15
3.1.7 Indicador da Conformidade das Demais Informações do Cadastro - ICIC	16
3.1.8 Indicador de Pontos Apagados Durante o dia - IPAD	16
3.1.9 Indicador de Cumprimento do Tempo de Espera - ITM	17
3.1.10 Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão - IDST	17
3.1.11 Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão - IDFST	18
3.1.12 Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - IPOM	18
3.1.13 Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais – ICDM	19
3.1.14 Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços – ICRES	19
3.1.15 Indicador da Transparência da Concessão – ITC	20
3.1.16 Indicador de Eficientização - IE	21

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	21
------------------------------	----

1. INTRODUÇÃO

A CEB Iluminação Pública e Serviços - CEB IPES, prestadora dos serviços de iluminação pública no Distrito Federal, mediante CONTRATO DE CONCESSÃO publicado em 6 de dezembro de 2023, cuja outorga foi predeterminada pela Lei Distrital n.º 7.275, de 5 de julho de 2023, e regulamentada pelo Decreto Distrital n.º 45.033, de 4 de outubro de 2023.

O presente relatório mensal apresenta os resultados operacionais referentes à prestação dos serviços no Distrito Federal, no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme solicitado no Caderno de Encargos do Contrato de Concessão.

2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com o Caderno de Encargos do Contrato de Concessão de prestação de serviço de iluminação pública do Distrito Federal, a Concessionária deve apresentar o Relatório Mensal de Prestação de Serviço. Os dados apresentados contemplam as informações sobre as atividades executadas relacionadas as:

- I. Manutenção;
- II. Projetos e Obras;
- III. Modernização.

Os serviços de manutenção estão relacionados às atividades operacionais para manter a disponibilidade do parque de iluminação pública, enquanto os serviços de projetos e obras estão relacionados à expansão do parque e o item de modernização, à modernização do parque de iluminação pública.

2.1. Manutenção

Os serviços de manutenção podem ser classificados em:

- I. Manutenção Preditiva;
- II. Manutenção Preventiva;
- III. Manutenção Corretiva.

2.1.1. Preditiva

Por definição, a manutenção preditiva do sistema de iluminação pública é um conjunto de ações planejadas que utiliza tecnologias de monitoramento, análise de dados e sensores inteligentes para prever falhas, otimizar o desempenho do sistema e reduzir custos operacionais. A manutenção preditiva baseia-se no estado real dos equipamentos.

As principais atividades da Manutenção Preditiva são: inspeções remotas diárias via telegestão; Geração automática de relatórios de falhas potenciais; Medição e análise de parâmetros elétricos, buscando indícios de sobrecarga ou desgaste; Mapeamento de pontos críticos, como áreas com maior incidência de queimas; Planejamento de

intervenções baseado em risco e urgência; Atualizações de firmware de controladores e dispositivos inteligentes; Verificação da integridade de cabos, conectores e braços (em campo, conforme indicação de anomalias). Entretanto, a estrutura atual do parque de iluminação pública do Distrito Federal não permite a execução deste tipo de manutenção. Com a implantação da telegestão, esse tipo de manutenção fará parte das atividades da CEB IPES na gestão da manutenção da iluminação pública. A inserção da telegestão faz parte dos planos de investimento que estão em andamento na empresa.

2.1.2. Manutenção Preventiva


A **manutenção preventiva** é um conjunto de ações planejadas que busca evitar falhas antes que elas ocorram. Ela se baseia em **cronogramas regulares**, padrões de uso, recomendações do fabricante e análises históricas de desempenho dos equipamentos. A premissa fundamental é que todo ativo possui um ciclo de vida, sujeito a desgaste natural, e que intervenções periódicas reduzem a probabilidade de falhas repentinas.

No caso de sistemas de infraestrutura, como a iluminação pública, a manutenção preventiva engloba atividades como limpeza e inspeção das luminárias, substituição programada de componentes com vida útil conhecida, verificação dos níveis de isolamento, reaperto de conexões e testes de funcionamento. O objetivo é preservar o desempenho do sistema, garantir que as luminárias operem dentro dos parâmetros elétricos adequados e evitar interrupções do serviço

Manutenções preventivas podem também ter origem a partir de necessidades apontadas durante as manutenções corretivas, sendo que em alguns casos, são identificados cabos, quadros de comandos e/ou postes que necessitam de reparos mesmo estando em funcionamento, gerando Relatórios de Não Conformidade (RNC). No mês de junho, foram gerados 256 RNC's que foram tratados como manutenção preventiva.

2.1.3. Manutenção Corretiva


No mês de junho, tivemos 5.780 solicitações de serviços abertas nos Canais de Atendimento ao Cliente, para reparos na iluminação pública do Distrito Federal. Estas solicitações foram abertas nos quatro canais disponíveis, conforme distribuição mostrada no gráfico 1.

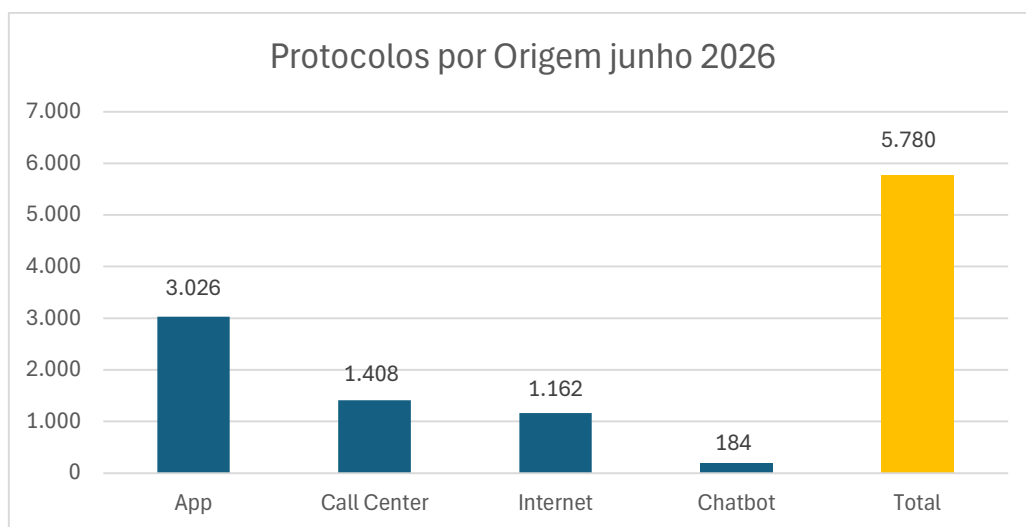

Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

Destas solicitações originaram-se ordens de serviço que, após atendimento inicial, tiveram os seguintes status: atendido, em atendimento ou pendente, conforme gráfico 2.

Gráfico 2: Status da Solicitação.

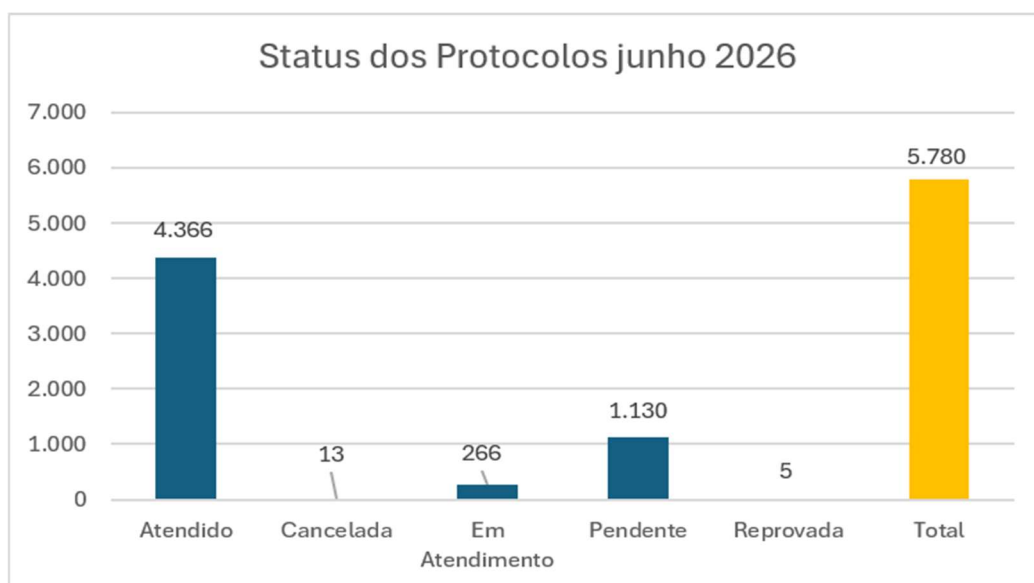


Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

A classificação "atendido" indica que houve atuação da equipe de manutenção com restabelecimento da iluminação pública. Nos casos "em atendimento", as equipes de manutenção geraram ordens de serviço, mas que ainda não foram concluídas até o período final deste relatório. Em 18 (dezoito) casos, os protocolos foram cancelados ou reprovados pelo sistema devido a inconsistências, e nos casos de "pendente", até o dia 30/06/2026 as solicitações ainda não haviam sido concluídas ou não foram geradas ordens de serviços.

Dos serviços executados no mês de junho/26


Em relação à execução dos serviços no mês de junho de 2026, foram registrados 5.799 atendimentos relacionados às solicitações de clientes, distribuídos conforme gráfico 3. Não são considerados nesse gráfico, atendimentos originados por ocorrências geradas pela CEB, Empreiteiras e canal ADM24hs.

Gráfico 3: Atendimentos por Origem de Solicitação – ref. junho/26.

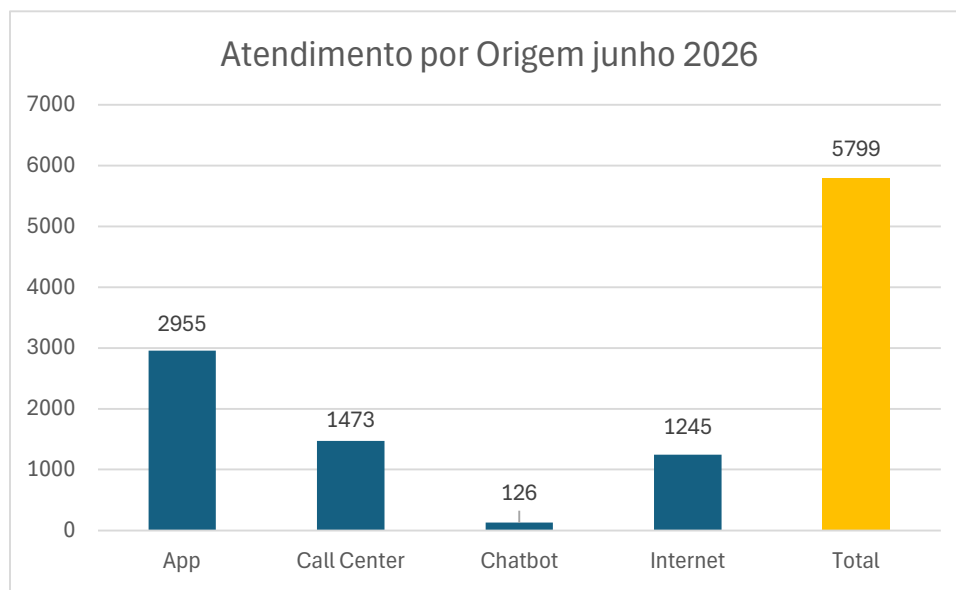

Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

Gráfico 4: Atendimentos – Acumulado 2026.

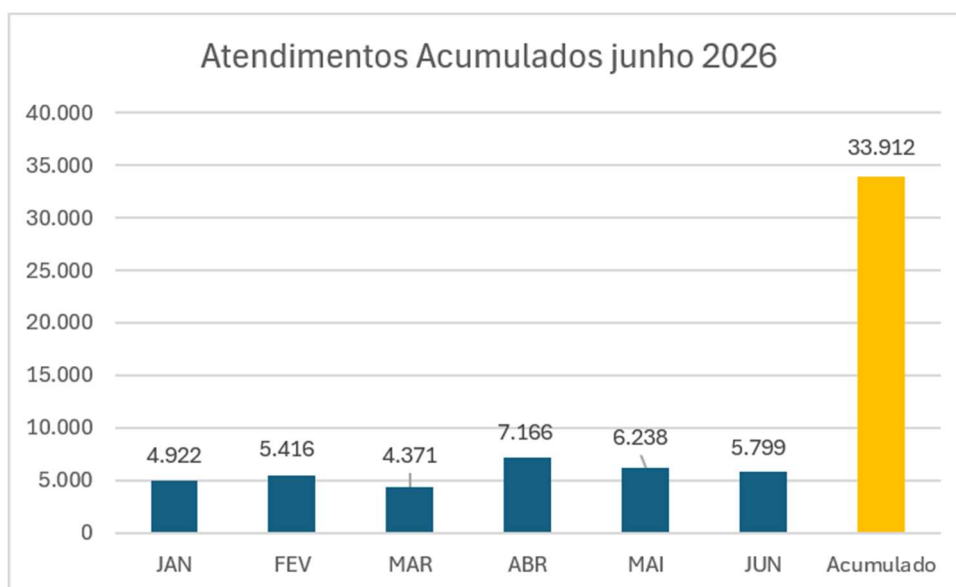


Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

a. Manutenção Emergencial

A manutenção emergencial é um tipo de manutenção corretiva, sendo que nestes casos, são reparos que exigem pronto atendimento. No mês de junho, foram registrados 160 atendimentos emergenciais, sendo 42 atendimentos a risco de choque elétrico, 17 atendimentos a fiação danificada, 48 atendimentos a fiação exposta, 17 em postes caídos e 36 em postes tortos ou danificados, conforme gráfico a seguir:

Gráfico 5: Manutenção Emergencial

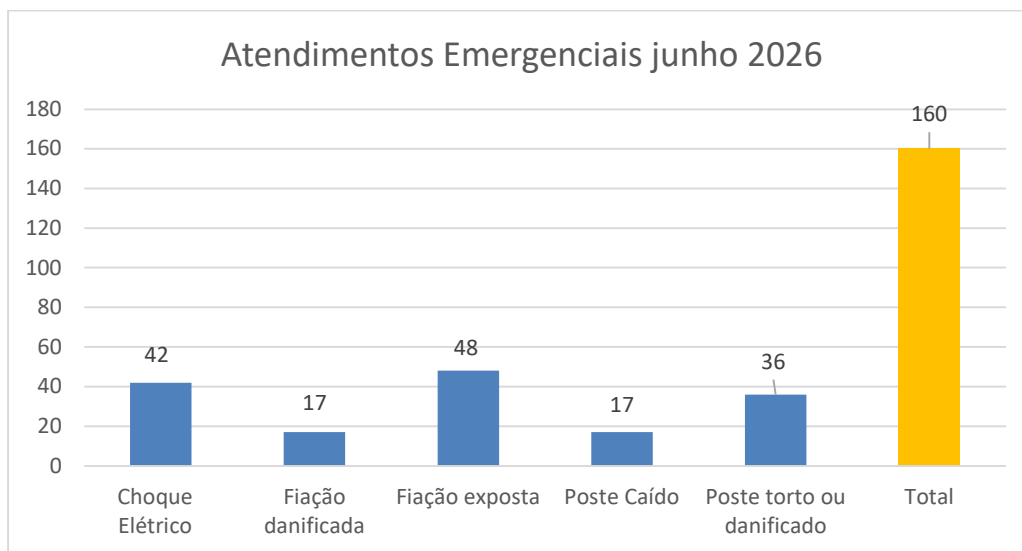

Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

2.1.4. Furtos e Vandalismos

Trata-se de crimes cometidos contra a infraestrutura do parque de iluminação pública do Distrito Federal, que além do prejuízo financeiro, prejudicam a prestação dos serviços de iluminação pública.

No mês de junho de 2026, foram furtados ou vandalizados 8.432 metros de cabo em todo o Distrito Federal. Esta ação danosa, traz prejuízo diretos e indiretos aos cofres públicos, prejudicando ainda a execução de outras demandas do sistema.

2.1.5. Ações de Melhorias

No decorrer do mês de junho de 2026, foram realizadas diversas ações de mutirão e de recuperação total ou parcial de iluminação pública em todo o Distrito Federal.

Essas ações vêm complementar as manutenções corretivas, visando a melhoria da qualidade de vida da população e maior segurança.

Tabelas dos principais pontos atendidos 06/2026		
Item	Endereço	local
1	EQN 109/110 209/210 Norte - TESOURINHAS	PLANO PILOTO
2	Quadra 4, Área Especial 2 - Vila Estrutural / DF - Área do CEM (Centro de Ensino Médio em construção)	ESTRUTURAL
3	Rua 3B - Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP)	VICENTE PIRES
4	DF-280 - Recanto Água Quente 15°55'23.6"S 48°10'05.6"W (-15.923232, -48.168232)	RECANTO DAS EMAS
5	Eixo Rodoviário Norte — Viaduto da Galeria do Trabalhador / Viaduto Próximo à Rodoviária Norte / Passagem Subterrânea da SQN Norte	PLANO PILOTO
6	VIADUTO DO SAAN / SMU NA EPIA NORTE	PLANO PILOTO
7	ST. E SUL CSE 06 ESTACIONAMENTO	TAGUATINGA
8	SQS 212/213 Sul, atrás da Igreja Universal	Plano Piloto
9	Lateral do Península	AGUAS CLARAS
10	SCIA Quadra 14/15 - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	GUARÁ - SCIA
11	SMLN MI 13, Conjunto 01	LAGO NORTE

Além dessas ações, foram executadas substituição de refletores de campos e quadras esportivas públicas, compondo o programa LED DÁ JOGO:

Led da Jogo

Ceilândia QNM 14, campo sintético da praça dos Eucaliptos

Ceilândia 02 quadras no Condomínio Privê

Ceilândia QNP 05, campo sintético

2.1.6. Projetos e Obras

2.1.6.1. Projetos de Expansão

Trata-se de projetos que possuem o objetivo de expandir o parque de iluminação pública do Distrito Federal.

Tabela 1: Quantidade de Pontos de Iluminação por Projeto no Mês.

Endereço	Região Administrativa	Qtd. De pontos por tipo de fonte de luz utilizada	Valor (Em R\$)	Valor (Em UC)
SINTETICO DO ALVORADA	GAMA (RA II)	30	R\$ 110.154,75	603,4200
PRAÇA DA QUADRA DE ESPORTES DA QN 07D	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	28	R\$ 51.962,08	409,3292
QUADRA 300 - CONJ. - 53 A 57	RECANTO DAS EMAS (XV)	15	R\$ 25.511,30	35,6451
CAMPO SINTÉTICO 26 DE SETEMBRO	VICENTE PIRES (RA XXX)	24	R\$ 69.231,90	515,2884
NÚCLEO RURAL SARANDÍ - PLANALTINA	PLANALTINA (RA VI)	46	R\$ 288.620,43	1.144,5045
RUAS NÚCLEO RURAL QUINTAS DO RIO MARANHÃO	PLANALTINA (RA VI)	210	R\$ 603.965,90	2.992,5777
CENTRO COMERCIAL TELEBRASILIA	PLANO PILOTO (RA I)	40	R\$ 104.486,97	683,6120
SETOR DE CHÁCARAS LÚCIO COSTA GUARÁ	SCIA/ESTRUTURAL (RA XXV)	59	R\$ 59.741,76	199,6301
QNN 16 CAMPO	CEILÂNDIA (RA IX)	5	R\$ 11.689,86	47,5675
Acesso da Policlínica do CBM até o Terminal Rodoviário Sul - Plano Piloto	PLANO PILOTO (RA I)	9	R\$ 24.130,20	304,7385
SETOR RESIDENCIAL DOROTHY STANG, DF 440, SOBRADINHO	SOBRADINHO (RA V)	169	R\$ 159.246,84	404,6798
VILA DO BOA	SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)	208	R\$ 123.897,93	545,5968
ESTACIONAMENTO ANEEL	PLANO PILOTO (RA I)	20	R\$ 69.621,79	504,8303
TOTAL		863	R\$ 1.702.261,70	8391,4199

Fonte: Diretoria de Planejamento e Engenharia

No mês de junho foram elaborados 13 projetos de expansão com previsão de instalação

de 863 novos pontos de iluminação.

2.4.6.2. Obras

No mês de junho, houve a conclusão de quatro orçamento *as built* de obra.

Tabela 2: Quantidade de Pontos de Iluminação por Obra no Mês.

Endereço	Região Administrativa	Qtd. De pontos por tipo de fonte de luz utilizada	Valor (Em R\$)	Valor (Em UC)
Acesso da Policlínica do CBM até o Terminal Rodoviário Sul -Plano Piloto	PLANO PILOTO (RA I)	9	R\$ 24.130,20	304,7385
SETOR RESIDENCIAL DOROTHY STANG, DF 440, SOBRADINHO	SOBRADINHO (RA V)	169	R\$ 159.246,84	404,6798
VILA DO BOA	SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)	208	R\$ 123.897,93	545,5968
ESTACIONAMENTO ANEEL	PLANO PILOTO (RA I)	20	R\$ 69.621,79	504,8303
TOTAL		406	R\$ 376.896,76	1759,8454


Fonte: Diretoria de Planejamento e Engenharia

No mês de junho foram executados 3 (três) obras de implantação de expansão com a previsão de instalação de 198 novos pontos de iluminação, considerando a utilização de créditos ordinários. E, ainda, foi executado 1 projeto de expansão (Vila Do Boa) com utilização de recursos de emenda parlamentar.

2.1.7. Modernização

No mês de junho, foram modernizadas 157 luminárias, sendo que a quantidade de luminárias modernizadas acumulada até o corrente ano atingiu o montante de 151.448.

Gráfico 6: Relatório Acumulado de Modernização

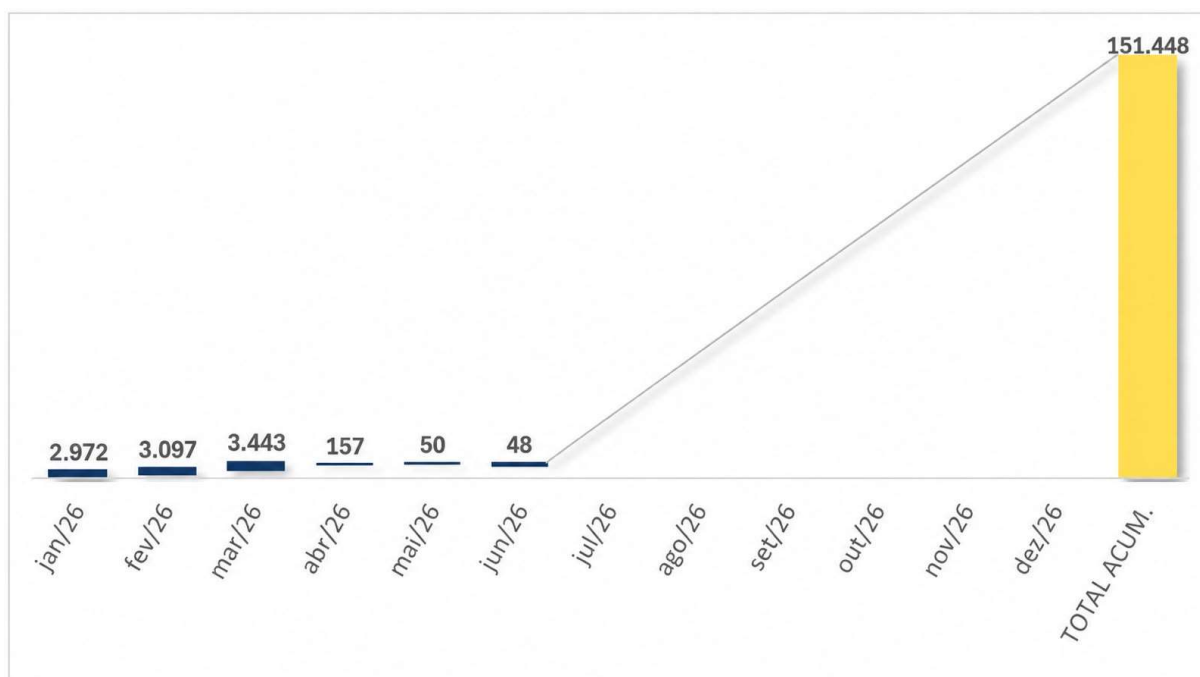

Fonte: Diretoria de Modernização e Obras

Até o mês de maio/25, a extração dos dados de modernização contidos no gráfico acima,

era realizada através do “Relatório Completo de Pontos Modernizados”, conforme figura 1, aplicando os seguintes filtros: No campo “Tipo Ponto de Serviço”, aplica-se “Ponto de IP”; e no campo, “Status”, aplica-se “Instalado”. Dessa forma, é possível gerar os dados e o relatório da modernização no período desejado. Neste caso, de janeiro/25 a junho de 2026.¹

A partir do mês de junho/25, está sendo utilizado o “Relatório de Modernização”, enviado pela Gerência de Modernização da CEB IPES, que consta no Relatório de Execução de Serviços. Compõe esse relatório as últimas modernizações realizadas pelas empreiteiras e validadas sob os aspectos técnicos e contratuais pela equipe CEB.

Figura 1: Relatório Completo de Pontos Modernizados – junho/26 (SCG/EXATI)

Relatório completo de pontos modernizados

Relatório

Ajuda

Parque de Serviço

Brasília

Busca

Agrupamento

Por ponto de serviço

T

Q

Total de pontos: 264.805

Total de pontos modernizados: 1.803

Total de pontos luminosos modernizados: 2.501

Porcentagem modernizada: 0.68%

Total de pontos luminosos pré-modernização: 2.344

Carga total anterior: 444.781

Carga total após última modernização: 391.154

Redução de carga última: 12.06%

Número de Identificação	Descrição Obra	Região	Bairro	Endereço	Latitude	Longitude	Atendimento última modernização	Data última modernização	Hora última modernização	Responsável última modernização	Diferença última modernização	Quantidade anterior	Tipo de lâmpada anterior	Potência da lâmpada anterior
*171193		PLANO PILOTO	Plano Piloto	Shigs 705 Bloco R, Casa 20, Asa Sul	-15.8059778056	-47.9016674722	912670	22/06/2026	13:56:37	Centro- Solo Leve 5	1	1	LED	54
*309833		NÚCLEO BANDEIRANTE	Núcleo Bandeirante	Segunda Avenida Bloco 720, Casa 8, Núcleo Bandeirante	-15.8684245278	-47.9682395278	912645	22/06/2026	12:21:52	Oeste- RH-ML02	1	2	LED; LED	40; 40
*309862		SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	Sol Nascente/Pôr Do Sol	Sh Sol Nascente Cond Chac 92b	-15.8221443056	-48.1332742222	914098	26/06/2026	11:00:36	Oeste- RH-MP01	1	1	Sódio	150
*309863		SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	Sol Nascente/Pôr Do Sol	Sh Sol Nascente Cond Chac 92b	-15.8222881944	-48.1334442222	Por escritório	29/06/2026		flavio.h	1	1	Sódio	150
*309906		SOBRADINHO II	Sobradinho II	Sh Boa Vista Df 001 Km 132, Banca Quiosque, Sobradinho II	-15.6867892778	-47.8604573889	909123	11/06/2026	08:10:29	Leste- Equipe Extra Leve 16	2	1	Sódio	150
*309908		SOBRADINHO II	Sobradinho II	Sh Boa Vista Df 001 Km 132, Banca Quiosque, Sobradinho II	-15.6867411389	-47.8600918889	909122	11/06/2026	08:01:30	Leste- Equipe Extra Leve 16	1	2	LED; LED	54; 241

(período 01/6/2026 a 30/06/2026 - Extraído do Exati em 15/06/2026)

Destacamos que a diferença entre o quantitativo apresentado no Gráfico 6 e na Figura 1, refere-se a ações das equipes de manutenção, devendo ser considerado na apuração dos pontos modernizados, os quantitativos constantes no Gráfico 6, os quais estão sendo apresentados formalmente para apuração do Fator de Modernização e Eficientização (FME).

2.1.8. Resumo do Parque de Iluminação Pública por tipo e potência no mês

Segue, abaixo, o resumo do parque de IP por tipo e potência no mês, cadastrado no SCG, em 05 de junho de 2026, data-base do faturamento do consumo de energia elétrica do Parque de Iluminação Pública:

¹ Para extração do Relatório de Modernização no EXATI, é preciso expurgar as luminárias não LEDs (Sódio e Vapor Metálico) e os campos vazios, na coluna “Tipo de lâmpada última modernização”. Verificou-se que, a área técnica de manutenção estava atualizando o cadastro como modernização (Código, MOD), alguns serviços de manutenção. A área já foi orientada para ajustar o procedimento.

Tabela 3: Resumo do parque de IP por tipo e potência no mês

Tipo Lâmpada	POT. UNIT. (W)	PERDA REATOR (W)	POT. UNIT. TOTAL (W)	Quant. Final	POT. TOTAL (W)
VS 70	70	14	84	6	504
VS 400	400	38	438	132	57.816
VS 250	250	30	280	62	17.360
VS 150	150	22	172	100	17.200
VS 100	100	17	117	16	1.872
VM 400	400	40	440	35	15.386
VM 250	250	28	278	35	9.723
VM 2000	2.000	100	2.100	52	109.200
VM 150	150	18	168	393	66.024
VM 1000	1.000	50	1.050	17	17.850
LED 80	80	-	80	2.429	194.320
LED 76	76	-	76	69	5.244
LED 75	80	-	80	2	160
LED 72	72	-	72	11.679	840.888
LED 70	70	-	70	68.452	4.791.640
LED 68	68	-	68	1.215	82.620
LED 600	600	-	600	822	493.200
LED 60	60	-	60	281	16.860
LED 55	55	-	55	400	22.000
LED 54	54	-	54	1.367	73.818
LED 52	52	-	52	1	52
LED 500	50	-	50	16	800
LED 50	50	-	50	79	3.950
LED 480	480	-	480	29	13.920
LED 45	45	-	45	535	24.075
LED 400	400	-	400	72	28.800
LED 40	40	-	40	19.798	791.920
LED 36	36	-	36	257	9.252
LED 314	314	-	314	1.071	336.294
LED 305	305	-	305	569	173.545
LED 304	304	-	304	1	304
LED 303	303	-	303	17	5.151
LED 280	280	-	280	86	24.080
LED 271	271	-	271	1	271
LED 267	267	-	267	229	61.143
LED 254	254	-	254	3	762
LED 250	250	-	250	4	1.000
LED 248	248	-	248	13	3.224
LED 245	245	-	245	11.221	2.749.145

LED 244	244	-	244	6.415	1.565.260
LED 241	241	-	241	9.253	2.229.973
LED 240	240	-	240	43.273	10.385.520
LED 220	220	-	220	58	12.760
LED 215	215	-	215	22.130	4.757.950
LED 214	214	-	214	2	428
LED 205	205	-	205	20	4.100
LED 202	202	-	202	64	12.928
LED 201	201	-	201	145	29.145
LED 200	200	-	200	188	37.600
LED 180	180	-	180	118	21.240
LED 18	18	-	18	662	11.916
LED 163	163	-	163	8	1.304
LED 161	161	-	161	4	644
LED 160	160	-	160	1.850	296.000
LED 153	153	-	153	1	153
LED 150	150	-	150	31.469	4.720.350
LED 120	120	-	120	75.673	9.080.760
LED 115	115	-	115	281	32.315
LED 111	111	-	111	43	4.773
LED 110	110	-	110	13.196	1.451.560
LED 100	100	-	100	2.125	212.500
Total				327.277	45.733.586

2.1.9. Receitas Acessórias

São receitas obtidas por meio de atividades relacionadas ao objeto do Contrato de Concessão.

No mês de Junho/26 não houve a celebração de Contrato de Receita Acessória.

3. INDICADORES DE DESEMPENHO

O Contrato de Concessão pressupõe a prestação de serviço adequado aos usuários, sendo considerado serviço adequado aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade da contraprestação.

Diante disso, o Contrato de Concessão possui como Anexo IV – Indicadores de Desempenho, um documento que tem por objetivo estabelecer os parâmetros de qualidade e desempenho dos serviços a serem atendidos pela CEB IPES.

Esses parâmetros de qualidade e desempenho serão aferidos através da avaliação de um conjunto de “Indicadores de Desempenho”, que compõem o “Sistema de Mensuração de Desempenho – SMD”.

A avaliação será realizada por meio do cálculo do Índice de Desempenho Geral – IDG,

composto por 05 (cinco) critérios de desempenho específicos, sendo:

- Critério de Disponibilidade (CD) – avalia a disponibilidade da iluminação pública;
- Critério de Qualidade (CQ) – avalia a qualidade dos serviços prestados e os níveis de iluminação;
- Critério de Operação (CO) – avalia a disponibilidade da infraestrutura e a prestação dos serviços, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos para a sua execução;
- Critério de Conformidade (CC) – avalia o atendimento aos prazos e requisitos exigidos para a apresentação de certificados e relatórios; e,
- Critério de Eficientização (CE) – avalia os níveis de eficiência energética atingidos pela CEB IPES.

3.1. Apuração dos Indicadores

3.1.1 Indicador de Pontos Acesos à Noite – IPAN

Compõe o Critério de Disponibilidade (CD), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade de Luz (IDL)”.

Visa apurar se os pontos de iluminação pública estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente acesos durante a noite.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal.

3.1.2 Indicador Iluminância e Uniformidade – IIL

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)”.

Visa apurar se um ponto de iluminação pública modernizado verificado atende ao nível de Iluminância e Uniformidade para as classes de iluminação das vias de veículos e pedestres.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal.

3.1.3 Indicador de Temperatura de Cor – ITC

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)”.

Visa apurar se um ponto de iluminação pública modernizado verificado atende ao nível de Temperatura de Cor.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal.

3.1.4 Indicador de Reprodução de Cor – IRC

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)”.

Visa apurar se um ponto de iluminação pública modernizado verificado atende ao nível de índice de Reprodução de Cor.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal.

3.1.5 Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização - ICL

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Qualidade de Dados (IQD)”.

Visa apurar a conformidade da caracterização da localização (logradouro, bairro, número do ponto de iluminação pública e posição georreferenciada), através do comparativo entre os dados do cadastro da rede distrital de iluminação pública e a informação verificada *in loco*.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliado somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.6 Indicador da Conformidade da Potência Total - ICP

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Qualidade de Dados (IQD)”.

Visa apurar a conformidade da potência total do ponto de iluminação pública, através do comparativo entre os dados do cadastro da rede distrital de iluminação pública e a informação verificada *in loco*.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliado somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.7 Indicador da Conformidade das Demais Informações do Cadastro - ICIC

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Qualidade de Dados (IQD)”.

Visa apurar a conformidade de algumas informações (caracterização, modelo da luminária, tecnologia da lâmpada, tipo de poste, altura de instalação da luminária, tipo de braço, quantidade de pontos, tipo de rede) do cadastro dos pontos de iluminação pública, através do comparativo entre os dados do cadastro da rede distrital de iluminação pública e a informação verificada *in loco*.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliado somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.8 Indicador de Pontos Apagados Durante o dia - IPAD

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Acendimento Diurno (IAD)”.

Visa apurar se o ponto de iluminação pública está efetivamente apagado durante o dia, conforme verificação *in loco* ou pela telegestão.

Mensuração: Erro! Vínculo não válido. Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal. Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados - IDSGC

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC)”.

Visa apurar se a central de atendimento operada pela CEB IPES está disponível de forma

ininterrupta para o recebimento de chamados.

Mensuração:

Figura 1: IDSGC – Sistema Exati



Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados (IDSGC)		
Data inicial: 01/06/2026 Data final: 23/06/2026		
Nome		
Tempo total previsto para o período	Valor: 502,00 h	Tempo em minutos: 30120 min
Tempo total de disponibilidade do sistema	581,85 h	34911 min
Tempo total de indisponibilidade do sistema	0,35 h	21 min
IDSGC calculado = (Tempo total de disponibilidade do sistema / Tempo total previsto para o período)	100,00%	
IDSGC	1,00	

3.1.9 Indicador de Cumprimento do Tempo de Espera - ITM

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC)”.

Visa apurar o tempo de espera das chamadas a partir da entrada da chamada até a transferência para o atendente, tendo o prazo máximo como 60 segundos.

Mensuração:

O indicador de cumprimento do tempo de espera (*call center*) calculado em função dos dados do sistema EXATI foi de 100 %, sendo que das 2.733 chamadas registradas no citado sistema, 2.718 foram atendidas antes de 60 segundos.

Figura 2 - ITM – Sistema Exati



Indicador de Cumprimento do Tempo de Espera (ITM)		
Data inicial: 01/06/2026 Data final: 30/06/2026		
Nome		
Total de chamadas atendidas dentro do tempo de espera (Ata EOs)	2718	
Total de chamadas atendidas via call center	2733	
ITM calculado = (Total de chamadas atendidas dentro do tempo de espera (Ata EOs) / Total de chamadas atendidas via call center)	100,00%	
ITM	1,00	

3.1.10 Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão - IDST

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT)”.

Visa apurar se o sistema de telegestão (número de pontos de iluminação telegerenciáveis) implantado pela CEB IPES, bem como suas funcionalidades básicas estão disponíveis de forma ininterrupta.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe

ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal.

Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliados somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.11 Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão - IDFST

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT)”.

Visa apurar se o sistema de telegestão (número de pontos de iluminação telegerenciáveis) implantado pela CEB IPES, bem como suas funcionalidades básicas estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento. Devem ser observadas, minimamente, as seguintes funcionalidades: conformidade entre a localização geográfica e a verificada *in loco*, conformidade entre o *status* dos dispositivos, registro atualizado do consumo de energia e operação remota via sistema de telegestão.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliados somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.12 Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - IPOM

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Cumprimento dos Prazos (ICP)”.

Visa apurar se os prazos para solução dos chamados de manutenção corretiva estão sendo cumpridos pela CEB IPES.

Mensuração:

Figura 3 - IPOM – Sistema Exati



The screenshot displays the 'Índice de Cumprimento dos Prazos - ICP/IPOM Resumido' report in the Exati system. The interface includes filters for 'Data Inicial' (01/04/2026) and 'Data Final' (30/06/2026). The report table shows the following data:

Nome	Valor	Porcentagem
Total de chamados	5751	100.00%
Total de chamados atendidos no prazo	2344	40.76%
Total de chamados fora do prazo	3407	59.24%
IPOM calculado = (Total de chamados atendidos no prazo / Total de chamados)	0.41	41.00%
Nota IPOM	0.20	
Nota ICP = (Peso IPOM (1.0) x Nota IPOM)	0.20	

At the bottom, there is a 'Filtrar resultados' button and a pagination indicator showing '15' items per page, '1' of 5 pages.

Na emissão do indicador deste mês, foi efetuada adequação ao texto do contrato de concessão, sendo desconsiderados protocolos originados de inspeções de controle interno da CEBIPES.

3.1.13 Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais – ICDM

Compõe o Critério de Conformidade (CC), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Conformidade dos Certificados (ICC)”.

Visa apurar a conformidade do tratamento e descarte dos materiais, sendo avaliado através da apresentação de certificado válido e expedido por empresa credenciada e autorizada, de descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes retirados da rede de iluminação pública.

Mensuração:

Figura 12 - ICDM e ICC – Sistema Exati



Descrição	Data entrega	Em conformidade	Tem anexo
Certificado de Descarte de Material - DMT 06/2026	01/06/2026	Sim	Sim
Certificado de Descarte de Material - ENG 06/2026	01/06/2026	Sim	Sim
Certificado de Descarte de Material - SOL 06/2026	01/06/2026	Sim	Sim

Os atuais contratos estabelecem que a gestão e o descarte dos materiais poluentes são de responsabilidade das Contratadas, conforme abaixo:

- Contrato de Obras: Engeluz Iluminação e Eletricidade;
- Contratos de Manutenção: Engeluz Iluminação e Eletricidade, Diamante Engenharia, RH Engenharia e Real Energy.
- Contrato de Reposição: Diamante Engenharia;
- Contratos de Modernização: RH Engenharia.

A CEB IPES faz o acompanhamento dos quantitativos retirados do parque de iluminação pública, a fiscalização do acondicionamento nas instalações das Contratadas e a certificação do correto descarte. As Contratadas acondicionam os materiais poluentes em caixas apropriadas, conforme o estado de conservação do resíduo, até serem entregues à empresa credenciada

3.1.14 Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços – ICRES

Compõe o Critério de Conformidade (CC), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Conformidade das Informações (ICI)”.

Visa apurar se o Relatório de Execução dos Serviços está sendo entregue dentro do prazo e seguindo as exigências do Anexo I – Caderno de Encargos.

Mensuração:

Figura 2 – ICRES – Sistema Exati



Nome	Valor
Certificados conformes	1
Certificados não conformes	0
Certificados esperados no período	1
ICRES = (Certificados conforme / Certificados esperados no período)	1.00

Filtrar resultados

Linhas por página: 15 (1-5 de 5)

Certificados

Novo certificado

Descrição	Data entrega	Em conformidade	Tem anexo
ICRES Q2 - Junho 2026	01/06/2026	Sim	Sim

(Extraído do Exati em 10/07/2026)

Conforme demonstrado na “Figura 2 – ICRES – Sistema Exati”, do total de relatórios entregues no período, 100% foi considerado como “conforme”, resultando assim em uma “Nota ICRES” igual a “1”, de acordo com os critérios definidos no item 6.3.1 do Anexo IV – Indicadores de Desempenho.


3.1.15 Indicador da Transparência da Concessão – ITC

Compõe o Critério de Conformidade (CC), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Conformidade das Informações (ICI)”.

Visa apurar se o processo de transparência da Concessão foi realizado conforme detalhamento previsto no item 3.21 do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, o qual prevê que, a CEB IPES deve divulgar, minimamente, os seguintes documentos: relatório trimestral de desempenho, ofícios de aprovação emitidos pelo Poder Concedente, Contrato de Concessão e Termos Aditivos, Contratos de atividades relacionadas e demonstrações financeiras.

Mensuração:

Figura 3 – ITC – Sistema Exati

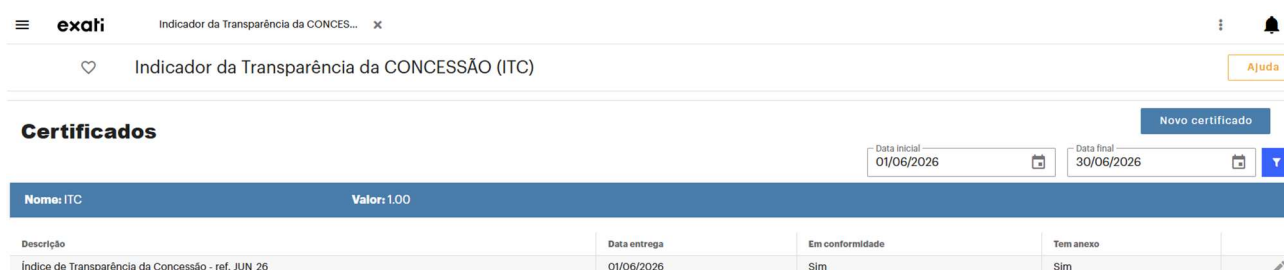

Nome	Valor
Nome: ITC	Valor: 1.00

Certificados

Novo certificado

Descrição	Data entrega	Em conformidade	Tem anexo
Índice de Transparência da Concessão - ref. JUN_26	01/06/2026	Sim	Sim

Extraído do Exati em 10/07/2026)

Conforme demonstrado na “Figura 3 – ITC – Sistema Exati”, o processo de transparência da Concessão foi devidamente cumprido, resultando assim em uma “Nota ITC” igual a “1”, de acordo com os critérios definidos no item 6.3.2 do Anexo IV – Indicadores de Desempenho.

3.1.16 Indicador de Eficientização - IE

Compõe o Critério de Eficientização (CE), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Eficientização (IE)”.

Visa apurar o cumprimento dos níveis mínimos de eficientização, conforme os Marcos da Concessão definidos no Anexo I – Caderno de Encargos.

Mensuração:

Não há mensuração no período de execução.

Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliados somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório Mensal de Serviços é uma obrigação do Contrato de Concessão. Este documento refere-se ao mês de junho de 2026, mas possuindo alguns dados de meses anteriores.

Cumpre salientar que as luminárias de LED para manutenção e eficientização estão sendo entregues por lote, passando por ensaios de recebimento junto a laboratório credenciado antes da aplicação no parque de iluminação pública.

Por fim, junto a este Relatório, enviamos uma planilha em Excel com os dados completos dos protocolos abertos durante o mês, em atendimento ao item 4.1.5 do Caderno de Encargos da Concessionária.

Relatório Mensal de Execução de Serviços de Iluminação Pública

Tabela 8: Quantidade Diária dos Protocolos por Reclamação (item 7.4.9 – b) no Mês de junho de 2026, canais utilizados pelo cidadão.

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Dia	05 ou mais pontos acesos de dia em sequência	05 ou mais pontos apagados de noite em sequência	Choque Elétrico	Fiação danificada	Fiação exposta	Luminária Acesa Durante o Dia	Luminária Apagada Durante a Noite	Luminária com baixa intensidade	Luminária Furtada/Vandalizada	Luminária Oscilando	Poste Caído	Poste torto ou danificado	Remoção de poste de iluminação pública	Reposição Cabo Preventivo	Totais
1	1	52	6		1	8	116	2	1	3	1	3			194
2		85	5		1	3	180	1	5	3		1			284
3	1	54	1		5	2	126	5	1	6	1	2		1	205
4	2	67			1	3	84	3	2	1		2			165
5		31	2			3	89	1	1	8		1			136
6	1	63			1	3	54	3	1	6	2				134
7		25			1		68	2	1	6					103
8	9	81	3		3	5	149	3	2	7	2	2		13	279
9	1	60			3	2	105		1	9	1				182
10	3	62	1			2	170	6	1	8	2	3			258
11	3	58	1		1	1	118			1	2	1			186
12	1	44	1		4	1	100	1	3	4	2	2			163
13		46	2		4	1	56					1			110
14	2	58	2		2	1	95	1	2	2	1				166
15	5	114			2	1	160	2		6	1				291
16	1	112	7			4	159	2	2	8		6	1		302
17	5	104	5		3	3	219	11	2	8		2			362
18	3	69	2			4	163	1	5	7		4			258
19	3	62	1	1	1	2	115	4	2	5	2	1	1		200
20	3	26		1	1	5	141	3		2		2			184
21		39			1	1	88			5					134
22	3	80	1	1	2		125	1		8	1	1	1		224
23	2	66		1	4	2	131	2	2	8	3	1			222
24	1	22	2		1	6	69	2		1	1	1	1	1	108
25	1	69			6	9	113	3	3	4				3	211
26	2	55	1	1		4	129		1	11	2	2			208
27	1	24			1	1	57	3	1	1			1		90
28	1	29				1	42			1					74
29		22	2	1	1	1	51			7		2			87
30	2	78	4			1	157	11		5	1	1			260
Total	57	1.757	49	6	50	80	3.429	73	39	151	25	41	5	18	5.780

Tabela 9: Material Utilizado (item 7.4.9 – g) no mês de junho de 2026

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL			
RELATÓRIO DE ATIVIDADES			
Materiais Utilizados			
		Mês de Referência:	junho/2026
#	Descrição sucinta	Quantidade	Unidade
1	Cabo de cobre isolado 2x4 mm ²	6.119	metro
2	Cabo de cobre isolado 10mm ²	3.333	metro
3	Cabo de cobre isolado 4x16 mm ²	3.221	metro
4	Cabo de cobre isolado 4x10 mm ²	2.956	metro
5	Luminária LED	1.872	unidade
6	Eletroduto corrugado DN 63	1.826	metro
7	Cabo de cobre isolado 16mm ²	1.597	metro
8	Cabo multiplexado de alumínio trifásico e neutro 10mm ²	1.554	metro
9	Cabo de cobre isolado 4x4 mm ²	1.486	metro
10	Conector Perfurante- Subterrâneo Cdp 150-35	1.245	unidade
11	Luminária LED e relé fotocontrolador	1.070	unidade
12	Relé fotocontrolador	1.021	unidade
13	Cabo multiplexado de alumínio trifásico e neutro 16mm ²	975	metro
14	Conector de Derivação Perfurante	764	unidade
15	Cabo de cobre isolado 4x25 mm ²	399	metro
16	Eletroduto Rígido DN 25	65	metro
17	Cordoalha de aço 5,10mm	32	unidade
18	Cabo de cobre isolado 35 mm ²	20	metro
19	Braço longo para Luminária 3,595m	18	unidade
20	Quadro de comando QIOT ou QIPA	17	unidade
21	Cabo de cobre isolado 35mm ²	10	metro
22	Conector grampo metálico - 3/4 - 50mm ²	5	unidade
23	Haste de aterramento em aço 3m	5	unidade

1. Introdução

Trata-se de relatório do BANCO DE CRÉDITO do mês acima referenciado.

Conforme o que determina o CONTRATO DE CONCESSÃO de Iluminação Pública do Distrito Federal, no seu Anexo I - Caderno de Encargos, o BANCO DE CRÉDITO é o saldo de créditos disponível para serem utilizados nas seguintes atividades: "novos pontos luminosos em decorrência do crescimento vegetativo, remanejamento de pontos de iluminação, com ou sem reaproveitamentos de postes, trocas e manutenção dos pontos luminosos em decorrência do crescimento vegetativo e trocas e manutenção devido a vandalismo".

Na DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO, em 25/03/2024, foram adicionados ao BANCO DE CRÉDITO o montante de **26.272 UNIDADES DE CRÉDITO (UC)**, sendo 16.871 UC para uso em projetos de expansão e 9.402 UC para uso em correção de vandalis, remanejamento de rede de IP e reposição de ativo. A cada data de aniversário do CONTRATO, serão adicionados um determinado número de unidades de créditos ao BANCO DE CRÉDITO, determinado no Contrato de Concessão e calculados a partir das estimativas de crescimento vegetativo e vandalismo no Parque de IP do DF.

O item 11.1.3 do Caderno de Encargos, Anexo I do Contrato de Concessão, determina que "os serviços de expansão e remanejamento do parque de iluminação pública, bem como das correções dos danos provocados por vandalismo, serão medidos para uso do saldo do BANCO DE CRÉDITOS. As medições serão realizadas utilizando-se da Planilha de Preços Unitários da Tabela 37. Os preços unitários da planilha são determinados em UNIDADE DE CRÉDITO".

Em 31/07/2024, os técnicos da CEB IPES e da SODF emitiram uma Nota Técnica Conjunta (SEI/GDF 147367449) intitulada "Procedimento de Uso do Banco de Crédito - Contingenciamento de serviços e materiais faltantes" onde recomendam a "manutenção da execução dos serviços cobertos pelo BANCO DE CRÉDITO com realização de contingenciamento dos custos dos serviços e materiais faltantes da Tabela 37, bem como dos serviços com distorção considerável de valor, para fins de futuro ressarcimento".

Em 29/05/2025 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão (ID SEI 172102180) alterando a Tabela 37 do Caderno de Encargos, com inclusão de novos serviços e materiais no Banco de Créditos, conforme ANEXO D do referido Aditivo. Em 14/11/2025, foi assinado o Termo de Reratificação do Primeiro Aditivo (ID SEI 184008639) com os valores corrigidos das unidades de crédito dos serviços constantes da Tabela 37.

Assim, o presente relatório apresenta a Memória de Cálculo do saldo do BANCO DE CRÉDITO no mês de referência, **considerando a Tabela 37 atualizada** conforme parágrafo acima, as listas de eventos de uso dos créditos.

2. Uso no mês de jun/2026

As Unidades de Créditos são utilizadas no mês para 4 tipos de eventos, conforme determina o contrato: (i) execução de projetos de expansão; (ii) correção de danos no sistema de iluminação pública provocado por vandalismo; (iii) remanejamento de sistemas de iluminação pública solicitados; e (iv) reposição de sistemas de iluminação pública solicitados.

Nos subitens abaixo, apresentamos os valores dos usos dos créditos ordinários, calculados a partir dos itens da Tabela 37 do Caderno de Encargos, Anexo I do Contrato de Concessão, atualizada pelo aditivo, dos eventos que ocorreram no mês de referência e acumulados desde a data de eficácia.

2.1. Créditos Ordinários Realizado

Na tabela abaixo podem ser observados os valores dos usos dos créditos ordinários, calculados a partir dos itens da Tabela 37 do Caderno de Encargos, Anexo I do Contrato de Concessão, bem como os saldos inicial e final do Banco de Crédito no mês de referência.

REALIZADO	Saldo Inicial no Mês	Executado no Mês	Saldo Acumulado Mês
Projetos de Expansão Executado	8.948,5111 UC	(1.214,2486 UC)	7.734,2625 UC
Van/Rem/Rep Atestado pelo PC	(2.269,2818 UC)	(4.106,3476 UC)	(6.375,6294 UC)
Totais	6.679,2293 UC	(5.320,5962 UC)	1.358,6331 UC

Os usos dos **créditos ordinários acumulados** desde a data de eficácia do Contrato de Concessão são:

ACUMULADO	Saldo Início Período	Usos Acumulado até Mês	Saldo Final
Projetos de Expansão Executado	17.285,9452 UC	(9.551,6827 UC)	7.734,2625 UC
Van/Rem/Rep Atestado pelo PC	9.401,8466 UC	(15.777,4760 UC)	(6.375,6294 UC)
Totais	26.687,7918 UC	(25.329,1587 UC)	1.358,6331 UC

2.2 Créditos Negativos com Necessidade de Recomposição Financeira

Conforme previsto no Contrato de Concessão e no Caderno de Encargos (Anexo I – Tabela 37), cada Unidade de Crédito – UC possui um valor unitário monetário, atualizado periodicamente. Quando o saldo de créditos ordinários resulta negativo, identifica-se que o consumo das UC superou o limite disponível no período, caracterizando a necessidade de recomposição financeira pelo Poder Concedente, de forma a restabelecer o equilíbrio do Banco de Créditos da Concessão.

Valor unitário da Unidade de Crédito em jun/2026 é de: **R\$ 337,84/UC**

	Excedente no Mês (R\$)	Acumulado até o Mês (R\$)
Expansões, Vandalismos, Reposições e Remanejamentos	0,00	0,00
Totais	0,00	0,00

3. Quadro de Serviços com Uso do Banco de Crédito em jun/2026


Os serviços realizados durante o mês de referência estão sintetizados nos dados abaixo e podem ser encontrados em listas detalhadas nos Anexos II a III.

Anexo	Evento	Qt Serviços	Qt Luminárias	UC Ordinárias
Anexo II - EXPANSÃO - Lista de Obras Concluídas no Mês		3 Projetos	198 Lumin	1.214,2486 UC
Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês		51 Serviços	N/A	4.106,3476 UC

4. Fluxo de Processos

Abaixo está representado o fluxo de atividades para execução dos Projetos de Expansão desde o recebimento da solicitação até a conclusão da obra e elaboração do "as built" e emissão do orçamento definitivo. Vale ressaltar que as unidades de crédito que cobrem os custos de investimentos da obra são contabilizados no Banco de Crédito após a aprovação do projeto e orçamento de referência pelo Poder Concedente.

Após a emissão do orçamento definitivo, após a conclusão da obra, a diferença para o orçamento prévio (a maior ou menor) é contabilizada no Banco de Crédito, finalizando a contabilização do projeto.

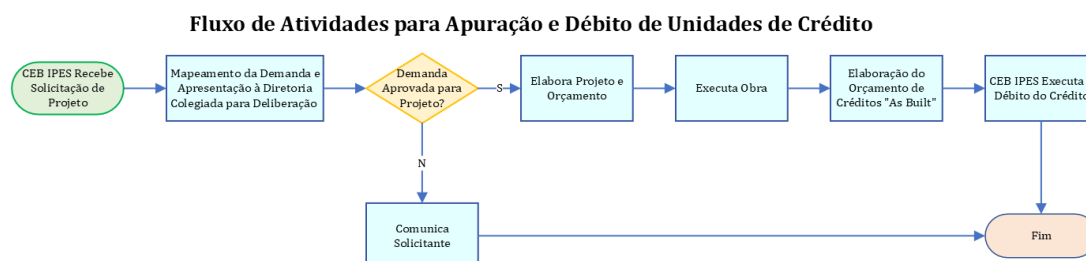

5. Lista de Anexos

Anexo I - Evolução do Banco de Crédito

Anexo II - EXPANSÃO - Lista de Obras Concluídas no Mês

Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês

Emissão:
Wires Santos Amorim
Gerente de Planejamento e Orçamento de Engenharia
CEB IPES

Aprovação:
Mauro Landim
Diretor de Planejamento e Engenharia
CEB IPES

Anexo I - Evolução do Banco de Crédito

A. CREDITOS ORDINÁRIOS ACUMULADOS

	Projetos Expansão	Van/Rem/Rep	Consolidado Geral
Saldo Inicial	17.285,9452 UC	9.401,8466 UC	26.687,7918 UC
Realizado	9.551,6827 UC	15.777,4760 UC	25.329,1587 UC
Saldo Final	7.734,2625 UC	(6.375,6294 UC)	1.358,6331 UC

B. CREDITOS ORDINÁRIOS REALIZADOS

BANCO DE CRÉDITO ORDINÁRIO REALIZADO						
BC >>	PROJETOS DE EXPANSÃO		VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO		CONSOLIDADO	
Novos Créditos >>	Novo Crédito	Saldo Anterior	Novo Crédito	Saldo Anterior	Novo Crédito	Saldo Anterior
	17.286 UC	0,0000 UC	9.402 UC	0,0000 UC	26.688 UC	0,0000 UC
Mês	Executado	Saldo	Executado	Saldo	Realizado	Saldo
Total >>	9.551,6827 UC	17.285,9452 UC	15.777,4760 UC	9.401,8466 UC	25.329,1587 UC	26.687,7918 UC
abr/2026	8.337,4341 UC	8.948,5111 UC	6.451,4361 UC	2.950,4105 UC	14.788,8702 UC	11.898,9216 UC
mai/2026	0,0000 UC	8.948,5111 UC	5.219,6923 UC	(2.269,2818 UC)	5.219,6923 UC	6.679,2293 UC
jun/2026	1.214,2486 UC	7.734,2625 UC	4.106,3476 UC	(6.375,6294 UC)	5.320,5962 UC	1.358,6331 UC

C. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA

[illegible]

Relatório do Banco de Crédito de jun/2026

Anexo II - EXPANSÃO - Lista de Obras Concluídas no Mês

Data Solicitação	No do Projeto	No SEI	Título	RA	Qt Luminárias	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)
Quantidade: 3 Projetos					Totais:	198
						1.214,2486
12/11/2024	24CEB527	00001-00044090/2022-36	Acesso da Policlínica do CBM até o Terminal Rodoviário Sul - Plano Piloto	PLANO PILOTO (RA I)	9	304,7385
27/12/2024	25CEB006	00001-00044089/2024-73	SETOR RESIDENCIAL DOROTHY STANG, DF 440, SOBRADINHO	SOBRADINHO (RA V)	169	404,6798
28/04/2026	26CEB965	04028-00000494/2026-68	ESTACIONAMENTO ANEEL	PLANO PILOTO (RA I)	20	504,8303

Relatório do Banco de Crédito de jun/2026

Status: Executado CO

Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês

Data Solicitação	No do Orçamento	Endereço	RA	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)
Quantidade: 51 Serviços		Totais:		4.106,3476
01/06/2026	26VRR234	Avenida Elmo Serejo 15°50'25.4"S 48°05'55.5"W	CEILÂNDIA (RA IX)	21,8686
01/06/2026	26VRR235	QNL 20 Conjunto D - Em frente ao Delicious Fest	TAGUATINGA (RA III)	16,8710
01/06/2026	26VRR236	BR 040 - PRÓXIMO AO TERMINAL DO BRT	SANTA MARIA (RA XIII)	16,8710
01/06/2026	26VRR237	P Norte QNP 28-32-36	CEILÂNDIA (RA IX)	11,8734
01/06/2026	26VRR238	Quadra 19 Setor Industrial	CEILÂNDIA (RA IX)	16,8710
01/06/2026	26VRR239	DF 150 - KM 13 - Próximo à Academia Bela Forma	FERCAL (RA XXXI)	16,8710
01/06/2026	26VRR240	SHIS QI 21 (estacionamento público – Escola Francesa)	LAGO SUL (RA XVI)	1,9140
01/06/2026	26VRR241	Q 2/1 - Via Principal	SOBRADINHO (RA V)	33,2822
01/06/2026	26VRR242	EPCL - Vicente Pires, via Marginal	VICENTE PIRES (RA XXX)	11,8734
01/06/2026	26VRR243	EQN 109/110 209/210 Norte - TESOURINHAS	PLANO PILOTO (RA I)	97,3885
01/06/2026	26VRR244	Quadra 4, Área Especial 2 - Vila Estrutural / DF - Área do CEM (Centro de Ensino Médio em construção)	SCIA/ESTRUTURAL (RA XXV)	49,5529
01/06/2026	26VRR245	SRPN Trecho 1 - Entrada do Autódromo Internacional de Brasília	PLANO PILOTO (RA I)	278,7692
01/06/2026	26VRR246	QNP-20 Frente ao Conjunto I - "Skate Park"	CEILÂNDIA (RA IX)	39,7804
01/06/2026	26VRR247	Rua 3B - Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP)	VICENTE PIRES (RA XXX)	300,4312
01/06/2026	26VRR248	Estrada Parque Tamandua - Próximo ao Farol do Cerrado	LAGO NORTE (RA XVIII)	19,4777
01/06/2026	26VRR249	Marginal Sul da EPTG	GUARÁ (RA X)	11,8734
01/06/2026	26VRR250	DF-280 - Recanto Água Quente 15°55'23.6"S 48°10'05.6"W (-15.923232, -48.168232)	RECANTO DAS EMAS (XV)	172,1736
01/06/2026	26VRR251	PARQUE DA CIDADE - QUADRAS DE AREIA / PARQUE ANA LÍDIA	PLANO PILOTO (RA I)	124,9974
01/06/2026	26VRR252	Altura da SQS 109 Sul, eixão 15°49'10.7"S 47°54'16.6"W (-15.819650, -47.904608)	PLANO PILOTO (RA I)	0,0000
01/06/2026	26VRR253	DF-001 / DF-251	GAMA (RA II)	149,9280
01/06/2026	26VRR254	Viaduto de Santa Maria/Valparaíso - 16°02'56.7"S 47°58'49.4"W	SANTA MARIA (RA XIII)	11,8734
01/06/2026	26VRR255	DF 290 Próximo ao Residencial Santa Maria	SANTA MARIA (RA XIII)	23,7468
01/06/2026	26VRR256	SMLN MI 13, Conjunto 01	LAGO NORTE (RA XVIII)	36,6444
01/06/2026	26VRR257	DF-047 Estrada Parque Aeroporto - Próximo ao Terminal de Cargas dos Correios	LAGO SUL (RA XVI)	18,9929
01/06/2026	26VRR258	CLN 309 BLOCO C ASA NORTE	PLANO PILOTO (RA I)	7,8457
01/06/2026	26VRR259	BALÃO DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	LAGO SUL (RA XVI)	19,4777
01/06/2026	26VRR260	SCIA Quadra 14/15 - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	GUARÁ (RA X)	28,8720
01/06/2026	26VRR261	Eixo Rodoviário Norte — Viaduto da Galeria do Trabalhador / Viaduto Próximo à Rodoviária Norte / Passagem Subterrânea da SQN Norte	PLANO PILOTO (RA I)	331,4202
01/06/2026	26VRR262	VIADUTO DO SAAN / SMU NA EPIA NORTE	PLANO PILOTO (RA I)	194,7770
01/06/2026	26VRR263	Lateral do Península	ÁGUAS CLARAS (RA XX)	258,8006
01/06/2026	26VRR264	LT 2 CJ A - Ceilândia Norte	CEILÂNDIA (RA IX)	36,6444
01/06/2026	26VRR265	Estrada Parque Indústria e Abastecimento	SIA (RA XXIX)	18,8625
01/06/2026	26VRR266	QR 429, Conjuntos 24/25 — Praça	SAMAMBAIA (RA XII)	11,8734
01/06/2026	26VRR267	QNN 14, Estacionamento Metrô Guariroba	CEILÂNDIA (RA IX)	11,8734

Relatório do Banco de Crédito de jun/2026

Status: Executado CO

Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês

Data Solicitação	No do Orçamento	Endereço	RA	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)
01/06/2026	26VRR268	SMPW Quadra 26, G2 — DF-450/EPIA SUL	PARK WAY (RA XXIV)	16,8710
01/06/2026	26VRR269	DF-128 (Chácara 212, Quintas do Vale Verdes / Fazenda Mestre Darmas / Trevo da BR-020); Setor de Áreas Especiais Norte, via NS.01, em frente ao 14º Batalhão	PLANALTINA (RA VI)	94,7818
01/06/2026	26VRR270	Eixo Monumental, entre via L2 - PRÓXIMO AO MINISTÉRIO	PLANO PILOTO (RA I)	111,8988
01/06/2026	26VRR271	SQS 212/213 Sul, atrás da Igreja Universal	PLANO PILOTO (RA I)	73,4731
01/06/2026	26VRR272	DF-030 / BR-020, próximo ao Parque de Exposições	PLANALTINA (RA VI)	16,8710
01/06/2026	26VRR273	QNP 05, Campo Society	CEILÂNDIA (RA IX)	113,9956
01/06/2026	26VRR274	Estrada Parque das Nações, via L4 Norte, próximo à ponte do Bragueto	PLANO PILOTO (RA I)	16,8710
01/06/2026	26VRR275	EPIA Norte, em frente à Água Mineral	PLANO PILOTO (RA I)	33,7420
01/06/2026	26VRR276	Setor G Norte, QNG, Campo Sintético	TAGUATINGA (RA III)	111,8500
01/06/2026	26VRR277	DF-459, Universidade de Brasília, Campus Ceilândia	CEILÂNDIA (RA IX)	170,5200
01/06/2026	26VRR278	EQNM 20	CEILÂNDIA (RA IX)	23,7468
01/06/2026	26VRR279	EPTG / EPIG - Sudoeste/Octogonal	SUDOESTE/OC TOGONAL (RA I)	11,8734
01/06/2026	26VRR280	ESTACIONAMENTO DO CIOB	PLANO PILOTO (RA I)	556,9171
01/06/2026	26VRR281	TESOURINHA ALÇA E EIXO L NORTE 213/214	PLANO PILOTO (RA I)	212,8156
01/06/2026	26VRR282	ST. E SUL CSE 06 ESTACIONAMENTO	TAGUATINGA (RA III)	111,0664
01/06/2026	26VRR283	Estac. Ginásio do CAVE/Centro de Convivência do Idoso, QE 23, AE do CAVE	GUARÁ (RA X)	24,6817
01/06/2026	26VRR284	EXATA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO - SLE Q 32 CL	GAMA (RA II)	0,0000

Orçamento de Expansão com Uso de Unidades de Crédito

Versão 9.3

Projeto N.º:	26CEB965	Data:	12/06/2026
Endereço:	ESTACIONAMENTO DA ANEEL	Processo SEI:	04028-00000494/2026-68
Região Adm:	PLANO PILOTO (RA I)	Modalidade:	sem RDU - NeoEnergia-BsB
Orçamentista:	André dos Anjos Luz Júnior (Matr. 5336-8)	Resp. Técnico:	Mauro Landim

Síntese dos Resultados

Quantidade de Luminárias: 20 Lum
Preço da Unidade de Crédito: R\$ 337,84 /UC

Total de Unidades de Crédito: 504,83 UC
VPL Concessão: R\$ 170.551,87

Planilha de Serviços do Banco de Crédito

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	UC / Unidade	Valor em UC	Peso
4	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V4)	un	5,0	2,0177 UC	10,09 UC	2,00%
7	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V2)	un	1,0	14,9386 UC	14,94 UC	2,96%
9	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	un	14,0	5,6925 UC	79,70 UC	15,79%
41	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x4mm², cobre, Classe-2.	m	350,0	0,3238 UC	113,33 UC	22,45%
51	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	m	136,0	0,4514 UC	61,39 UC	12,16%
56	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	un	218,0	0,8877 UC	193,52 UC	38,33%
57	Aterramento - Rede Aérea Exclusiva, PG ou Quadro IP	un	15,0	0,9508 UC	14,26 UC	2,83%
58	Instalação de Comando - Quadro QJPA 1 ou 2	un	1,0	17,6072 UC	17,61 UC	3,49%

Observação:

1) Os itens e valores correspondem aos aprovados no Termo Aditivo 1º ao Contrato de Concessão (172102180).



Orçamento de Expansão com Uso de Unidades de Crédito

Versão 9.3

Projeto N.º:	25CEB006	Data:	12/06/2026
Endereço:	RESID. DOROTHY STANG DF 440 ROTA DO CAVALO	Processo SEI:	00001-00044089/2024-73
Região Adm:	SOBRADINHO (RA V)	Modalidade:	sem RDU - NeoEnergia-BsB
Orçamentista:	Lindomar Soares Barbosa (Matr. 7571-0)	Resp. Técnico:	Mauro Landim

Síntese dos Resultados

Quantidade de Luminárias: 170 Lum
Preço da Unidade de Crédito: R\$ 337,84 /UC

Total de Unidades de Crédito: 404,68 UC
VPL Concessão: R\$ 136.717,02

Planilha de Serviços do Banco de Crédito

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	UC / Unidade	Valor em UC	Peso
3	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V3)	un	170,0	2,1411 UC	363,99 UC	89,94%
53	Rede Aérea de Baixa Tensão - Exclusiva de IP - SEM poste	un	8,0	5,0866 UC	40,69 UC	10,06%

Observação:

1) Os itens e valores correspondem aos aprovados no Termo Aditivo 1º ao Contrato de Concessão (172102180).

Orçamento de Expansão com Uso de Unidades de Crédito

Versão 9.3

Projeto N.º: 24CEB527

Data: 10/06/2026

Endereço: Acesso a Policlínica até o Terminal Rodoviário sul - Plano Piloto

Processo SEI: 00001-00044090/2022-36

Região Adm: PLANO PILOTO (RA I)

Modalidade: sem RDU - NeoEnergia-BsB

Orçamentista: Lindomar Soares Barbosa (Matr. 7571-0)

Resp. Técnico: Mauro Landim

Síntese dos Resultados

Quantidade de Luminárias: 9 Lum
Preço da Unidade de Crédito: R\$ 337,84 /UC

Total de Unidades de Crédito: 304,74 UC
VPL Concessão: R\$ 102.952,85

Planilha de Serviços do Banco de Crédito

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	UC / Unidade	Valor em UC	Peso
9	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	un	9,0	5,6925 UC	51,23 UC	16,81%
41	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x4mm², cobre, Classe-2.	m	284,0	0,3238 UC	91,96 UC	30,18%
51	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	m	158,0	0,4514 UC	71,32 UC	23,40%
56	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	un	92,0	0,8877 UC	81,67 UC	26,80%
57	Aterramento - Rede Aérea Exclusiva, PG ou Quadro IP	un	9,0	0,9508 UC	8,56 UC	2,81%

Observação:

1) Os itens e valores correspondem aos aprovados no Termo Aditivo 1º ao Contrato de Concessão (172102180).

Planilha de Serviços Executados com Uso do Banco de Crédito

Data Solicitação	No do Orçamento	Documento de Referência	Endereço	RA	Tipo Serviço	Descrição Serviço	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)	Custo em UC (Tab 37 Aditivo)
01/06/2026	26VRR234	696/2026 - DIAMANTE	Avenida Elmo Serejo 15°50'25.4"S 48°05'55.5"W	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, instalação de 02 luminárias LED 240W	21,8686	R\$ 7.112,98
01/06/2026	26VRR235	697/2026 - DIAMANTE	QNL 20 Conjunto D - Em frente ao Delicious Fest	TAGUATINGA (RA III)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, sup 1 pet LED 241W, 17m de KIT cabo	16,8710	R\$ 5.487,46
01/06/2026	26VRR236	630/2026 - DIAMANTE	BR 040 - PRÓXIMO AO TERMINAL DO BRT	SANTA MARIA (RA XIII)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m danificado, SUP 01 PET luminária LED	16,8710	R\$ 5.487,46
01/06/2026	26VRR237	777/2026 - DIAMANTE	P Norte QNP 28-32-36	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Substituição do poste circular de concreto 16m com luminária LED	11,8734	R\$ 3.861,94
01/06/2026	26VRR238	778/2026 - DIAMANTE	Quadra 19 Setor Industrial	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, sup 2 pet LED 240W e 17m de KIT	16,8710	R\$ 5.487,46
01/06/2026	26VRR239	96331/2026 - DPELETRONICA / 25/05/2026	DF 150 - KM 13 - Próximo à Academia Bela Forma	FERCAL (RA XXXI)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, sup 2 pet LED 240W e reposição de	16,8710	R\$ 5.487,46
01/06/2026	26VRR240	762/2026 - DIAMANTE	SHIS QI 21 (estacionamento público – Escola Francesa)	LAGO SUL (RA XVI)	REPOSIÇÃO	Remanejamento de 01 PCR 16m.	1,9140	R\$ 622,55
01/06/2026	26VRR241	780/2026 - DIAMANTE	Q 2/1 - Via Principal	SOBRADINHO (RA V)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 10m led 150w, 01 PAD 7,5m Led 120W, 35m	33,2822	R\$ 10.825,37
01/06/2026	26VRR242	OCORRÊNCIA Nº 96653/2026 - DPELETRONICA	EPCL - Vicente Pires, via Marginal	VICENTE PIRES (RA XXX)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 01 PET com luminária LED 240W e	11,8734	R\$ 3.861,94
01/06/2026	26VRR243	783/2026 - DIAMANTE	EQN 109/110 209/210 Norte - TESOURINHAS	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	05 PAS 10,0M LED 150W, 65M DE KIT CABO 2X4MM2	97,3885	R\$ 31.676,58
01/06/2026	26VRR244	748/2026 - DIAMANTE	Quadra 4, Área Especial 2 - Vila Estrutural / DF - Área do CEM	SCIA/ESTRUTURAL (RA XXV)	REPOSIÇÃO	Retirada de 05 PCR 16m, substituição de 01 PCR 16m e 120m	49,5529	R\$ 16.117,58
01/06/2026	26VRR245	785/2026 - DIAMANTE	SRPN Trecho 1 - Entrada do Autódromo Internacional de	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição de 05 postes PCR 16/200 sup 2 pet LED 240W, 01 PCR 16M	278,7692	R\$ 90.672,47
01/06/2026	26VRR246	786/2026 - DIAMANTE	QNP-20 Frente ao Conjunto I - "Skate Park"	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Reposição de 03 postes PAS 7,5m com luminárias LED 120W, 04 BP LED 120W, 08	39,7804	R\$ 12.938,97
01/06/2026	26VRR247	787/2026 - DIAMANTE	Rua 3B - Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP)	VICENTE PIRES (RA XXX)	REPOSIÇÃO	PAS 7,5M LED 120W, 116M DE KIT 2X4MM2	300,4312	R\$ 97.718,25
01/06/2026	26VRR248	788/2026 - DIAMANTE	Estrada Parque Tamandua - Próximo ao Farol do Cerrado	LAGO NORTE (RA XVIII)	REPOSIÇÃO	Substituição do poste de aço abalroado PAS 7,5m LED 150W, 13m	19,4777	R\$ 6.335,32
01/06/2026	26VRR249	OCORRENCIA Nº 96640/2026 - DPELETRONICA - (Hyundai HB20, placa PAW-8190)	Marginal Sul da EPTG	GUARÁ (RA X)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 01 PET com luminária LED 240W e	11,8734	R\$ 3.861,94

Planilha de Serviços Executados com Uso do Banco de Crédito

Data Solicitação	No do Orçamento	Documento de Referência	Endereço	RA	Tipo Serviço	Descrição Serviço	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)	Custo em UC (Tab 37 Aditivo)
01/06/2026	26VRR250	789/2026 - DIAMANTE	DF-280 - Recanto Água Quente 15°55'23.6"S 48°10'05.6"W (- 15.923222, -48.168222)	RECANTO DAS EMAS (XV)	REPOSIÇÃO	Reposição de 04 PCR 16m, sup 1 pet LED 215W, 68m de KIT cabo	172,1736	R\$ 56.001,19
01/06/2026	26VRR251	790/2026 - DIAMANTE	PARQUE DA CIDADE - QUADRAS DE AREIA / PARQUE DA CIDADE	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	02 PCR 11/300, 297M DE CABO 4X10MM2, 74M3 DE VALA	124,9974	R\$ 40.656,65
01/06/2026	26VRR252	791/2026 - DIAMANTE	Altura da SQS 109 Sul, eixão 15°49'10.7"S 47°54'16.6"W (- 15.819472, -47.904639)	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 PCR 16m sup 01 pet ornamental Led 240W	0,0000	R\$ 0,00
01/06/2026	26VRR253	598/2026 - DIAMANTE	DF-001 / DF-251	GAMA (RA II)	REPOSIÇÃO	REPOSIÇÃO 30 LED 240W	149,9280	R\$ 48.765,58
01/06/2026	26VRR254	632/2026 - DIAMANTE	Viaduto de Santa Maria/Valparaíso - Cidade Rio de Janeiro	SANTA MARIA (RA XIII)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 poste de concreto 16m danificado, e reposição	11,8734	R\$ 3.861,94
01/06/2026	26VRR255	707/2026 - DIAMANTE	DF 290 Próximo ao Residencial Santa Maria	SANTA MARIA (RA XIII)	REPOSIÇÃO	Substituição de 02 PCRs de 16m, 34m de kit cabo 4x4mm2	23,7468	R\$ 7.723,88
01/06/2026	26VRR256	792/2026 - DIAMANTE	SMLN MI 13, Conjunto 01	LAGO NORTE (RA XVIII)	REPOSIÇÃO	Reposição de 02 postes PAS 7,5m LED 120W, 22m de KIT cabo	36,6444	R\$ 11.918,96
01/06/2026	26VRR257	793/2026 - DIAMANTE	DF-047 Estrada Parque Aeroporto - Próximo ao Terminal 3	LAGO SUL (RA XVI)	REPOSIÇÃO	01 PCR 11M SUP 2 PET LED 240W, 14M KIT DE CABO 2X4MM2	18,9929	R\$ 6.177,63
01/06/2026	26VRR258	794/2026 - DIAMANTE	CLN 309 BLOCO C ASA NORTE	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	01 PAS 5M LED 40W, 07M DE KIT CABO 2X4MM2	7,8457	R\$ 2.551,89
01/06/2026	26VRR259	795/2026 - DIAMANTE	BALÃO DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	LAGO SUL (RA XVI)	REPOSIÇÃO	01 PAS 10M LED 150W, 13M DE KIT CABO 2X4MM2	19,4777	R\$ 6.335,32
01/06/2026	26VRR260	796/2026 - DIAMANTE	SCIA Quadra 14/15 - Setor Complementar de Indústria e Mineração	GUARÁ (RA X)	REPOSIÇÃO	Lançamento de 160m de cabo 4x4mm², 40m de cabo 4x10mm² 850m de cabo	28,8720	R\$ 9.390,91
01/06/2026	26VRR261	797/2026 - DIAMANTE	Eixo Rodoviário Norte — Viaduto da Galeria do Terminal 3	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	multiplex de 4x16mm2 alu, substituição de 06	331,4202	R\$ 107.797,73
01/06/2026	26VRR262	799/2026 - DIAMANTE	VIADUTO DO SAAN / SMU NA EPIA NORTE	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	10 PAS 10M LED 150W, 130M DE KIT CABO 2X4MM2	194,7770	R\$ 63.353,17
01/06/2026	26VRR263	800/2026 - DIAMANTE	Lateral do Peninsula	ÁGUAS CLARAS (RA XX)	REPOSIÇÃO	Reposição de 14 PAS 05m LED 40W, 112m de KIT cabo 2x4mm²	258,8006	R\$ 84.177,48
01/06/2026	26VRR264	OCORRÊNCIA N° 105116/2026 - DPELETRONICA	LT 2 CJA - Ceilândia Norte	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Substituição de 02 PAS 7,5m, com luminárias LED 120W 22m de KIT	36,6444	R\$ 11.918,96
01/06/2026	26VRR265	OCORRÊNCIA N° 88436/2026 - DPELETRONICA	Estrada Parque Indústria e Abastecimento	SIA (RA XXIX)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 7,5m, com luminária de LED 150W 11m de KIT	18,8625	R\$ 6.135,22

Planilha de Serviços Executados com Uso do Banco de Crédito

Data Solicitação	No do Orçamento	Documento de Referência	Endereço	RA	Tipo Serviço	Descrição Serviço	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)	Custo em UC (Tab 37 Aditivo)
01/06/2026	26VRR266	801/2026 - DIAMANTE	QR 429, Conjuntos 24/25 — Praça	SAMAMBAIA (RA XII)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, 17m de KIT cabo 4x4mm ²	11,8734	R\$ 3.861,94
01/06/2026	26VRR267	802/2026 - DIAMANTE	QNN 14, Estacionamento Metrô Guariroba	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m , 17m de KIT de cabo 4x4mm ²	11,8734	R\$ 3.861,94
01/06/2026	26VRR268	803/2026 - DIAMANTE	SMPW Quadra 26, G2 — DF-450/EPIA SUL	PARK WAY (RA XXIV)	REPOSIÇÃO	Reposição 01 PCR 16m sup 2 pet LED 240W, 17m de KIT cabo	16,8710	R\$ 5.487,46
01/06/2026	26VRR269	823/2026 - DIAMANTE	DF-128 (Chácara 212, Quintas do Vale Verdes / Fazenda	PLANALTINA (RA VI)	REPOSIÇÃO	Reposição de 04 PAS 10m LED 150W, 52m de KIT cabo 2x4mm ²	94,7818	R\$ 30.828,73
01/06/2026	26VRR270	824/2026 - DIAMANTE	Eixo Monumental, entre via L2 - PRÓXIMO AO MINISTÉRIO	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição de 74m de cabo 4x10mm ² , 189m de cabo 4x16mm ²	111,8988	R\$ 36.396,20
01/06/2026	26VRR271	825/2026 - DIAMANTE	SQS 212/213 Sul, atrás da Igreja Universal	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição de 165m de cabo 4x4mm ² , 106m de cabo 4x10mm ² e	73,4731	R\$ 23.897,86
01/06/2026	26VRR272	826/2026 - DIAMANTE	DF-030 / BR-020, próximo ao Parque de Exposições	PLANALTINA (RA VI)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m sup 2 pet LED 240W e 17m de KIT	16,8710	R\$ 5.487,46
01/06/2026	26VRR273	827/2026 - DIAMANTE	QNP 05, Campo Society	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Reposição de 02 PCR 16m,34m de KIT cabo 4x4mm ² substituição	113,9956	R\$ 37.078,21
01/06/2026	26VRR274	828/2026 - DIAMANTE	Estrada Parque das Nações, via L4 Norte, próximo à ponte	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 215W e	16,8710	R\$ 5.487,46
01/06/2026	26VRR275	829/2026 - DIAMANTE	EPIA Norte, em frente à Água Mineral	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Substituição ção de 02 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 245W e	33,7420	R\$ 10.974,92
01/06/2026	26VRR276	830/2026 - DIAMANTE	Setor G Norte, QNG, Campo Sintético	TAGUATINGA (RA III)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m sup 2 pet LED 240W substituição de	111,8500	R\$ 36.380,33
01/06/2026	26VRR277	831/2026 - DIAMANTE	DF-459, Universidade de Brasília, Campus Ceilândia	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Reposição de 560m de cabo 4x16mm ² ALU.	170,5200	R\$ 55.463,34
01/06/2026	26VRR278	832/2026 - DIAMANTE	EQNM 20	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Substituição de 02 PCR 16m com risco de queda, 34m de KIT cabo	23,7468	R\$ 7.723,88
01/06/2026	26VRR279	OCORRÊNCIA Nº 110514/2026 - DPELETRONICA	EPTG / EPIG - Sudoeste/Octogonal	SUDOESTE/OCTOGONAL (RA XXII)	REPOSIÇÃO	01 PCR 16m, 01 SUP 01 PET e luminária LED 240W 17m de KIT cabo	11,8734	R\$ 3.861,94
01/06/2026	26VRR280	833/2026 - DIAMANTE	ESTACIONAMENTO DO CIOB	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	09 unid. => Instalação de braço longo 3595 x	556,9171	R\$ 181.142,86
01/06/2026	26VRR281	840/2026 - DIAMANTE	TESOURINHA ALÇA E EIXO L NORTE 213/214	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição de 12 PAS 7,5M LED 150W, 88m de KIT 2x4mm ²	212,8156	R\$ 69.220,40

Planilha de Serviços Executados com Uso do Banco de Crédito

Data Solicitação	No do Orçamento	Documento de Referência	Endereço	RA	Tipo Serviço	Descrição Serviço	Orçamento em UC	Custo em UC
							(Tab 37 Aditivo)	(Tab 37 Aditivo)
01/06/2026	26VRR282	841/2026 - DIAMANTE	ST. E SUL CSE 06 ESTACIONAMENTO	TAGUATINGA (RA III)	REPOSIÇÃO	03 PAS 5M LED 40W, 03 PAS 7,5M LED 120W, 57m de KIT de Cabo Retirada de 01 pcr 16m	111,0664	R\$ 36.125,46
01/06/2026	26VRR283	839/2026 - DIAMANTE	Estac. Ginásio do CAVE/Centro de Convivência do Idoso, QE	GUARÁ (RA X)	REPOSIÇÃO	, reposição de 01 pcr 16m sup 4 net led	24,6817	R\$ 8.027,97
01/06/2026	26VRR284	842/2026 - Diamante	EXATA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO - SLE Q 32 CL	GAMA (RA II)	REPOSIÇÃO	01 RETIRADA DE PCR 16M	0,0000	R\$ 0,00

Lista de Serviços de Correção de Vandalismo e Reposições - Abr/2026 a Mar/2027

4.106,3476

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/06/2026	26VRR234	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, instalação de 02 luminárias LED 240W, 17m de KIT cabo 4x4mm², retirada e descarte do poste danificado.		20,0	14,8150	21,8686
01/06/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	2,0	4,9976	9,9952
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/06/2026	26VRR235	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, sup 1 pet LED 241W, 17m de KIT cabo 4x4mm², retirada e descarte do poste danificado.		19,0	14,8150	16,8710
01/06/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			LED 241W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/06/2026	26VRR236	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m danificado, SUP 01 PET, luminária LED 240W, e reposição de 17m de KIT cabo 4x4mm².		19,0	14,8150	16,8710
01/06/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/06/2026	26VRR237	REPOSIÇÃO	Substituição do poste circular de concreto 16m com luminária LED existente, 17m de KIT cabo 4x4mm2		18,0	9,8174	11,8734
01/06/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/06/2026	26VRR238	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, sup 2 pet LED 240W e 17m de KIT cabo 4x4mm².		19,0	14,8150	16,8710
01/06/2026			PCR 16 COM 2 PETALAS LED 240	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/06/2026	26VRR239	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, sup 2 pet LED 240W e reposição de 17m de KIT cabo 4x4mm².		19,0	14,8150	16,8710
01/06/2026			PCR 16 COM 2 PETALAS LED 240	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/06/2026	26VRR240	REPOSIÇÃO	Remanejamento de 01 PCR 16m.		1,0	1,9140	1,9140
01/06/2026			REMANEJAMENTO COM POSTE	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	1,0	1,9140	1,9140
01/06/2026	26VRR241	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 10m led 150w, 01 PAD 7,5m Led 120W, 35m de kit 2x4mm2.		3,0	33,2822	33,2822
01/06/2026			PAS 10 M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/06/2026			PAD 7,5 LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz COM poste (V2)	1,0	14,9386	14,9386
01/06/2026			LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	1,0	2,8647	2,8647

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/06/2026	26VRR242	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 01 PET com luminária LED 240W e 17m de KIT cabo 4x4mm².		18,0	8,8174	11,8734
01/06/2026			PCR 16 M LED 240	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/06/2026	26VRR243	REPOSIÇÃO	05 PAS 10,0M LED 150W, 65M DE KIT CABO 2X4MM2		70,0	15,7865	97,3885
01/06/2026			PAS 10 M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	5,0	15,4789	77,3945
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	65,0	0,3076	19,9940
01/06/2026	26VRR244	REPOSIÇÃO	Retirada de 05 PCR 16m, substituição de 01 PCR 16m, e 120m de rede aérea.		126,0	10,6211	48,5529
01/06/2026			NR	Não Remunerado	5,0	0,0000	0,0000
01/06/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			CABO 4X35MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x35 mm²	120,0	0,3322	39,8640
01/06/2026	26VRR245	REPOSIÇÃO	Reposição de 05 postes PCR 16/200 sup 2 pet LED 240W, 01 PCR 16M sup 4 pet LED 240W, 102m de KIT Cabo 4x4mm2, 79m de MND, 431m de Cabo 4x4mm, 88m3 de vala retro-escavadeira.		732,0	30,9691	278,7682
01/06/2026			PCR 16 COM 2 PETALAS LED 240	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	5,0	9,6889	48,4445
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	5,0	4,9976	24,9880
01/06/2026			PCR 16M SUP 4 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	3,0	4,9976	14,9928
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	120,0	0,1285	15,4200
01/06/2026			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	79,0	0,8877	70,1283
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	431,0	0,1285	55,3835
01/06/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	88,0	0,4514	39,7232
01/06/2026	26VRR246	REPOSIÇÃO	Reposição de 03 postes PAS 7,5m com luminárias LED 120W, 93m de cabo 4x4mm2, 23m3 de vala.		119,0	6,3958	38,7804
01/06/2026			PAS 7,5M 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V3)	3,0	5,8159	17,4477
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	93,0	0,1285	11,9505
01/06/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	23,0	0,4514	10,3822
01/06/2026	26VRR247	REPOSIÇÃO	04 BP LED 120W, 08 PAS 7,5M LED 120W, 116M DE KIT 2X4MM2, 251M DE CABO 4X4MM2, 249M DE MND.		620,0	4,1885	308,4312
01/06/2026			BP LED 120 W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	4,0	2,8647	11,4588
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	116,0	0,3076	35,6816
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	251,0	0,1285	32,2535
01/06/2026			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	249,0	0,8877	221,0373
01/06/2026	26VRR248	REPOSIÇÃO	Substituição do poste de aço abalroado PAS 7,5m LED 150W, 13m de KIT cabo 2x4mm2.		14,0	15,7865	19,4777
01/06/2026			PAS 7,5M 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	13,0	0,3076	3,9988

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/06/2026	26VRR249	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 01 PET com luminária LED 240W e 17m de KIT cabo 4x4mm².		18,0	9,8174	11,8734
01/06/2026			PCR 16M SUP 1 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/06/2026	26VRR250	REPOSIÇÃO	Reposição de 04 PCR 16m, sup 1 pet LED 215W, 68m de KIT cabo 4x4mm², 600m de cabo 4x10mm aéreo		672,0	10,0252	172,1736
01/06/2026			PCR 16M SUP 1 PET LED 215W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	4,0	9,6889	38,7556
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	68,0	0,1285	8,7380
01/06/2026			CABO 4X10MM	Instalação de Cabo 4x10 mm2	600,0	0,2078	124,6800
01/06/2026	26VRR251	REPOSIÇÃO	02 PCR 11/300, 297M DE CABO 4X10MM2, 74M3 DE VALA		373,0	15,5978	124,9974
01/06/2026			PCR 11M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V2)	2,0	14,9386	29,8772
01/06/2026			CABO 4X10MM	Instalação de Cabo 4x10 mm2	297,0	0,2078	61,7166
01/06/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	74,0	0,4514	33,4036
01/06/2026	26VRR252	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 PCR 16m sup 01 pet ornamental Led 240W, e 17m de KIT cabo 4x4mm².		18,0	0,0000	0,0000
01/06/2026			NR	Não Remunerado	1,0	0,0000	0,0000
01/06/2026			NR	Não Remunerado	17,0	0,0000	0,0000
01/06/2026	26VRR253	REPOSIÇÃO	REPOSIÇÃO 30 LED 240W		30,0	4,9976	149,9280
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	30,0	4,9976	149,9280
01/06/2026	26VRR254	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 poste de concreto 16m danificado, e reposição de 17m de KIT cabo 4x4mm².		18,0	9,8174	11,8734
01/06/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/06/2026	26VRR255	REPOSIÇÃO	Substituição de 02 PCRs de 16m, 34m de kit cabo 4x4mm².		36,0	9,8174	23,7468
01/06/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	34,0	0,1285	4,3690
01/06/2026	26VRR256	REPOSIÇÃO	Reposição de 02 postes PAS 7,5m LED 120W, 22m de KIT cabo 2x4mm².		24,0	15,2462	36,6444
01/06/2026			PAS 7,5 M COM LUM LED 120	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V2)	2,0	14,9386	29,8772
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	22,0	0,3076	6,7672
01/06/2026	26VRR257	REPOSIÇÃO	01 PCR11M SUP 2 PET LED 240W, 14M KIT DE CABO2X4MM2		16,0	14,9941	18,9929
01/06/2026			PCR 11M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	14,0	0,3076	4,3064
01/06/2026	26VRR258	REPOSIÇÃO	01 PAS 5M LED 40W, 07M DE KIT CABO 2X4MM2		8,0	6,0001	7,8457
01/06/2026			PAS 5M LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	1,0	5,6925	5,6925
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	7,0	0,3076	2,1532

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/06/2026	26VRR259	REPOSIÇÃO	01 PAS 10M LED 150W, 13M DE KIT CABO 2X4MM2.		14,0	15,7865	19,4777
01/06/2026			PAS 10 M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	13,0	0,3076	3,9988
01/06/2026	26VRR260	REPOSIÇÃO	Lançamento de 160m de cabo 4x4mm ² , 40m de cabo 4x10mm ² .		200,0	0,3363	28,8720
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	160,0	0,1285	20,5600
01/06/2026			CABO 4X10MM	Instalação de Cabo 4x10 mm2	40,0	0,2078	8,3120
01/06/2026	26VRR261	REPOSIÇÃO	850m de cabo multiplex de 4x16mm2 alu, substituição de 06 luminárias LED 240W, 48m de MND.		904,0	6,1898	331,4202
01/06/2026			CABO 4X16MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x16 mm ²	850,0	0,3045	258,8250
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	6,0	4,9976	29,9856
01/06/2026			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	48,0	0,8877	42,6096
01/06/2026	26VRR262	REPOSIÇÃO	10 PAS 10M LED 150W, 130M DE KIT CABO 2X4MM2.		140,0	15,7865	194,7770
01/06/2026			PAS 10 M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	10,0	15,4789	154,7890
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	130,0	0,3076	39,9880
01/06/2026	26VRR263	REPOSIÇÃO	Reposição de 14 PAS 05m LED 40W, 112m de KIT cabo 2x4mm ² , 455m de cabo 4x10mm ² , e 111m3 de Vala.		692,0	6,6593	258,8006
01/06/2026			PAS 5M LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	14,0	5,6925	79,6950
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	112,0	0,3076	34,4512
01/06/2026			CABO 4X10MM	Instalação de Cabo 4x10 mm2	455,0	0,2078	94,5490
01/06/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	111,0	0,4514	50,1054
01/06/2026	26VRR264	REPOSIÇÃO	Substituição de 02 PAS 7,5m, com luminárias LED 120W, 22m de KIT cabo 2x4mm2.		24,0	15,2462	36,6444
01/06/2026			PAS 7,5 M COM LUM LED 120	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V2)	2,0	14,9386	29,8772
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	22,0	0,3076	6,7672
01/06/2026	26VRR265	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 7,5m, com luminária de LED 150W, 11m de KIT cabo 2x4mm2.		12,0	15,7865	18,8625
01/06/2026			PAS 7,5M 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	11,0	0,3076	3,3836
01/06/2026	26VRR266	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, 17m de KIT cabo 4x4mm2		18,0	9,8174	11,8734
01/06/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/06/2026	26VRR267	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m , 17m de KIT de cabo 4x4mm2		18,0	8,8174	11,8734
01/06/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/06/2026	26VRR268	REPOSIÇÃO	Reposição 01 PCR 16M sup 2 pet LED 240W, 17m de KIT cabo 4x4mm2.		19,0	14,8150	16,8710
01/06/2026			PCR 16 M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/06/2026	26VRR269	REPOSIÇÃO	Reposição de 04 PAS 10m LED 150W, 52m de KIT cabo 2x4mm² , 01 PCR 16m sup 2 pet LED 240W, 17m de KIT cabo 4x4mm²		75,0	30,6015	94,7518
01/06/2026			PAS 10M 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	4,0	15,4789	61,9156
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	52,0	0,3076	15,9952
01/06/2026			PCR 16 M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/06/2026	26VRR270	REPOSIÇÃO	Reposição de 74m de cabo 4x10mm², 189m de cabo 4x16mm², 65M3 de Vala, 01 PAS 7,5M LED 150W, 11m de KIT cabo 2x4mm2.		340,0	16,6531	111,8988
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	74,0	0,1285	9,5090
01/06/2026			CABO 4X16MM2	Instalação de Cabo 4x16 mm2	189,0	0,2867	54,1863
01/06/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	65,0	0,4514	29,3410
01/06/2026			PAS 7,5M 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	11,0	0,3076	3,3836
01/06/2026	26VRR271	REPOSIÇÃO	Reposição de 165m de cabo 4x4mm² , 106m de cabo 4x10mm² e 67m3 de Vala.		338,0	8,7877	73,4731
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	165,0	0,1285	21,2025
01/06/2026			CABO 4X10MM	Instalação de Cabo 4x10 mm2	106,0	0,2078	22,0268
01/06/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	67,0	0,4514	30,2438
01/06/2026	26VRR272	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m sup 2 pet LED 240W e 17m de KIT cabo 4x4mm².		19,0	14,8150	16,8710
01/06/2026			PCR 16 M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/06/2026	26VRR273	REPOSIÇÃO	Reposição de 02 PCR 16m, 34m de KIT cabo 4x4mm2, substituição de 08 luminárias LED 150W 262m de cabo 4x4mm² e 65m3 de Vala.		371,0	13,8624	113,9956
01/06/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	34,0	0,1285	4,3690
01/06/2026			LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	8,0	3,4051	27,2408
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	262,0	0,1285	33,6670
01/06/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	65,0	0,4514	29,3410

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/06/2026	26VRR274	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 215W e 17m de KIT cabo 4x4mm ² .		19,0	14,8150	16,8710
01/06/2026			PCR 16 M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/06/2026	26VRR275	REPOSIÇÃO	Substituição ção de 02 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 245W, e 34m de KIT cabo 4x4mm ² .		38,0	14,8150	33,7420
01/06/2026			PCR 16 M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	2,0	4,9976	9,9952
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	34,0	0,1285	4,3690
01/06/2026	26VRR276	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m sup 2 pet LED 240W, substituição de 06 luminárias LED 240W, reposição de 10m de cabo 2x4mm ² e 267m de cabo 4x4mm ² , 66m3 de Vala.		351,0	20,5718	111,8500
01/06/2026			PCR 16 M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	6,0	4,9976	29,9856
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	10,0	0,3076	3,0760
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	267,0	0,1285	34,3095
01/06/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	66,0	0,4514	29,7924
01/06/2026	26VRR277	REPOSIÇÃO	Reposição de 560m de cabo 4x16mm ² ALU.		560,0	0,3045	170,5200
01/06/2026			CABO 4X16MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x16 mm ²	560,0	0,3045	170,5200
01/06/2026	26VRR278	REPOSIÇÃO	Substituição de 02 PCR 16m com risco de queda, 34m de KIT cabo 4x4mm ² .		36,0	9,8174	23,7468
01/06/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	34,0	0,1285	4,3690
01/06/2026	26VRR279	REPOSIÇÃO	01 PCR 16m, 01 SUP 01 PET e luminária LED 240W, 17m de KIT cabo 4x4mm2.		18,0	9,8174	11,8734
01/06/2026			PCR 16 M LED 240	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/06/2026	26VRR280	REPOSIÇÃO	09 unid. => Instalação de braço longo 3595 x 60mm com luminária 120W - BLG60LED120. 03 unid. => Instalação de braço longo 3595 x 60mm com luminária 150W - BLG60LED150. 01 unid. => INSTALAÇÃO - Comando (USADO) em Grupo - Modelo IP-02D 2x(3x20A). 01 unid. => RETIRADA comando IP, qualquer dispositivo, inclusive componentes de fixação. 395 mts. => CONSTRUÇÃO rede de duto subterrâneo, pelo Método NÃO Destrutivo - MND. 170 mts. => CABO ALIMENTADOR - um metro linear - cabo PP 4x4mm², cobre, Classe-2. 315 mts. => CABO ALIMENTADOR - um metro linear - cabo PP 4x10mm², cobre, Classe-2. 220 mts. => CABO QUADRUPLIX - rede aérea de baixa tensão, 3#16(16)mm²CA, 220v, Padrão NEOENERGIA-Distribuição - 08 (oito) vãos.		1.114,0	24,8651	556,9171
01/06/2026			BP LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	9,0	2,8647	25,7823
01/06/2026			BP LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	3,0	2,8647	8,5941
01/06/2026			QIP	Instalação de Comando - Quadro QIPA 1 ou 2	1,0	17,6072	17,6072
01/06/2026			NR	Não Remunerado	1,0	0,0000	0,0000
01/06/2026			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	395,0	0,8877	350,6415
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	170,0	0,1285	21,8450
01/06/2026			CABO 4X10MM	Instalação de Cabo 4x10 mm2	315,0	0,2078	65,4570
01/06/2026			CABO 4X16MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x16 mm ²	220,0	0,3045	66,9900
01/06/2026	26VRR281	REPOSIÇÃO	Reposição de 12 PAS 7,5M LED 150W, 88mde KIT 2x4mm2		100,0	15,7865	212,8156
01/06/2026			PAS 7,5M 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	12,0	15,4789	185,7468
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	88,0	0,3076	27,0688

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/06/2026	26VRR282	REPOSIÇÃO	03 PAS 5M LED 40W, 03 PAS 7,5M LED 120W, 57m de KIT de Cabo 2x4mm2, 266m de cabo 4x4mm2, 55m3 de vala		384,0	12,3959	111,8664
01/06/2026			PAS 5M LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	3,0	5,6925	17,0775
01/06/2026			PAS 7,5M 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V3)	3,0	5,8159	17,4477
01/06/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	57,0	0,3076	17,5332
01/06/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	266,0	0,1285	34,1810
01/06/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	55,0	0,4514	24,8270
01/06/2026	26VRR283	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 pcr 16m , reposição de 01 pcr 16m sup 4 pet led 240W, 17m de Kit cabo 4x4mm2		5,0	14,6865	24,6817
01/06/2026			NR	Não Remunerado	1,0	0,0000	0,0000
01/06/2026			PCR 16M SUP 4 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/06/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	3,0	4,9976	14,9928
01/06/2026	26VRR284	REPOSIÇÃO	01 RETIRADA DE PCR 16M		1,0	0,0000	0,0000
01/06/2026			NR	Não Remunerado	1,0	0,0000	0,0000
