

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Brasília, 22 de setembro de 2026

Índice

1. INTRODUÇÃO	4
2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	4
2.1. Manutenção	4
Os serviços de manutenção podem ser classificados em:.....	4
2.1.1. Preditiva.....	4
2.1.2. Manutenção Preventiva	5
2.1.3. Manutenção Corretiva	5
a. Dos serviços executados no mês de agosto/26.....	7
b. Atendimentos acumulados em 2026.....	7
c. Manutenção Emergencial	8
2.1.4. Furtos e Vandalismos.....	9
2.1.5. Ações de Melhoria	9
2.1.6. Projetos e Obras.....	10
2.4.1. Projetos de Expansão.....	10
2.4.2. Obras	11
2.1.7. Modernização.....	11
2.1.8. Resumo do Parque de Iluminação Pública por tipo e potência no mês	12
2.1.9. Receitas Acessórias.....	13
3. INDICADORES DE DESEMPENHO.....	14
3.1. Apuração dos Indicadores	14
3.1.1 Indicador de Pontos Acesos à Noite – IPAN.....	14
3.1.2 Indicador Iluminância e Uniformidade – IIL.....	15
3.1.3 Indicador de Temperatura de Cor – ITC.....	16
3.1.4 Indicador de Reprodução de Cor – IRC.....	16
3.1.5 Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização - ICL	17
3.1.6 Indicador da Conformidade da Potência Total - ICP	17
3.1.7 Indicador da Conformidade das Demais Informações do Cadastro - ICIC	17
3.1.8 Indicador de Pontos Apagados Durante o dia - IPAD	18
3.1.9 Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados - IDSGC..	18
3.1.10 Indicador de Cumprimento do Tempo de Espera - ITM.....	19
3.1.11 Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão - IDST...	19
3.1.12 Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão - IDFST	20
3.1.13 Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - IPOM	20

3.1.14	Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais – ICDM21	
3.1.15	Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços – ICRES21	
3.1.16	Indicador da Transparência da Concessão – ITC	22
3.1.17	Indicador de Eficientização - IE	23
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	23

1. INTRODUÇÃO

A CEB Iluminação Pública e Serviços - CEB IPES, prestadora dos serviços de iluminação pública no Distrito Federal, mediante CONTRATO DE CONCESSÃO publicado em 6 de dezembro de 2023, cuja outorga foi predeterminada pela Lei Distrital n.º 7.275, de 5 de julho de 2023, e regulamentada pelo Decreto Distrital n.º 45.033, de 4 de outubro de 2023.

O presente relatório mensal apresenta os resultados operacionais referentes à prestação dos serviços no Distrito Federal, no período de 01/08/2026 a 31/08/2026, conforme solicitado no Caderno de Encargos do Contrato de Concessão.

2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com o Caderno de Encargos do Contrato de Concessão de prestação de serviço de iluminação pública do Distrito Federal, a Concessionária deve apresentar o Relatório Mensal de Prestação de Serviço. Os dados apresentados constaram as informações sobre as atividades executadas relacionadas as:

- I. Manutenção;
- II. Projetos e Obras;
- III. Modernização.

Os serviços de manutenção estão relacionados às atividades operacionais para manter a disponibilidade o parque de iluminação pública, enquanto os serviços de projetos e obras estão relacionados à expansão do parque e o item de modernização, à modernização do parque de iluminação pública.

2.1. Manutenção

Os serviços de manutenção podem ser classificados em:

- I. Manutenção Preditiva;
- II. Manutenção Preventiva;
- III. Manutenção Corretiva.

2.1.1. Preditiva

Por definição, a manutenção preditiva do sistema de iluminação pública é um conjunto de ações planejadas que utiliza tecnologias de monitoramento, análise de dados e sensores inteligentes para prever falhas, otimizar o desempenho do sistema e reduzir custos operacionais. A manutenção preditiva baseia-se no estado real dos equipamentos.

As principais atividades da Manutenção Preditiva são: inspeções remotas diárias via telegestão; Geração automática de relatórios de falhas potenciais; Medição e análise de parâmetros elétricos, buscando indícios de sobrecarga ou desgaste; Mapeamento de

pontos críticos, como áreas com maior incidência de queimas; Planejamento de intervenções baseado em risco e urgência; Atualizações de firmware de controladores e dispositivos inteligentes; Verificação da integridade de cabos, conectores e braços (em campo, conforme indicação de anomalias). Entretanto, a estrutura atual do parque de iluminação pública do Distrito Federal não permite a execução deste tipo de manutenção. Com a implantação da telegestão, esse tipo de manutenção fará parte das atividades da CEB IPES na gestão da manutenção da iluminação pública. A inserção da telegestão faz parte do plano de modernização que está em andamento na empresa.

2.1.2. Manutenção Preventiva

A **manutenção preventiva** é um conjunto de ações planejadas que busca evitar falhas antes que elas ocorram. Ela se baseia em **cronogramas regulares**, padrões de uso, recomendações do fabricante e análises históricas de desempenho dos equipamentos. A premissa fundamental é que todo ativo possui um ciclo de vida, sujeito a desgaste natural, e que intervenções periódicas reduzem a probabilidade de falhas repentinas.


No caso de sistemas de infraestrutura, como a iluminação pública, a manutenção preventiva engloba atividades como limpeza e inspeção das luminárias, substituição programada de componentes com vida útil conhecida, verificação dos níveis de isolamento, reaperto de conexões e testes de funcionamento. O objetivo é preservar o desempenho do sistema, garantir que as luminárias operem dentro dos parâmetros elétricos adequados e evitar interrupções do serviço

Manutenções preventivas podem também ter origem a partir de necessidades apontadas durante as manutenções corretivas, sendo que em alguns casos, são identificados cabos, quadros de comandos e/ou postes que necessitam reparos, gerando Relatórios de Não Conformidade (RNC). No mês de agosto, foram gerados 173 RNC's que foram tratados como manutenção preventiva.

2.1.3. Manutenção Corretiva

No mês de agosto de 2026, tivemos 4.665 solicitações de serviços abertas nos Canais de Atendimento ao Cliente, para reparos na iluminação pública do Distrito Federal. Estas solicitações foram abertas nos quatro canais disponíveis, conforme distribuição mostrada no gráfico 1.


Gráfico 1: Número de protocolos abertos por canal de atendimento.

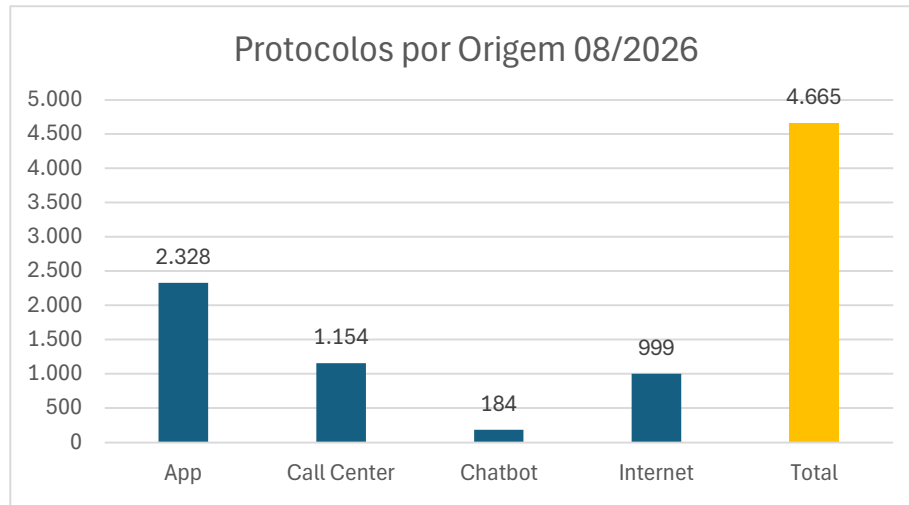

Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

Destas solicitações originaram-se ordens de serviço que, após atendimento inicial, tiveram os seguintes *status*: atendido, em atendimento ou pendente, conforme gráfico 2.

Gráfico 2: *Status* da Solicitação.

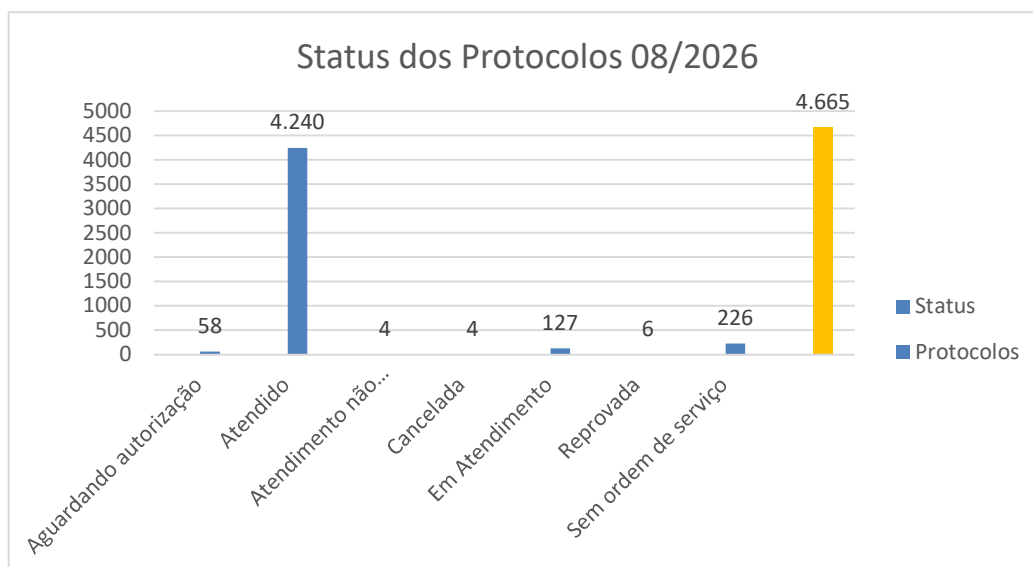


Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

A classificação "atendido" indica que houve atuação da equipe de manutenção com restabelecimento da iluminação pública. Nos casos "em atendimento", as equipes de manutenção geraram ordens de serviço, mas que ainda não foram concluídas até o período final deste relatório. Em 10 (dez) casos, os protocolos foram cancelados ou reprovados pelo sistema devido a inconsistências.

a. Dos serviços executados no mês de agosto/26

Em relação à execução dos serviços no mês de agosto de 2026, foram registrados 4.553 atendimentos relacionados às solicitações de clientes, distribuídos conforme gráfico 3. Não são considerados nesse gráfico, atendimentos originados por ocorrências geradas pela CEB, Empreiteira e canal ADM24hs.

Gráfico 3: Atendimentos por Origem de Solicitação

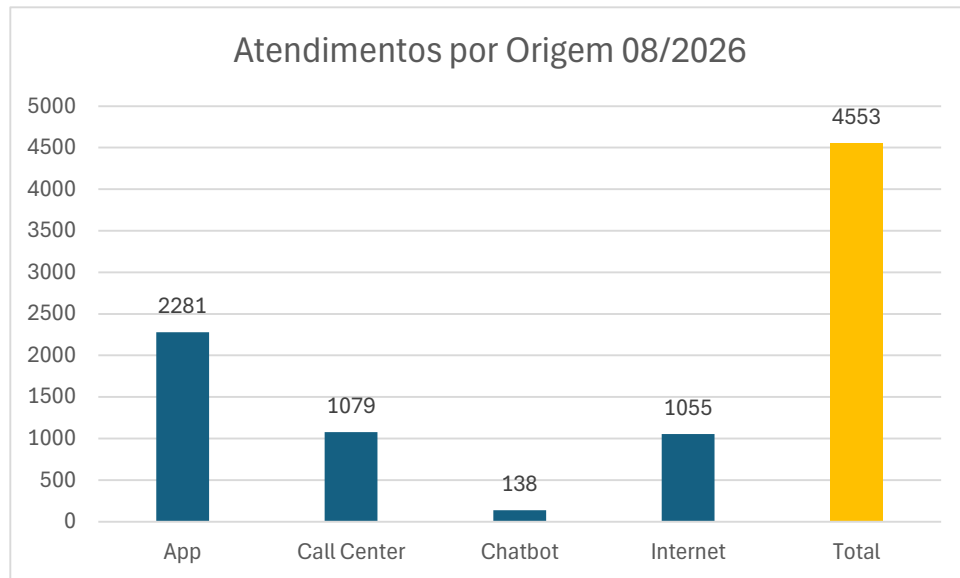


Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

b. Atendimentos acumulados em 2026

No período de janeiro a agosto de 2026, foram registrados 44.286 atendimentos originados de solicitações dos cidadãos, conforme apresentado no Gráfico 4. Esse quantitativo representa a demanda encaminhada pela população no período analisado e constitui uma referência para avaliar a capacidade de atendimento.

Gráfico 4: Atendimentos – Acumulado 2026.

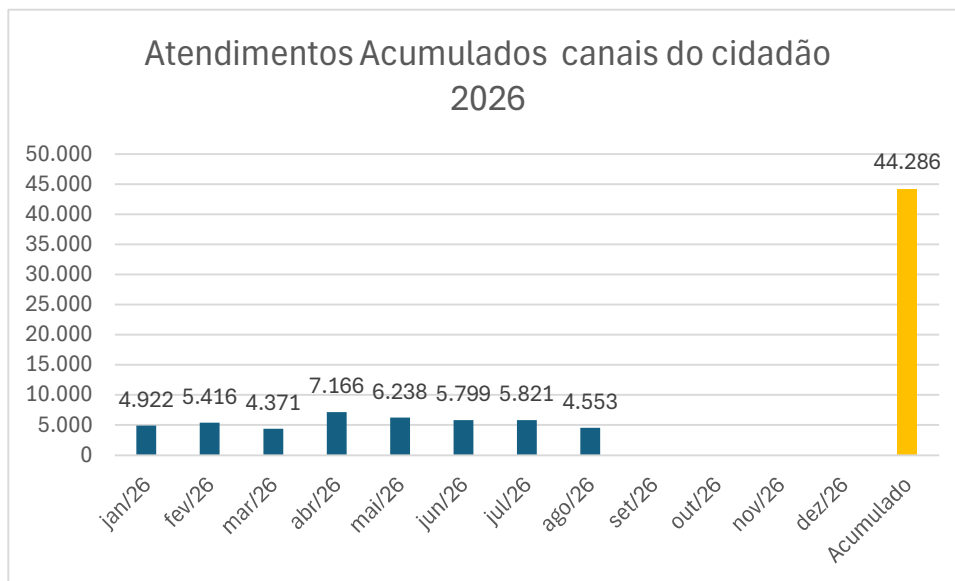


Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

c. Manutenção Emergencial

A manutenção emergencial é um tipo de manutenção corretiva, sendo que nestes casos, são reparos que exigem pronto atendimento. No mês de agosto 2026, foram registrados 135 atendimentos emergenciais, sendo 29 atendimentos a risco de choque elétrico, 03 atendimentos a fiação danificada, 38 atendimentos a fiação exposta, 20 de postes caídos e 45 em postes tortos ou danificados, conforme gráfico a seguir:

Gráfico 5: Manutenção Emergencial

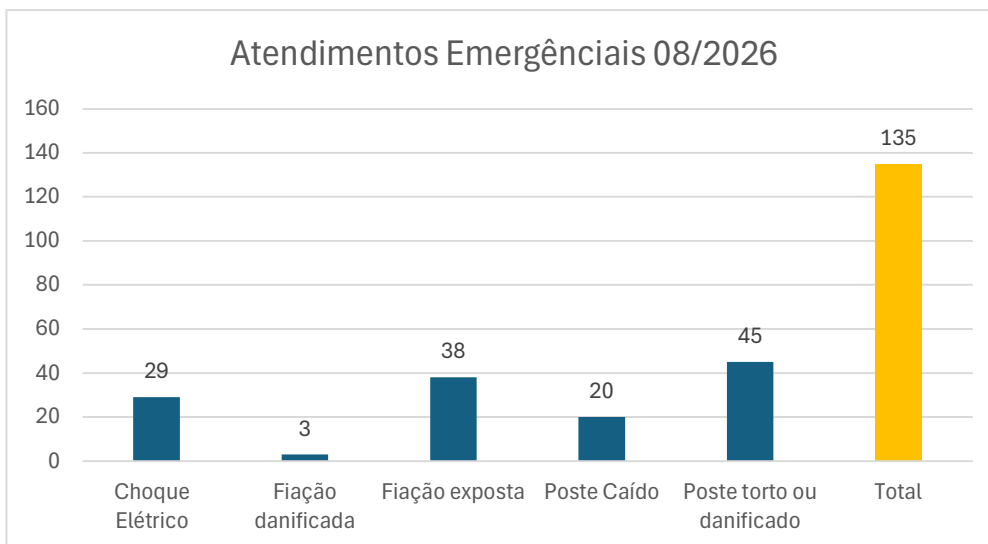

Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

2.1.4. Furtos e Vandalismos

No mês de agosto de 2026, foram registrados furtos e atos de vandalismo que resultaram na subtração de 20.573 metros de cabos da rede de iluminação pública em todo o Distrito Federal. Essa situação ocasionou expressivos prejuízos à CEB IPES, tanto em razão dos custos de reposição dos materiais quanto da necessidade de mobilização de equipes para atendimento das ocorrências.

Além do impacto financeiro, esses eventos comprometeram diretamente à execução das atividades rotineiras de manutenção preventiva, exigindo o redirecionamento de recursos operacionais para ações corretivas emergenciais.

Adicionalmente, a interrupção do funcionamento da iluminação pública em decorrência dos furtos e atos de vandalismo expôs a população a riscos durante o período em que os locais permaneceram sem iluminação, afetando a segurança de pedestres e motoristas, aumentando a sensação de insegurança e comprometendo a utilização adequada dos espaços públicos até a completa recomposição da infraestrutura danificada.

2.1.5. Ações de Melhoria

No decorrer do mês de agosto de 2026, foram realizadas diversas ações de mutirão e de recuperação total ou parcial da iluminação pública em todo o Distrito Federal.

Essas ações complementam os serviços de manutenção corretiva, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e para o aumento da segurança nos espaços públicos.

Durante o período, diversos pontos de iluminação pública foram recuperados. A seguir, destacamos algumas das principais ações realizadas:

TABELAS DOS PRINCIPAIS PONTOS ATENDIDOS 08/2026		
ITEM	ENDEREÇO	LOCAL
1	DF-010, PRÓXIMO A BRASÍLIA NORTE	SIA
2	EIXO MONUMENTAL PRÓXIMO AO VIADUTO DA EPIA	PLANO PILOTO
3	QNM 29, ÁREA ESPECIAL	CEILÂNDIA
4	PRIVÉ LUCENA RORIZ, RUA 1, MÓDULO 1 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES	CEILÂNDIA
5	DF-290, EM FRENTE AO DVO - VILA DVO, QM 100, CONJUNTO S	SANTA MARIA
6	SETOR LESTE, QUADRA 50, CONJUNTO L - CAMPO	GAMA
7	SHIGS 707/708 ASA SUL - PRAÇA 21 DE ABRIL	PLANO PILOTO
8	QUADRA COND GENESIS	CEILÂNDIA
9	BR 060 NUCLO RURAL VARGEM DA BENÇÃO	RECANTO DAS EMAS
10	BR 080 - FRENTE A ENTRADA DE BRAZLÂNDIA	BRAZLÂNDIA

Além dessas ações, foram realizadas substituições de refletores em quadras esportivas, campos de futebol, praças e outros espaços destinados à prática esportiva, no âmbito do

programa LED da Jogo.

MÊS	ADM	ENDEREÇO
ago./26	Riacho Fundo II	QN 34 – Campo Society (Campo Sintético)
ago./26	Samambaia	QR 118, na Quadra de Areia
ago./26	SAMAMBAIA	QR 412 - PRAÇAS
ago./26	TAGUATINGA	ST. E SUL CSE 06 ESTACIONAMENTO
ago./26	CEILÂNDIA	DF-180, Condomínio Bela Vista, Ceilândia - DF
ago./26	CEILÂNDIA	INCRA — Renascidos em Pentecostes
ago./26	CEILÂNDIA	QUADRA 400 POR DO SOL
ago./26	CEILÂNDIA	QUADRA COND GENESIS
ago./26	SANTA MARIA	QR 116 NA PRAÇA / QUADRA DE ESPORTE

2.1.6. Projetos e Obras

2.4.1. Projetos de Expansão

Trata-se de projetos que possuem o objetivo de expandir o parque de iluminação pública do Distrito Federal.

Tabela 1: Quantidade de Pontos de Iluminação por Projeto no Mês.

Endereço	Região Administrativa	Qtd. De pontos por tipo de fonte de luz utilizada	Valor (Em R\$)	Valor (Em UC)
DF-11 - VIA EPIG - TRECHO 01	PLANO PILOTO (RA I)	251	R\$ 1.061.500,13	7.439,5628
PRAÇA DA QUADRA 206, CONJ 6	SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)	4	R\$ 14.551,61	91,3880
PRAÇA DA QUADRA 205, CONJ 7 - RESIDENCIAL OESTE	SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)	8	R\$ 21.587,81	127,6571
ÁREA VERDE 412/414 AO LADO DA ESCOLA	SAMAMBAIA (RA XII)	2	R\$ 1.917,42	5,7294
316 SUL QUADRA DE ESPORTE	PLANO PILOTO (RA I)	5	R\$ 20.589,93	121,0399
SHCES 202	PLANO PILOTO (RA I)	18	R\$ 52.193,00	418,5856
RUA SANTO ANTÔNIO	SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)	11	R\$ 56.181,95	445,6635
PRAÇA DO BELA VISTA	SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)	9	R\$ 36.253,06	297,5482
IGREJA ESTACIONAMENTO DO PARK SUL	GUARÁ (RA X)	68	R\$ 288.178,16	1.695,9100
CAMPO SINTÉTICO 26 DE SETEMBRO	VICENTE PIRES (RA XXX)	24	R\$ 69.231,90	515,2884
QUADRA DE ESPORTES DA QD 15 VILA DAS ACÁCIAS	SOBRADINHO II (RA XXVI)	4	R\$ 25.913,20	173,8539
RUAS BURITI SOBRADINHO II	SOBRADINHO II (RA XXVI)	16	R\$ 13.569,70	153,0501
QUADRA 02 ENTRE OS CONJUNTOS C/D	SOBRADINHO (RA V)	26	R\$ 56.236,13	422,1896
TOTAL		446	R\$ 1.717.903,99	11.907,4665

Fonte: Diretoria de Planejamento e Engenharia

No mês de agosto, foram elaborados e enviados para aprovação do Poder Concedente, 13 projetos de expansão com a previsão de instalação de 446 novos pontos de iluminação.

2.4.2. Obras

No mês de agosto, houve a conclusão de três orçamentos *as built* de obra.

Tabela 2: Quantidade de Pontos de Iluminação por Obra no Mês.

Endereço	Região Administrativa	Qtd. De pontos por tipo de fonte de luz utilizada	Valor (Em R\$)	Valor (Em UC)
CAMPO SINTÉTICO, CAUB 2	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	8	R\$ 34.559,68	296,8074
AR 13 EM FRENTE AO PEC PRÓXIMO AO RESTAURANTE COMUNITÁRIO	SOBRADINHO II (RA XXVI)	15	R\$ 51.360,36	368,1038
EQNM 21/23 - CAMPO DE FUTEBOL / PEC	CEILÂNDIA (RA IX)	20	R\$ 80.857,52	495,3067
CAMPO SINTÉTICO QC 03, CONJUNTO 04	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	12	R\$ 62.690,52	511,8468
CAMPO SINTÉTICO, CAUB 2	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	8	R\$ 34.559,68	296,8074
AREA VERDE, QN 22, CONJUNTO 03 E 04	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	8	R\$ 17.835,92	153,0501
TOTAL		71	R\$ 281.863,67	2.121,9222

Fonte: Diretoria de Planejamento e Engenharia

Destacamos que a partir do mês de abril/25 estão sendo consideradas como “Obras Concluídas”, aquelas concluídas pela área técnica e que foi realizado o orçamento *as built* do Banco de Crédito e enviado formalmente ao Poder Concedente.

2.1.7. Modernização

Considerando a Substituição de Quadros de Comando, item previsto nos Serviços Acessórios do PME.

“A CONCESSIONÁRIA deve realizar a troca de todos os quadros de comando dos circuitos de iluminação pública utilizados no Distrito Federal em estado avançado de degradação, usando tecnologias obsoletas como proteção por fusíveis e que possuam grau de proteção inferior a IP66 devesse o ser trocados por quadros novos com proteção por disjuntores e grau de proteção IP66.”

Segue, abaixo, a distribuição mensal dos 723 quadros modernizados até o mês de agosto de 2026, incluindo dados relativos às modernizações realizadas no final do mês de julho/2026 que não foram contabilizadas no relatório anterior.

Tabela 3: Atualização da Modernização dos quadros de Comando

Mês	IP-1	IP-2	IP-3	Total/Mês
dez/25	0	2	0	2
jan/26	28	63	0	91
fev/26	59	122	3	184
jun/26	71	94	0	165
jul/26	65	119	0	184
ago/26	31	66	0	97
Total/Tipo	254	466	3	723

2.1.8. Resumo do Parque de Iluminação Pública por tipo e potência no mês

Segue, abaixo, o resumo do parque de IP por tipo e potência no mês, cadastrado no SCG, em 06/08/2026, data-base do faturamento do consumo de energia elétrica do Parque de Iluminação Pública:

Tabela 3: Resumo do parque de IP por tipo e potência no mês

Tipo Lâmpada	POT. UNIT. (W)	PERDA REATOR (W)	POT. UNIT. TOTAL (W)	Quant. Final	POT. TOTAL (W)
VS 70	70	14	84	0	0
VS 600	600	54	654	0	0
VS 400	400	38	438	2	876
VS 250	250	30	280	0	0
VS 200	200	29	229	0	0
VS 150	150	22	172	2	344
VS 100	100	17	117	0	0
VM 400	400	40	440	0	0
VM 250	250	28	278	0	0
VM 150	150	18	168	0	0
VM 125	125	15	140	0	0
MVM 70	70	14	84	0	0
MVM 400	400	29	429	29	12.441
MVM 250	250	23	273	29	7.917
MVM 2000	2.000	100	2.100	52	109.200
MVM 150	150	22	172	378	65.016
MVM 1000	1.000	50	1.050	0	0
LED 80	80	-	80	2.324	185.920
LED 76	76	-	76	54	4.104
LED 72	72	-	72	10.871	782.712
LED 70	70	-	70	71.617	5.013.190
LED 68	68	-	68	1.198	81.464
LED 600	600	-	600	803	481.800
LED 60	60	-	60	257	15.420

LED 55	55	-	55	427	23.485
LED 54	54	-	54	1.216	65.664
LED 52	52	-	52	1	52
LED 50	50	-	50	73	3.650
LED 480	480	-	480	29	13.920
LED 45	45	-	45	516	23.220
LED 400	400	-	400	80	32.000
LED 40	40	-	40	19.878	795.120
LED 36	36	-	36	257	9.252
LED 314	314	-	314	1.060	332.840
LED 305	305	-	305	568	173.240
LED 304	304	-	304	0	0
LED 303	303	-	303	17	5.151
LED 302	302	-	302	0	0
LED 280	280	-	280	86	24.080
LED 271	271	-	271	2	542
LED 267	267	-	267	226	60.342
LED 254	254	-	254	3	762
LED 250	250	-	250	4	1.000
LED 248	248	-	248	9	2.232
LED 245	245	-	245	10.915	2.674.175
LED 244	244	-	244	5.965	1.455.460
LED 241	241	-	241	9.038	2.178.158
LED 240	240	-	240	44.911	10.778.640
LED 220	220	-	220	58	12.760
LED 215	215	-	215	22.148	4.761.820
LED 214	214	-	214	2	428
LED 205	205	-	205	20	4.100
LED 202	202	-	202	68	13.736
LED 201	201	-	201	144	28.944
LED 200	200	-	200	182	36.400
LED 180	180	-	180	115	20.700
LED 18	18	-	18	656	11.808
LED 163	163	-	163	8	1.304
LED 161	161	-	161	4	644
LED 160	160	-	160	1.778	284.480
LED 153	153	-	153	1	153
LED 150	150	-	150	32.316	4.847.400
LED 120	120	-	120	76.402	9.168.240
LED 115	115	-	115	270	31.050
LED 111	111	-	111	35	3.885
LED 110	110	-	110	12.252	1.347.720
LED 100	100	-	100	2.084	208.400

2.1.9. Receitas Acessórias

São receitas obtidas por meio de atividades relacionadas ao objeto do Contrato de Concessão.

No mês de Agosto/26 houve a celebração de 1 (um) Contrato de Receita Acessória com a CANTO & CALDAS PARTICIPACOES LTDA, no valor de R\$ 179.362,43 (cento e setenta e nove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos).

3. INDICADORES DE DESEMPENHO

O Contrato de Concessão pressupõe a prestação de serviço adequado aos usuários, sendo considerado serviço adequado aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade da contraprestação.

Diante disso, o Contrato de Concessão possui como Anexo IV – Indicadores de Desempenho, um documento que tem por objetivo estabelecer os parâmetros de qualidade e desempenho dos serviços a serem atendidos pela CEB IPES.

Esses parâmetros de qualidade e desempenho serão aferidos através da avaliação de um conjunto de “Indicadores de Desempenho”, que compõem o “Sistema de Mensuração de Desempenho – SMD”.

A avaliação será realizada por meio do cálculo do Índice de Desempenho Geral – IDG, composto por 05 (cinco) critérios de desempenho específicos, sendo:

- Critério de Disponibilidade (CD) – avalia a disponibilidade da iluminação pública;
- Critério de Qualidade (CQ) – avalia a qualidade dos serviços prestados e os níveis de iluminação;
- Critério de Operação (CO) – avalia a disponibilidade da infraestrutura e a prestação dos serviços, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos para a sua execução;
- Critério de Conformidade (CC) – avalia o atendimento aos prazos e requisitos exigidos para a apresentação de certificados e relatórios; e,
- Critério de Eficientização (CE) – avalia os níveis de eficiência energética atingidos pela CEB IPES.

3.1. Apuração dos Indicadores

3.1.1 Indicador de Pontos Acesos à Noite – IPAN

Compõe o Critério de Disponibilidade (CD), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade de Luz (IDL)”.

Visa apurar se os pontos de iluminação pública estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente acesos durante a noite.

Neste período de agosto de 2026 não houve apuração do IPAN, por equipes da CEBIPES,

conforme demonstrado na figura 2.

Mensuração:

Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

Figura 2 - IPAN Resumido – Sistema Exati – Conferir no Exati

Nome	Valor	Porcentagem
Total de pontos avaliados	0	100.00%
Total de pontos conformes	0	100.00%
Total de pontos não conformes	0	0.00%
IPAN calculado = (Total de pontos conformes / Total de pontos avaliados)	100.00%	
Nota IPAN	1.00	
Nota IL = (Peso IPAN (1.0) x Nota IPAN)	1.00	
Nota CD = (100% x Nota IL)	1.00	

(Extraído do Exati em 01/09/2026)

A figura 2 corresponde aos resultados apurados no Sistema Exati. Mantem-se a necessidade de implementar no Exati, a segregação das avaliações, tendo em vista que o cálculo no sistema considera todas as avaliações efetuadas no período, independente da entidade executora.

3.1.2 Indicador Iluminância e Uniformidade – IIL

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)”.

Visa apurar se um ponto de iluminação pública modernizado verificado atende ao nível de Iluminância e Uniformidade para as classes de iluminação das vias de veículos e pedestres.

Mensuração:

No mês de agosto/26 não foram realizadas avaliações técnicas pela equipe da CEB IPES para mensuração de iluminância e cálculo da uniformidade, resultando nos dados da figura 3. As avaliações detalhadas constam no sistema EXATI.

Figura 3 - IIL Resumido – Sistema Exati

Nome	Valor	Porcentagem
Total de pontos avaliados	0	100.00%
Total de pontos conformes	0	100.00%
Total de pontos não conformes	0	0.00%
IIL calculado = (Total de pontos conformes / Total de pontos avaliados)	100.00%	
IIL	1.00	

(Extraído do Exati em 01/09/2026)

Esse índice ainda não é passível de sanção, a CEB IPES e o Verificador Independente já iniciaram a aferição deste indicador para acompanhamento da evolução. Neste mês tivemos uma melhora no percentual de pontos conformes em comparação com o mês anterior. Como pode-se notar foi implementado no sistema Exati a segregação das

avaliações, por empresa usuária, podendo assim separar os levantamentos de campo realizados pelo Verificador Independente (OPUS 1) e da Concessionária (CEB IPES).

3.1.3 Indicador de Temperatura de Cor – ITC

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)”.

Visa apurar se um ponto de iluminação pública modernizado verificado atende ao nível de Temperatura de Cor.

Mensuração:

No mês de agosto/26 não foram realizadas avaliações técnicas pela equipe da CEB IPES para mensuração de temperatura de cor, resultando nos dados da figura 4 do sistema EXATI.

Figura 4 - ITC Resumido – Sistema Exati



Mês	Valor	Porcentagem
Total de pontos avaliados	0	100.00%
Total de pontos conformes	0	100.00%
Total de pontos não conformes	0	0.00%
ITC calculado = (Total de pontos conformes / Total de pontos avaliados)	100.00%	
ITC	1.00	

(Extraído do Exati em 01/09/2026)

Esse índice ainda não é passível de sanção. Como pode-se notar foi implementado no sistema Exati a segregação das avaliações, por empresa usuária, podendo assim separar os levantamentos de campo realizados pelo Verificador Independente (OPUS 1) e da Concessionária (CEB IPES).

3.1.4 Indicador de Reprodução de Cor – IRC

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)”.

Visa apurar se um ponto de iluminação pública modernizado verificado atende ao nível de índice de Reprodução de Cor.

Mensuração:

No mês de agosto/26 não foram realizadas avaliações técnicas pela equipe da CEB IPES para mensuração de reprodução de cor em todos os lotes, resultando nos dados da figura 5 do sistema EXATI.

Figura 5 - IRC Resumido – Sistema Exati



Nome	Valor	Porcentagem
Total de pontos avaliados	0	100.00%
Total de pontos conformes	0	100.00%
Total de pontos não conformes	0	0.00%
IRC calculado = Total de pontos conformes / Total de pontos avaliados	100.00%	
IRC	100	

(Extraído do Exati em 01/09/2026)

Esse índice ainda não é passível de sanção. Como pode-se notar foi implementado no sistema Exati a segregação das avaliações, por empresa usuária, podendo assim separar os levantamentos de campo realizados pelo Verificador Independente (OPUS 1) e da Concessionária (CEB IPES).

3.1.5 Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização - ICL

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Qualidade de Dados (IQD)”.

Visa apurar a conformidade da caracterização da localização (logradouro, bairro, número do ponto de iluminação pública e posição georreferenciada), através do comparativo entre os dados do cadastro da rede distrital de iluminação pública e a informação verificada *in loco*.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo obrigatoriedade da aferição mensal. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliado somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.6 Indicador da Conformidade da Potência Total - ICP

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Qualidade de Dados (IQD)”.

Visa apurar a conformidade da potência total do ponto de iluminação pública, através do comparativo entre os dados do cadastro da rede distrital de iluminação pública e a informação verificada *in loco*.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo obrigatoriedade da aferição mensal. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliado somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.7 Indicador da Conformidade das Demais Informações do Cadastro - ICIC

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Qualidade de Dados (IQD)”.

Visa apurar a conformidade de algumas informações (caracterização, modelo da luminária, tecnologia da lâmpada, tipo de poste, altura de instalação da luminária, tipo de braço, quantidade de pontos, tipo de rede) do cadastro dos pontos de iluminação pública, através do comparativo entre os dados do cadastro da rede distrital de iluminação pública e a informação verificada *in loco*.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo obrigatoriedade da aferição mensal. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliado somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.8 Indicador de Pontos Apagados Durante o dia - IPAD

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Acendimento Diurno (IAD)”.

Visa apurar se o ponto de iluminação pública está efetivamente apagado durante o dia, conforme verificação *in loco* ou pela telegestão.

Mensuração:

Neste período de agosto de 2026 não houve apuração do IPAD, conforme demonstrado na figura 6.

Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

Figura 6 – IPAD Resumido



Nome	Valor	Porcentagem
Total de pontos avaliados	0	100.00%
Total de pontos conformes	0	100.00%
Total de pontos não conformes	0	0.00%
IPAD calculado = (Total de pontos conformes / Total de pontos avaliados)	100.00%	
Nota IPAD	100	
Nota IAD = (Nota IPAD 0.00 + Nota IPAD)	100	

(Extraído do Exati em 01/09/2026)

A Figura 6 corresponde ao indicador emitido no Sistema Exati. Como pode-se notar foi implementado no sistema Exati a segregação das avaliações, por empresa usuária, podendo assim separar os levantamentos de campo realizados pelo Verificador Independente (OPUS 1) e da Concessionária (CEB IPES).

3.1.9 Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados - IDSGC

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC)”.

Visa apurar se a central de atendimento operada pela CEB IPES está disponível de forma ininterrupta para o recebimento de chamados.

Mensuração:

O indicador de disponibilidade do sistema de gestão de chamados (call center) Emitido no sistema EXATI foi de 100%.

Figura 8: IDSGC – Sistema Exati



Metric	Value
Tempo total previsto para o período	744.00 h
Tempo total de disponibilidade do sistema	743.83 h
Tempo total de indisponibilidade do sistema	0.17 h
IDSGC calculado = (Tempo total de disponibilidade do sistema / Tempo total previsto para o período)	100.00%
IDSGC	100

(Extraído do Exati em 01/09/2026)

3.1.10 Indicador de Cumprimento do Tempo de Espera - ITM

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC)”.

Visa apurar o tempo de espera das chamadas a partir da entrada da chamada até a transferência para o atendente, tendo o prazo máximo como 60 segundos.

Mensuração:

O indicador de cumprimento do tempo de espera (call center) calculado em função dos dados do sistema EXATI foi de 99,00%, sendo que das 2.404 chamadas recebidas pelo call center, 2.386 foram atendidas antes de 60 segundos

Figura 10 - ITM – Sistema Exati



Metric	Value
Total de chamadas atendidas dentro do tempo de espera (até 60s)	2386
Total de chamadas atendidas via call center	2404
ITM calculado = (Total de chamadas atendidas dentro do tempo de espera (até 60s) / Total de chamadas atendidas via call center)	99.00%
ITM	100

(Extraído do Exati em 01/09/2026)

3.1.11 Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão - IDST

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT)”.

Visa apurar se o sistema de telegestão (número de pontos de iluminação telegerencíveis) implantado pela CEB IPES, bem como suas funcionalidades básicas estão disponíveis de forma ininterrupta.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliados somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.12 Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão - IDFST

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT)”.

Visa apurar se o sistema de telegestão (número de pontos de iluminação telegerencíveis) implantado pela CEB IPES, bem como suas funcionalidades básicas estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento. Devem ser observadas, minimamente, as seguintes funcionalidades: conformidade entre a localização geográfica e a verificada *in loco*, conformidade entre o *status* dos dispositivos, registro atualizado do consumo de energia e operação remota via sistema de telegestão.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliados somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.13 Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - IPOM

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Cumprimento dos Prazos (ICP)”.

Visa apurar se os prazos para solução dos chamados de manutenção corretiva estão sendo cumpridos pela CEB IPES.

Mensuração:



Índice de Cumprimento dos Prazos - ICP/IPOM Resumido		
Item	Valor	Porcentagem
Total de chamados	404	100,00%
Total de chamados atendidos no prazo	2364	58,30%
Total de chamados fora do prazo	1680	41,70%
IPOM calculado = (Total de chamados atendidos no prazo / Total de chamados)	0,56	56,00%
Nota IPOM	0,30	
Nota ICP = (Peso IPOM (1,0) * Nota IPOM)	0,30	

(Extraído do Exati em 14/09/2026)

Figura 11 - IPOM – Sistema Exati

Neste mês, observando melhora em relação ao calculado no mês anterior.

3.1.14 Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais – ICDM

Compõe o Critério de Conformidade (CC), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Conformidade dos Certificados (ICC)”.

Visa apurar a conformidade do tratamento e descarte dos materiais, sendo avaliado através da apresentação de certificado válido e expedido por empresa credenciada e autorizada, de descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes retirados da rede de iluminação pública.

Mensuração:

Figura 12 - ICDM e ICC – Sistema Exati



Indicador ICDM e ICC

Ajuda

Certificados

Novo Certificado

Data inicial: 01/08/2026 Data final: 31/08/2026

Icdm: 1 Icdm: 1 Período de validade: 01/04/2026 à 31/03/2027

Descrição	Data entrega ↓	Em conformidade	Tem anexo
Certificado de Descarte de Material - ENG 08/2026	01/08/2026	Sim	Sim

(Extraído do Exati em 22/09/2026)

Os atuais contratos estabelecem que a gestão e o descarte dos materiais poluentes são de responsabilidade das Contratadas, conforme abaixo:

- Contrato de Obras: Engeluz Iluminação e Eletricidade;
- Contratos de Manutenção: Engeluz Iluminação e Eletricidade, Diamante Engenharia, RH Engenharia e Real Energy.
- Contrato de Reposição: Diamante Engenharia;
- Contratos de Modernização: Dan Engenharia e RH Engenharia.

A CEB IPES faz o acompanhamento dos quantitativos retirados do parque de iluminação pública, a fiscalização do acondicionamento nas instalações das Contratadas e a certificação do correto descarte. As Contratadas acondicionam os materiais poluentes em caixas apropriadas, conforme o estado de conservação do resíduo, até serem entregues à empresa credenciada.

3.1.15 Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços – ICRES

Compõe o Critério de Conformidade (CC), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Conformidade das Informações (ICI)”.

Visa apurar se o Relatório de Execução dos Serviços está sendo entregue dentro do prazo e seguindo as exigências do Anexo I – Caderno de Encargos.

Mensuração:

Figura 13 - ICRES – Sistema Exati



Conforme demonstrado na “Figura 13 – ICRES – Sistema Exati”, do total de relatórios entregues no período, 100% foi considerado como “conforme”, resultando assim em uma “Nota ICRES” igual a “1”, de acordo com os critérios definidos no item 6.3.1 do Anexo IV – Indicadores de Desempenho.


3.1.16 Indicador da Transparência da Concessão – ITC

Compõe o Critério de Conformidade (CC), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Conformidade das Informações (ICI)”.

Visa apurar se o processo de transparência da Concessão foi realizado conforme detalhamento previsto no item 3.21 do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, o qual prevê que, a CEB IPES deve divulgar, minimamente, os seguintes documentos: relatório trimestral de desempenho, ofícios de aprovação emitidos pelo Poder Concedente, Contrato de Concessão e Termos Aditivos, Contratos de atividades relacionadas e demonstrações financeiras.

Mensuração:

Figura 14 – ITC – Sistema Exati

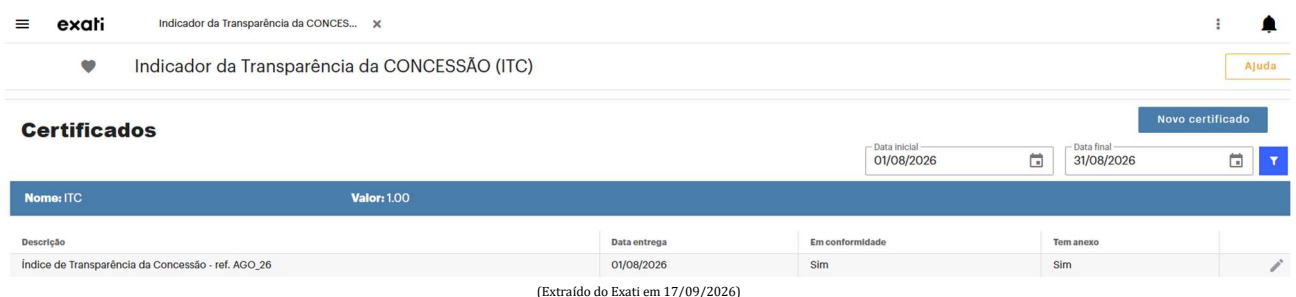

Conforme demonstrado na “Figura 14 – ITC – Sistema Exati”, o processo de transparência da Concessão foi devidamente cumprido, resultando assim em uma “Nota ITC” igual a “1”, de acordo com os critérios definidos no item 6.3.2 do Anexo IV – Indicadores de Desempenho.

3.1.17 Indicador de Eficientização - IE

Compõe o Critério de Eficientização (CE), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Eficientização (IE)”.

Visa apurar o cumprimento dos níveis mínimos de eficientização, conforme os Marcos da Concessão definidos no Anexo I – Caderno de Encargos.

Mensuração:

Não há mensuração no período de execução. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliados somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório Mensal de Serviços é uma obrigação do Contrato de Concessão. Este documento refere-se ao mês de agosto de 2026, mas possuindo alguns dados de meses anteriores.

Cumprе salientar que as luminárias de LED para manutenção e eficientização estão sendo entregues por lote, passando por ensaios de recebimento junto a laboratório credenciado antes da aplicação no parque de iluminação pública.

Por fim, junto a este Relatório, enviamos uma planilha em Excel com os dados completos dos protocolos abertos durante o mês, em atendimento ao item 4.1.5 do Caderno de Encargos da Concessionária.

Relatório Mensal de Execução de Serviços de Iluminação Pública

Tabela 8: Quantidade Diária dos Protocolos por Reclamação (item 7.4.9 – b) no Mês de agosto de 2026, canais utilizados pelo cidadão.

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL														
RELATÓRIO DE ATIVIDADES														
Quantidade diária dos protocolos por reclamação														
														Mês de Referência: agosto/2026
Dia	05 ou mais pontos acesos de dia em sequência	05 ou mais pontos apagados de noite em sequência	Choque Elétrico	Fiação danificada	Fiação exposta	Luminária Acesa Durante o Dia	Luminária Apagada Durante a Noite	Luminária com baixa intensidade	Luminária Furtada/Vandalizada	Luminária Oscilando	Poste Caído	Poste torto ou danificado	Reposição Cabo Preventivo	Totais
01/08/2026	2	26				6	73			4	1	2		114
02/08/2026		30				1	56	1	1			1		90
03/08/2026		59				4	100	4	2	8		1	2	180
04/08/2026	2	36	1		1		133	1		3		3	3	183
05/08/2026	3	31				5	93		1	6	2	3	1	145
06/08/2026		32	1		1	2	91	2	2	4	3	1		139
07/08/2026		19			1	1	65		1	3	2			92
08/08/2026	2	13				1	53		2		1			72
09/08/2026		10					27			2				39
10/08/2026	1	60	1			3	82		6	4	1	2		160
11/08/2026	3	36			1	2	125	1	3	2		3	2	178
12/08/2026		33	1				165	3	1	2		2	2	209
13/08/2026	1	41	1			1	209	5	1	4		1	1	265
14/08/2026	1	25	2			2	75			3	1	1	1	111
15/08/2026		23					69			3		2	3	100
16/08/2026		9			2	1	50	2	1	1				66
17/08/2026		47			6	3	234	2	2	7			3	304
18/08/2026		56			2	2	105		1	8	1	3	15	193
19/08/2026		39	2		1	4	95	1	1	4	2	3	4	156
20/08/2026		37				4	111	2	3	4		3	2	166
21/08/2026		46			3	1	113		1	5	1		1	171
22/08/2026	1	28				1	56		1	1				88
23/08/2026	3	15	1				49		1	3	3	1	1	77
24/08/2026		55			2	4	122	5		11	1	1	4	205
25/08/2026	1	75	1		7	1	106	1	1	6	1	2		202
26/08/2026		53	4		5	2	84	5		2	1		2	158
27/08/2026	2	72	3		1	3	123			6		1	4	215
28/08/2026	1	63		1	2	3	103		3	6	1	2	1	186
29/08/2026	1	15	4		1	1	39	2	1	5				69
30/08/2026	2	37	6		1	1	62		2	4		1	2	118
31/08/2026	1	54	2	1	3	3	122	1	2	9	2	3	11	214
Total	27	1.175	30	2	40	62	2.990	38	40	130	24	42	65	4.665

Tabela 9: Material Utilizado (item 7.4.9 – g) no Mês de agosto de 2026

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MATERIAIS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

Mês de Referência: **ago-26**

#	Descrição sucinta	Quantidade	Unidade
1	Cabo de cobre isolado 4x16mm ²	3.143,0	metro
2	Cabo de cobre isolado 2x4mm ²	2.715,5	metro
3	Cabo de cobre isolado 4x10mm ²	2.077,0	metro
4	Conector de Derivação Perfurante Cdp 150-35	1.925,0	unidade
5	Lâmpada / Módulo LED (reposição)	1.724,0	unidade
6	Cabo multiplexado de alumínio 10+10mm ² (trifásico e neutro)	860,0	metro
7	Luminária LED (fixture completa)	855,0	unidade
8	Conector Tipo Luva de Emenda (Compressão Cobre)	840,0	unidade
9	Cabo de cobre isolado 4x4mm ²	765,0	metro
10	Cabo de cobre isolado 4x25mm ²	464,0	metro
11	Cabo multiplexado de alumínio 16+16mm ² (trifásico e neutro)	431,0	metro
12	Cabo de cobre isolado 4x35mm ²	390,0	metro
13	Relé Fotoelétrico/Fotocontrolador	279,0	unidade
14	Conector Metálico Parafuso Fendido (Split Bolt)	224,0	unidade
15	Disjuntor Termomagnético	187,0	unidade
16	Contator Tripolar	68,0	unidade
17	Conector de Torção (Dedal)	68,0	unidade
18	Cabo de cobre isolado 2x2,5mm ² (flexível)	53,0	metro
19	Cabo de alumínio isolado XLPE Quadruplex 35mm ² (neutro nu 35mm ²)	40,0	metro
20	Fita Isolante Adesiva	36,0	unidade
21	Braço Longo para Luminária (3,595m)	18,0	unidade
22	Base para Relé com Suporte Metálico	11,0	unidade
23	Braço Médio para Luminária (2,411m)	4,0	unidade
	TOTAL	17.177,5	

1. Introdução

Trata-se de relatório do BANCO DE CRÉDITO do mês acima referenciado.

Conforme o que determina o CONTRATO DE CONCESSÃO de Iluminação Pública do Distrito Federal, no seu Anexo I - Caderno de Encargos, o BANCO DE CRÉDITO é o saldo de créditos disponível para serem utilizados nas seguintes atividades: *"novos pontos luminosos em decorrência do crescimento vegetativo, remanejamento de pontos de iluminação, com ou sem reaproveitamentos de postes, trocas e manutenção dos pontos luminosos em decorrência do crescimento vegetativo e trocas e manutenção devido a vandalismo"*.

Na DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO, em 25/03/2024, foram adicionados ao BANCO DE CRÉDITO o montante de **26.272 UNIDADES DE CRÉDITO** (UC), sendo 16.871 UC para uso em projetos de expansão e 9.402 UC para uso em correção de vandalis, remanejamento de rede de IP e reposição de ativo. A cada data de aniversário do CONTRATO, serão adicionados um determinado número de unidades de créditos ao BANCO DE CRÉDITO, determinado no Contrato de Concessão e calculados a partir das estimativas de crescimento vegetativo e vandalismo no Parque de IP do DF.

O item 11.1.3 do Caderno de Encargos, Anexo I do Contrato de Concessão, determina que *"os serviços de expansão e remanejamento do parque de iluminação pública, bem como das correções dos danos provocados por vandalismo, serão medidos para uso do saldo do BANCO DE CRÉDITOS. As medições serão realizadas utilizando-se da Planilha de Preços Unitários da Tabela 37. Os preços unitários da planilha são determinados em UNIDADE DE CRÉDITO"*.

Em 31/07/2024, os técnicos da CEB IPES e da SODF emitiram uma Nota Técnica Conjunta (SEI/GDF 147367449) intitulada *"Procedimento de Uso do Banco de Crédito – Contingenciamento de serviços e materiais faltantes"* onde recomendam a *"manutenção da execução dos serviços cobertos pelo BANCO DE CRÉDITO com realização de contingenciamento dos custos dos serviços e materiais faltantes da Tabela 37, bem como dos serviços com distorção considerável de valor, para fins de futuro ressarcimento"*.

Em 29/05/2025 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão (ID SEI 172102180) alterando a Tabela 37 do Caderno de Encargos, com inclusão de novos serviços e materiais no Banco de Créditos, conforme ANEXO D do referido Aditivo. Em 14/11/2025, foi assinado o Termo de Reratificação do Primeiro Aditivo (ID SEI 184008639) com os valores corrigidos das unidades de crédito dos serviços constantes da Tabela 37.

Assim, o presente relatório apresenta a Memória de Cálculo do saldo do BANCO DE CRÉDITO no mês de referência, **considerando a Tabela 37 atualizada** conforme parágrafo acima, as listas de eventos de uso dos créditos.

2. Uso do Banco de Crédito no mês de ago/2026

Os quadros a seguir apresentam a posição do Banco de Crédito no mês de referência, evidenciando o consumo de Unidades de Crédito (UC), o saldo disponível ao final do período e a correspondente necessidade de recomposição financeira. Os valores são apurados com base nos serviços executados no mês, conforme a Tabela 37 do Caderno de Encargos (Anexo I do Contrato de Concessão), e refletem a situação do Banco de Crédito até a data de encerramento da competência.

2.1. Situação do Banco de Crédito no mês

No mês de ago/2026, foram consumidas 11.947,2065 UC do Banco de Créditos Ordinários, correspondentes às atividades de Projetos de Expansão, Vandalismo, Remanejamento e Reposição executadas no período.

Em decorrência do consumo dos créditos, foi apurada necessidade de recomposição financeira de R\$ 4.036.244,24 conforme memória de cálculo apresentada neste relatório.

O saldo acumulado do Banco de Créditos ao final do mês é NEGATIVO, correspondendo a 17.827,6693 UC. Esse saldo representa uma necessidade acumulada de recomposição financeira de R\$ 6.022.899,79, razão pela qual se faz necessária a recomposição financeira pelo Poder Concedente, conforme previsto no Contrato de Concessão.

Indicador	Expansão	Van./Rem./Rep.	Total
Saldo anterior	5.909,1477 UC	(11.789,6105 UC)	(5.880,4628 UC)
Consumo do mês	7.664,5649 UC	4.282,6416 UC	11.947,2065 UC
Recomposição recebida no mês	0,0000 UC	0,0000 UC	0,0000 UC
Saldo ao final do mês			(17.827,6693 UC)

2.2 Controle das Recomposições Financeiras

O controle das recomposições financeiras é realizado por competência mensal, considerando o ciclo anual do Banco de Crédito estabelecido no Contrato de Concessão, compreendido entre os meses de abril de um ano e março do ano subsequente. A tabela a seguir apresenta o histórico das recomposições financeiras apuradas no ciclo vigente, indicando o processo administrativo correspondente, a situação de cada competência e o respectivo saldo pendente, permitindo o acompanhamento da tramitação até a efetiva recomposição financeira pelo Poder Concedente.

Competência	Valor de Recomposição Apurado	Processo SEI	Situação	Saldo Pendente
abr/26	R\$ 0,00	04028-00000544/2026-15	Sem déficit	R\$ 0,00
mai/26	R\$ 0,00	04028-00000646/2026-22	Sem déficit	R\$ 0,00
jun/26	R\$ 0,00	04028-00000760/2026-52	Sem déficit	R\$ 0,00
jul/26	R\$ 1.986.655,55	04028-00000891/2026-30	Em tramitação	R\$ 1.986.655,55
ago/26	R\$ 4.036.244,24	04028-00001061/2026-20	Em tramitação	R\$ 4.036.244,24
set/26				
out/26				
nov/26				
dez/26				
jan/27				
fev/27				
mar/27				
Total Pago	R\$ 0,00		Total Pendente	R\$ 6.022.899,79

3. Quadro de Serviços com Uso do Banco de Crédito em ago/2026


Os serviços executados no mês que geraram utilização do Banco de Crédito estão resumidos na tabela abaixo. O detalhamento de cada evento encontra-se nos Anexos II e III.

Anexo	Evento	Qt Serviços	Qt Luminárias	UC Ordinárias
Anexo II - EXPANSÃO - Lista de Obras Concluídas no Mês		5 Projetos	489 Lumin	7.664,5649 UC
Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês		40 Serviços	N/A	4.282,6416 UC

4. Fluxo de Processos

O fluxo abaixo apresenta as etapas para apuração, validação e contabilização das Unidades de Crédito decorrentes da execução dos Projetos de Expansão, desde o recebimento da demanda até o lançamento definitivo no Banco de Crédito.

Fluxo de Atividades para Apuração, Atesto e Débito de Unidades de Crédito



5. Lista de Anexos

Anexo I - Evolução do Banco de Crédito

Anexo II - EXPANSÃO - Lista de Obras Concluídas no Mês

Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês

Emissão:

Wires Santos Amorim

Gerente de Planejamento e Orçamento de Engenharia
CEB IPES

Aprovação:

Mauro Landim

Diretor de Planejamento e Engenharia
CEB IPES

Relatório do Banco de Crédito de ago/2026

Anexo I - Evolução do Banco de Crédito

A. CREDITOS ORDINÁRIOS ACUMULADOS

	Projetos Expansão	Van/Rem/Rep	Consolidado Geral
Saldo Inicial	17.285,9452 UC	9.401,8466 UC	26.687,7918 UC
Realizado	19.041,3624 UC	25.474,0987 UC	44.515,4611 UC
Saldo Final	(1.755,4172 UC)	(16.072,2521 UC)	(17.827,6693 UC)

B. CREDITOS ORDINÁRIOS REALIZADOS

BANCO DE CRÉDITO ORDINÁRIO REALIZADO							
BC >>	PROJETOS DE EXPANSÃO		VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO		CONSOLIDADO		CONSOLIDADO
Novos Créditos >>	Novo Crédito	Saldo Anterior	Novo Crédito	Saldo Anterior	Novo Crédito		Saldo Anterior
	17.285,9453 UC	0,0000 UC	9.402,0000 UC	0,0000 UC	26.687,9453 UC	0,0000 UC	0,0000 UC
Mês	Executado	Saldo	Executado	Saldo	Realizado	Recomposto	Saldo
Total >>	19.041,3624 UC	17.285,9452 UC	25.474,0987 UC	9.401,8466 UC	44.515,4611 UC	0,0000 UC	26.687,7918 UC
abr/2026	8.337,4341 UC	8.948,5111 UC	6.451,4361 UC	2.950,4105 UC	14.788,8702 UC		11.898,9216 UC
mai/2026	0,0000 UC	8.948,5111 UC	5.219,6923 UC	(2.269,2818 UC)	5.219,6923 UC		6.679,2293 UC
jun/2026	1.214,2486 UC	7.734,2625 UC	4.106,3476 UC	(6.375,6294 UC)	5.320,5962 UC		1.358,6331 UC
jul/2026	1.825,1148 UC	5.909,1477 UC	5.413,9811 UC	(11.789,6105 UC)	7.239,0959 UC		(5.880,4628 UC)
ago/2026	7.664,5649 UC	(1.755,4172 UC)	4.282,6416 UC	(16.072,2521 UC)	11.947,2065 UC		(17.827,6693 UC)

C. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA

RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA DO CRÉDITO REALIZADO			
Mês	Valor Unitário da UC	UC Excedente	Valor a Recompor (R\$)
Totais >>	Valores Acumulados >>	(17.827,6693 UC)	(R\$ 6.022.899,79)
abr/26	337,84 UC	0,0000 UC	R\$ 0,00
mai/26	337,84 UC	0,0000 UC	R\$ 0,00
jun/26	337,84 UC	0,0000 UC	R\$ 0,00
jul/26	337,84 UC	(5.880,4628 UC)	(R\$ 1.986.655,55)
ago/26	337,84 UC	(11.947,2065 UC)	(R\$ 4.036.244,24)

Relatório do Banco de Crédito de ago/2026

Anexo II - EXPANSÃO - Lista de Obras Concluídas no Mês

Data Solicitação	No do Projeto	No SEI	Título	RA	Qt Luminárias	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)
Quantidade:		5 Projetos		Totais:	489	7.664,5649
-	22CEB955	00113-00017242/2021-15	DF 140 Etapa 01 - Entre o Km 07 e a divisa com Goiás - Jardim Botânico	JARDIM BOTÂNICO (RA XXVII)	399	5.583,0988
-	26CEB063/26C EB970	00001-00033400/2025-30	CAMPO SINTÉTICO DO ALVORADA QUADRAS 02/04	GAMA (RA II)	30	626,1781
-	26CEB946	00141-00003114/2026-35	712 NORTE W3 e 1/2 AVENIDA COMERCIAL	PLANO PILOTO (RA I)	14	187,6172
-	26CEB947	00110-00001357/2024-15	PONTE VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ-NÚCLEO BANDEIRANTE - ETAPA 3	GUARÁ (RA X)	18	678,7167
-	26CEB969/26C EB064	04028-00000516/2026-90	QE 56 CONJ D	GUARÁ (RA X)	28	588,9541

Relatório do Banco de Crédito de ago/2026

Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês

Data Solicitação	No do Orçamento	Endereço	RA	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)
Quantidade: 40 Serviços			Totais:	4.282,6416
01/08/2026	26VRR330	DF-010, próximo a Brasília Norte	SIA (RA XXIX)	73,3162
01/08/2026	26VRR331	SQNW 105, Bloco B	PLANO PILOTO (RA I)	13,2946
01/08/2026	26VRR332	EIXO MONUMENTAL PRÓXIMO AO VIADUTO DA EPIA	PLANO PILOTO (RA I)	38,9554
01/08/2026	26VRR333	Rua 8 Norte e Avenida das Araucárias	ÁGUAS CLARAS (RA XX)	38,3402
01/08/2026	26VRR334	SHIGS 703 BLOCO B - ÁREA VERDE	PLANO PILOTO (RA I)	8,1533
01/08/2026	26VRR335	DF-425, INCRA 06 - Gleba 2 Alexandre Gusmão	BRAZLÂNDIA (RA IV)	19,4777
01/08/2026	26VRR336	Q. 101 Conjunto 5 / Estrada Parque Contorno (DF-251)	RECANTO DAS EMAS (XV)	19,4777
01/08/2026	26VRR337	DF- 450, retorno da Granja do Torto	LAGO NORTE (RA XVIII)	16,8710
01/08/2026	26VRR338	AR 06, Conjunto 03 - ao lado da parada de ônibus	SOBRADINHO II (RA XXVI)	18,3222
01/08/2026	26VRR339	Quadra 15, Conjunto D - área especial (área verde entre casas)	SOBRADINHO (RA V)	25,6512
01/08/2026	26VRR340	BR-020, km 15 - próximo ao Córrego do Arrozal	PLANALTINA (RA VI)	33,7420
01/08/2026	26VRR341	DF-150, Balão da Fercal - próximo à Só Freios	FERCAL (RA XXXI)	11,8734
01/08/2026	26VRR342	Privê Lucena Roriz, Rua 1, Módulo 1 - Paróquia Nossa Senhora de Lourdes	CEILÂNDIA (RA IX)	72,8516
01/08/2026	26VRR343	Balão da DF-180 com a DF-080 (entroncamento com a DF-445)	BRAZLÂNDIA (RA IV)	123,8762
01/08/2026	26VRR344	QNM 29, Área Especial	CEILÂNDIA (RA IX)	49,9424
01/08/2026	26VRR345	QNP 05, Conjunto L - Quadradão da 05 (quadra de esportes)	CEILÂNDIA (RA IX)	11,8734
01/08/2026	26VRR346	DF-290, em frente ao DVO - Vila DVO, QM 100, Conjunto S	SANTA MARIA (RA XIII)	161,9942
01/08/2026	26VRR347	Setor Leste, Quadra 50, Conjunto L - campo	GAMA (RA II)	163,6331
01/08/2026	26VRR348	SHIGS 707/708 ASA SUL - PRAÇA 21 DE ABRIL	PLANO PILOTO (RA I)	1.259,2994
01/08/2026	26VRR349	SHCGN 716 NORTE, BLOCOS A,B,C,D,E - ASA NORTE	PLANO PILOTO (RA I)	380,6580
01/08/2026	26VRR350	DF 280 - ÁGUA QUENTE	RECANTO DAS EMAS (XV)	35,6202
01/08/2026	26VRR351	AVENIDA DAS NAÇÃO L4 NORTE - NAS PROXIMIDADES DA VILA PLANALTO	PLANO PILOTO (RA I)	47,4936
01/08/2026	26VRR352	ÁREA VERDE DO CONDOMÍNIO PORTO RICO	SANTA MARIA (RA XIII)	60,1844
01/08/2026	26VRR353	SQS 207 - CAMPO DE FUTEBOL	PLANO PILOTO (RA I)	122,5762
01/08/2026	26VRR354	QR 116 NA PRAÇA / QUADRA DE ESPORTE	SANTA MARIA (RA XIII)	262,4612
01/08/2026	26VRR355	QUADRA 805CONJUNTO 08 LOTE 01, EM FRENTE A ANTIGA PM	RECANTO DAS EMAS (XV)	12,7196
01/08/2026	26VRR356	QNM 18 18 CONJ A - NA FAIXA DE PEDESTRE	CEILÂNDIA (RA IX)	37,7250
01/08/2026	26VRR357	QNM 24 CONJ B - BECO	CEILÂNDIA (RA IX)	40,0227
01/08/2026	26VRR358	AVENIDA DAS NAÇÕES VIA L4 , PRÓXIMO A CAESB	PLANO PILOTO (RA I)	11,8734
01/08/2026	26VRR359	QUADRA 400 POR DO SOL	CEILÂNDIA (RA IX)	111,9132
01/08/2026	26VRR360	QUADRA COND GENESIS	CEILÂNDIA (RA IX)	145,3655

Relatório do Banco de Crédito de ago/2026

Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês

Data Solicitação	No do Orçamento	Endereço	RA	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)
01/08/2026	26VRR361	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO	CEILÂNDIA (RA IX)	5,5583
01/08/2026	26VRR362	QI 16 BLOCO E, T H, L	GUARÁ (RA X)	19,9940
01/08/2026	26VRR363	SQS 116 PRÓXIMO DA PEC E VIA EIXINHO W	PLANO PILOTO (RA I)	104,1938
01/08/2026	26VRR364	QI 25 BLOCO M - AVENIDA CENTRAL	GUARÁ (RA X)	9,6889
01/08/2026	26VRR365	CL 409 CAMPO SINTÉTICO	SANTA MARIA (RA XIII)	11,8734
01/08/2026	26VRR366	BR 060 NUCLO RURAL VARGEM DA BENÇÃO	RECANTO DAS EMAS (XV)	131,2019
01/08/2026	26VRR367	EPPN EM FRENTE AO PENINSULA SHOPPING	LAGO NORTE (RA XVIII)	19,4777
01/08/2026	26VRR368	SQS 202 - SUL	PLANO PILOTO (RA I)	247,4174
01/08/2026	26VRR369	BR 080 - FRENTE A ENTRADA DE BRAZLÂNDIA	BRAZLÂNDIA (RA IV)	303,6780

Orçamento de Expansão com Uso de Unidades de Crédito

Versão 9.1

Projeto N.º:	26CEB969	Data:	06/05/2026
Endereço:	QE 56 CONJ. D	Processo SEI:	04028-00000516/2026-90
Região Adm:	GUARÁ (RA X)	Modalidade:	sem RDU - NeoEnergia-BsB
Orçamentista:	Lindomar Soares Barbosa (Matr. 7571-0)	Resp. Técnico:	João Wellish

Síntese dos Resultados

Quantidade de Luminárias: **28 Lum**
Preço da Unidade de Crédito: **R\$ 337,84 /UC**

Total de Unidades de Crédito: **588,95 UC**
VPL Concessão: **R\$ 198.972,25**

Planilha de Serviços do Banco de Crédito

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	UC / Unidade	Valor em UC	Peso
2	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	un	4,0	2,8647 UC	11,46 UC	1,95%
4	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V4)	un	10,0	2,0177 UC	20,18 UC	3,43%
7	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V2)	un	4,0	14,9386 UC	59,75 UC	10,15%
9	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	un	10,0	5,6925 UC	56,93 UC	9,67%
41	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x4mm², cobre, Classe 2.	m	358,0	0,3238 UC	115,92 UC	19,68%
51	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	m	55,0	0,4514 UC	24,83 UC	4,22%
56	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	un	303,0	0,8877 UC	268,97 UC	45,67%
57	Aterramento - Rede Aérea Exclusiva, PG ou Quadro IP	un	14,0	0,9508 UC	13,31 UC	2,26%
58	Instalação de Comando - Quadro QIPA 1 ou 2	un	1,0	17,6072 UC	17,61 UC	2,99%

Observação:

1) Os itens e valores correspondem aos aprovados no Termo Aditivo 1º ao Contrato de Concessão (172102180).



Orçamento de Expansão com Uso de Unidades de Crédito

Versão 9.3

Projeto N.º:	26CEB947	Data:	28/08/2026
Endereço:	VIA DE LIGAÇÃO - PONTE	Processo SEI:	00110-00001357/2024-15
Região Adm:	GUARÁ (RA X)	Modalidade:	sem RDU - NeoEnergia-BsB
Orçamentista:	André dos Anjos Luz Júnior (Matr. 5336-8)	Resp. Técnico:	Mauro Landim

Síntese dos Resultados

Quantidade de Luminárias: 18 Lum
Preço da Unidade de Crédito: R\$ 337,84 /UC

Total de Unidades de Crédito: 678,72 UC
VPL Concessão: R\$ 229.297,65

Planilha de Serviços do Banco de Crédito

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	UC / Unidade	Valor em UC	Peso
11	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	un	11,0	4,9976 UC	54,97 UC	8,10%
12	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	un	7,0	9,6889 UC	67,82 UC	9,99%
41	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x4mm², cobre, Classe-2.	m	519,0	0,3238 UC	168,05 UC	24,76%
43	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x16mm², cobre, Classe-2.	m	3,0	0,5093 UC	1,53 UC	0,23%
46	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz sem poste	un	3,0	1,0407 UC	3,12 UC	0,46%
47	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	un	2,0	1,9140 UC	3,83 UC	0,56%
51	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	m	220,0	0,4514 UC	99,31 UC	14,63%
52	Rede Aparente de IP - Eletrocalha (MGAL)	m	2,0	0,9688 UC	1,94 UC	0,29%
56	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	un	286,0	0,8877 UC	253,88 UC	37,41%
57	Aterramento - Rede Aérea Exclusiva, PG ou Quadro IP	un	7,0	0,9508 UC	6,66 UC	0,98%
58	Instalação de Comando - Quadro QIPA 1 ou 2	un	1,0	17,6072 UC	17,61 UC	2,59%

Observação:

1) Os itens e valores correspondem aos aprovados no Termo Aditivo 1º ao Contrato de Concessão (172102180).

Orçamento de Expansão com Uso de Unidades de Crédito

Versão 9.3

Projeto N.º:

26CEB946

Data:

28/08/2026

Endereço:

712 NORTE - ASA NORTE

Processo SEI:

00141-00003114/2026-35

Região Adm:

PLANO PILOTO (RA I)

Modalidade:

sem RDU - NeoEnergia-BsB

Orçamentista:

André dos Anjos Luz Júnior (Matr. 5336-8)

Resp. Técnico:

Mauro Landim

Síntese dos Resultados

Quantidade de Luminárias: **14 Lum**
Preço da Unidade de Crédito: **R\$ 337,84 /UC**

Total de Unidades de Crédito: **187,6172 UC**
VPL Concessão: **R\$ 63.384,59**

Planilha de Serviços do Banco de Crédito

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	UC / Unidade	Valor em UC	Peso
2	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	un	14,0	2,8647 UC	40,11 UC	21,38%
53	Rede Aérea de Baixa Tensão - Exclusiva de IP - SEM poste	un	29,0	5,0866 UC	147,51 UC	78,62%

Observação:

1) Os itens e valores correspondem aos aprovados no Termo Aditivo 1º ao Contrato de Concessão (172102180).

Orçamento de Expansão com Uso de Unidades de Crédito

Versão 9.1

Projeto N.º:	26CEB970	Data:	05/08/2026
Endereço:	CAMPO SINTÉTICO ALVORADA	Processo SEI:	00001-00033400/2025-30
Região Adm:	GAMA (RA II)	Modalidade:	sem RDU - NeoEnergia-BsB
Orçamentista:	André dos Anjos Luz Júnior (Matr. 5336-8)	Resp. Técnico:	Mauro Landim

Síntese dos Resultados

Quantidade de Luminárias: 36 Lum
Preço da Unidade de Crédito: R\$ 337,84 /UC

Total de Unidades de Crédito: 626,18 UC
VPL Concessão: R\$ 211.548,01

Planilha de Serviços do Banco de Crédito

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	UC / Unidade	Valor em UC	Peso
11	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	un	30,0	4,9976 UC	149,93 UC	23,94%
12	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	un	6,0	9,6889 UC	58,13 UC	9,28%
41	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x4mm², cobre, Classe-2.	m	538,0	0,3238 UC	174,20 UC	27,82%
42	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x10mm², cobre, Classe-2.	m	40,0	0,3861 UC	15,44 UC	2,47%
43	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x16mm², cobre, Classe-2.	m	3,0	0,5093 UC	1,53 UC	0,24%
51	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	m	169,0	0,4514 UC	76,29 UC	12,18%
53	Rede Aérea de Baixa Tensão - Exclusiva de IP - SEM poste	un	3,0	5,0866 UC	15,26 UC	2,44%
56	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	un	100,0	0,8877 UC	88,77 UC	14,18%
57	Aterramento - Rede Aérea Exclusiva, PG ou Quadro IP	un	12,0	0,9508 UC	11,41 UC	1,82%
58	Instalação de Comando - Quadro QIPA 1 ou 2	un	2,0	17,6072 UC	35,21 UC	5,62%

Observação:

1) Os itens e valores correspondem aos aprovados no Termo Aditivo 1º ao Contrato de Concessão (172102180).

Orçamento de Expansão com Uso de Unidades de Crédito

Versão 9.4

Projeto N.º:

22CEB955

Data:

28/08/2026

Endereço:

DF 140 Etapa 01 - Entre o Km 07 e a divisa com Goiás

Processo SEI:

00113-00017242/2021-15

Região Adm:

JARDIM BOTÂNICO (RA XXVII)

Modalidade:

sem RDU - NeoEnergia-BsB

Orçamentista:

André dos Anjos Luz Júnior (Matr. 5336-8)

Resp. Técnico:

Mauro Landim

Síntese dos Resultados

Quantidade de Luminárias: **83 Lum**
Preço da Unidade de Crédito: **R\$ 337,84 /UC**

Total de Unidades de Crédito: **5583,0988 UC**
VPL Concessão: **R\$ 1.886.194,10**

Planilha de Serviços do Banco de Crédito

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	UC / Unidade	Valor em UC	Peso
1	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	un	12,0	3,4051 UC	40,86 UC	0,73%
2	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	un	1,0	2,8647 UC	2,86 UC	0,05%
6	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	un	4,0	15,4789 UC	61,92 UC	1,11%
11	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	un	33,0	4,9976 UC	164,92 UC	2,95%
12	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	un	33,0	9,6889 UC	319,73 UC	5,73%
41	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x4mm², cobre, Classe-2.	m	3.380,0	0,3238 UC	1094,44 UC	19,60%
42	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x10mm², cobre, Classe-2.	m	1.887,0	0,3861 UC	728,57 UC	13,05%
43	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x16mm², cobre, Classe-2.	m	230,0	0,5093 UC	117,14 UC	2,10%
47	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	un	44,0	1,9140 UC	84,22 UC	1,51%
50	Substituição de Comando - Quadro IP	un	2,0	0,4470 UC	0,89 UC	0,02%
51	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	m	4.639,0	0,4514 UC	2094,04 UC	37,51%
53	Rede Aérea de Baixa Tensão - Exclusiva de IP - SEM poste	un	2,0	5,0866 UC	10,17 UC	0,18%
56	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	un	845,0	0,8877 UC	750,11 UC	13,44%
57	Aterramento - Rede Aérea Exclusiva, PG ou Quadro IP	un	45,0	0,9508 UC	42,79 UC	0,77%
58	Instalação de Comando - Quadro QIPA 1 ou 2	un	4,0	17,6072 UC	70,43 UC	1,26%

Observação:

1) Os itens e valores correspondem aos aprovados no Termo Aditivo 1º ao Contrato de Concessão (172102180).

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/08/2026	26VRR330	REPOSIÇÃO	168m de cabo 4x4mm ² , 42m de MND e mecânica de 32m3 de vala com retroescavadeira para cabeamento.		242,0	1,4676	73,3162
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	168,0	0,1285	21,5880
01/08/2026			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	42,0	0,8877	37,2834
01/08/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	32,0	0,4514	14,4448
01/08/2026	26VRR331	REPOSIÇÃO	11m de kit cabo 2x4mm ² e 42m de cabo 4x4mm ² , escavação mecânica de 10m3 de vala		63,0	0,8876	13,2946
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	11,0	0,3076	3,3836
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	42,0	0,1285	5,3970
01/08/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	10,0	0,4514	4,5140
01/08/2026	26VRR332	REPOSIÇÃO	Reposição de 02 PAS 10m LED 150W, lançamento de 26m de kit cabo 2x4mm ² .		28,0	15,7865	38,9554
01/08/2026			PAS 10M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	2,0	15,4789	30,9578
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	26,0	0,3076	7,9976
01/08/2026	26VRR333	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 01 PAS 7,5m LED 150W , 01 PAS 10m LED 150W e 24m de KIT cabo 2x4mm ² .		26,0	31,2654	38,3402
01/08/2026			PAS 7,5M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/08/2026			PAS 10M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	24,0	0,3076	7,3824
01/08/2026	26VRR334	REPOSIÇÃO	Reposição 01 pas 5m led 40W, 8 m de kit cabo 2x4mm2.		9,0	6,0001	8,1533
01/08/2026			PAS 5M LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	1,0	5,6925	5,6925
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	8,0	0,3076	2,4608
01/08/2026	26VRR335	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 10m LED 150W e 13m de KIT cabo 2x4mm ² .		14,0	15,7865	19,4777
01/08/2026			PAS 10M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	13,0	0,3076	3,9988
01/08/2026	26VRR336	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 10m com luminária LED 150W, 13 m de Kit 2x4mm2.		14,0	15,7865	19,4777
01/08/2026			PAS 10M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	13,0	0,3076	3,9988
01/08/2026	26VRR337	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m sup 2 pet LED 240W, 17m de kit cabo 4x4mm ² .		19,0	14,8150	16,8710
01/08/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/08/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/08/2026	26VRR338	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 7,5m LED 120W, 11m de KIT cabo 2x4mm²		12,0	15,2462	18,3222
01/08/2026			PAS 7,5M LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V2)	1,0	14,9386	14,9386
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	11,0	0,3076	3,3836
01/08/2026	26VRR339	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAD 7,5m LED 150W ,22m de KIT cabo 2x4mm².		24,0	19,1916	25,6512
01/08/2026			PAD 7,5M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/08/2026			LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	1,0	3,4051	3,4051
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	22,0	0,3076	6,7672
01/08/2026	26VRR340	REPOSIÇÃO	Reposição de 02 PCR 16m sup 2 pet LED 240W, 34m de KIT cabo 4x4mm².		38,0	14,8150	33,7420
01/08/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
01/08/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	2,0	4,9976	9,9952
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	34,0	0,1285	4,3690
01/08/2026	26VRR341	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m sup 1 pet LED 240W, 17m de KIT cabo 4x4mm².		18,0	9,8174	11,8734
01/08/2026			PCR 16M SUP 1 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/08/2026	26VRR342	REPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE 02 PCR 16M , 02 SUPORTES DE 4 PET LED 240W, 100M DA CABO 4X4MM2 AÉREO, 02 BP LED 150W		112,0	20,1341	72,8516
01/08/2026			REMANEJAMENTO PCR 16M	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	2,0	1,9140	3,8280
01/08/2026			PCR 16M SUP 4 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
01/08/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	6,0	4,9976	29,9856
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	100,0	0,1285	12,8500
01/08/2026			BP LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	2,0	3,4051	6,8102
01/08/2026	26VRR343	REPOSIÇÃO	Reposição de 06 PCR 16m sup 2 pet LED 240W, 102m de KIT 4x4mm², 109m de cabo 4x10mm² aéreo.		223,0	15,0228	123,8762
01/08/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	6,0	9,6889	58,1334
01/08/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	6,0	4,9976	29,9856
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	102,0	0,1285	13,1070
01/08/2026			CABO 4X10MM2	Instalação de Cabo 4x10 mm2	109,0	0,2078	22,6502
01/08/2026	26VRR344	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, 17m de KIT 4x4mm², substituição de 04 luminárias LED 240W; reposição de 87m de cabo 4x10mm² aéreo.		189,0	15,0228	49,9424
01/08/2026			PCR 16M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/08/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	4,0	4,9976	19,9904
01/08/2026			CABO 4X10MM2	Instalação de Cabo 4x10 mm2	87,0	0,2078	18,0786
01/08/2026	26VRR345	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, 17m de KIT cabo 4x4mm².		18,0	9,8174	11,8734
01/08/2026			PCR 16M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/08/2026	26VRR346	REPOSIÇÃO	REPOSIÇÃO DE 05 PCR 16M SUP 2 PET LED 240W, 85M DE KIT 4X4MM2, RETIRADA DE 03 PAS 10M, REMANEJAMENTO 02 PAS 10M, 211M DA CABO 4X4MM2, 56M DE CABO 4X10MM2, 66M D3 DE VALA, 41M DE CABO 4X4MM2 AÉREO.		474,0	17,6452	161,9942
01/08/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	5,0	9,6889	48,4445
01/08/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	5,0	4,9976	24,9880
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	85,0	0,1285	10,9225
01/08/2026			NR	Não Remunerado	3,0	0,0000	0,0000
01/08/2026			REMANEJAMENTO COM POSTE	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	2,0	1,9140	3,8280
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	211,0	0,1285	27,1135
01/08/2026			CABO 4X10MM2	Instalação de Cabo 4x10 mm2	56,0	0,2078	11,6368
01/08/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	66,0	0,4514	29,7924
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	41,0	0,1285	5,2685
01/08/2026	26VRR347	REPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE 04 PCR 16M, SUBSTITUIÇÃO DE 16 LED 150W, 421M DE CABO 4X4MM2, 105M3 DE VALA.		546,0	5,8980	163,6331
01/08/2026			REMANEJAMENTO COM POSTE	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	4,0	1,9140	7,6560
01/08/2026			LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	16,0	3,4051	54,4816
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	421,0	0,1285	54,0985
01/08/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	105,0	0,4514	47,3970

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/08/2026	26VRR348	REPOSIÇÃO	06 unid. >> INSTALAÇÃO - Poste de aço, curvo, simples, engastado de 5,0 metros, com luminária LED-40W - PAS5LED40. 14 unid. >> INSTALAÇÃO - Poste de aço, curvo, simples, engastado de 5,0 metros, com luminária LED-70W - PAS5LED70. 32 unid. >> INSTALAÇÃO - Poste de aço, curvo, duplo, engastado de 7,50 metros, com luminárias 2xLED-120W - PAD7,5LED120(2). 01 unid. >> INSTALAÇÃO - Poste de aço, curvo, simples, engastado de 7,50 metros, com luminária LED-120W - PAS7,5LED120. 27 unid. >> RETIRADA - poste de aço, engastado, ornamental até 5,0 metros altura útil. 22 unid. >> RETIRADA - poste de aço, curvo, simples, engastado, ornamental de 7,50 metros altura útil. 03 unid. >> RETIRADA - poste de aço, curvo, duplo, engastado, ornamental de 7,50 metros altura útil. 02 unid. >> RETIRADA - poste de concreto, reto de 16,0 metros comprimento. 570m de MND, 1055m de cabo 4x4mm2, 706m de cabo 4x10mm2, 287m de cabo 4x16mm2, 369m3 de vala		3.126,0	31,2738	1.259,2994
01/08/2026			PAS 5M LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	6,0	5,6925	34,1550
01/08/2026			PAS 5M LED 70W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V3)	14,0	5,8159	81,4226
01/08/2026			PAD 7,5M LED 120W		32,0	0,0000	0,0000
01/08/2026			LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	32,0	2,8647	91,6704
01/08/2026			PAS 7,5M LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V2)	1,0	14,9386	14,9386
01/08/2026			NR	Não Remunerado	27,0	0,0000	0,0000
01/08/2026			NR	Não Remunerado	22,0	0,0000	0,0000
01/08/2026			NR	Não Remunerado	3,0	0,0000	0,0000
01/08/2026			NR	Não Remunerado	2,0	0,0000	0,0000
01/08/2026			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	570,0	0,8877	505,9890
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	1.055,0	0,1285	135,5675
01/08/2026			CABO 4X10MM2	Instalação de Cabo 4x10 mm2	706,0	0,2078	146,7068
01/08/2026			CABO 4X16MM2	Instalação de Cabo 4x16 mm2	287,0	0,2867	82,2829
01/08/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	369,0	0,4514	166,5666

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/08/2026	26VRR349	REPOSIÇÃO	05 unid. => Instalação de braço longo 3595 x 60mm com luminária 120W - BLG60LED120. 06 unid. =>Substituição de Luminária LED-120W para LED-150W em braço longo de rede aérea.10) 13 unid. => INSTALAÇÃO - Poste de aço, curvo, simples, engastado de 5,0 metros, com luminárias 2xLED-40W - PAS5LED40. 07 unid. => INSTALAÇÃO - Poste de aço, curvo, duplo, engastado de 5,0 metros, com luminárias 2xLED-40W - PAD5LED40(2). 03 unid. => INSTALAÇÃO - Poste de aço, curvo, simples, engastado de 7,50 metros, com luminária LED-120W - PAS7,5LED120. 07 unid. => INSTALAÇÃO - Poste de aço, curvo, duplo, engastado de 7,50 metros, com luminárias 2xLED-120W - PAD7,5LED120(2). 04 unid. => INSTALAÇÃO - Poste de concreto, circular, 9/300daN - sem ponteira PCR9-300 - Padrão Neoenergia. 19 unid. => RETIRADA - poste de aço, engastado, ornamental até 5,0 metros altura útil. 03 unid. => REMANEJAMENTO - poste de aço, curvo, simples, engastado, ornamental de 7,50 metros altura útil. (POSTE IP EM CIMA DA CALÇADA) 01 unid. => RETIRADA - poste de aço, curvo, duplo, engastado, ornamental de 7,50 metros altura útil. 04 unid. => RETIRADA - poste de aço, curvo, simples, engastado, ornamental de 7,50 metros altura útil.		91,0	61,4083	380,6580
01/08/2026			BP COM LUMINÁRIA DE LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	5,0	2,8647	14,3235
01/08/2026			LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	5,0	3,4051	17,0255
01/08/2026			LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	6,0	3,4051	20,4306
01/08/2026			PAS 5M LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	13,0	5,6925	74,0025
01/08/2026			PAD 5M LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	7,0	5,6925	39,8475
01/08/2026			LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	7,0	5,6925	39,8475
01/08/2026			PAS 7,5M LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V2)	3,0	14,9386	44,8158
01/08/2026			PAD 7,5 LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz COM poste (V2)	7,0	14,9386	104,5702
01/08/2026			LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	7,0	2,8647	20,0529
01/08/2026			NR	Não Remunerado	4,0	0,0000	0,0000
01/08/2026			NR	Não Remunerado	19,0	0,0000	0,0000
01/08/2026			REMANEJAMENTO COM POSTE	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	3,0	1,9140	5,7420
01/08/2026			NR	Não Remunerado	1,0	0,0000	0,0000

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/08/2026			NR	Não Remunerado	4,0	0,0000	0,0000
01/08/2026	26VRR350	REPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE 03 PCR 16M, RISCO DE QUEDA, 51M DE KIT 4X4MM2.		54,0	9,8174	35,6202
01/08/2026			PCR 16M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	3,0	9,6889	29,0667
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	51,0	0,1285	6,5535
01/08/2026	26VRR351	REPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE 04 PCR 16M COM RISCO DE QUEDA, 68M DE KIT CABO 4X4MM2		72,0	9,8174	47,4936
01/08/2026			PCR 16M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	4,0	9,6889	38,7556
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	68,0	0,1285	8,7380
01/08/2026	26VRR352	REPOSIÇÃO	132M DE CABO 4X16MM2 ALU AÉREO, SUBSTITUIÇÃO DE 04 LED 240W DANIFICADAS.		136,0	5,3021	60,1944
01/08/2026			CABO 4X16MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x16 mm ²	132,0	0,3045	40,1940
01/08/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	4,0	4,9976	19,9904
01/08/2026	26VRR353	REPOSIÇÃO	04 PAS 10M LED 150W 52M DE KIT 2X4MM2, 186M DE CABO 4X4MM2, 46M3 DE VALA.		288,0	16,3664	122,5762
01/08/2026			PAS 10M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	4,0	15,4789	61,9156
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	52,0	0,3076	15,9952
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	186,0	0,1285	23,9010
01/08/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	46,0	0,4514	20,7644
01/08/2026	26VRR354	REPOSIÇÃO	Reposição 02 pcr 16m sup 4 pet led 240W, 34m de kit cabo 4x4mm2, remanejamento de 02 pcr 16m , substituição de 03 suportes para 4 petalas, 16 substituição de led 150W, 22m de mnd, 417m de cabo 4x10mm2, 98m3 de vala		600,0	21,6810	262,4612
01/08/2026			PCR 16M SUP 4 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
01/08/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	6,0	4,9976	29,9856
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	34,0	0,1285	4,3690
01/08/2026			REMANEJAMENTO COM POSTE	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	2,0	1,9140	3,8280
01/08/2026			NR	Não Remunerado	3,0	0,0000	0,0000
01/08/2026			LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	16,0	3,4051	54,4816
01/08/2026			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	22,0	0,8877	19,5294
01/08/2026			CABO 4X10MM2	Instalação de Cabo 4x10 mm2	417,0	0,2078	86,6526
01/08/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	98,0	0,4514	44,2372
01/08/2026	26VRR355	REPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE 01 PCR 16M E 52M DE CABO 4X10MM2 AÉREO		53,0	2,1218	12,7196
01/08/2026			REMANEJAMENTO COM POSTE	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	1,0	1,9140	1,9140
01/08/2026			CABO 4X10MM2	Instalação de Cabo 4x10 mm2	52,0	0,2078	10,8056
01/08/2026	26VRR356	REPOSIÇÃO	02 PAS 7,5M LED 150W, 22M DE KIT 2X4MM2		24,0	15,7865	37,7259
01/08/2026			PAS 7,5M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	2,0	15,4789	30,9578

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	22,0	0,3076	6,7672
01/08/2026	26VRR357	REPOSIÇÃO	03 BP LED 120W, 21 DE KIT CABO 2X4MM2, 82M DE CABO 4X16M ALU AÉREO		186,0	3,4768	40,0227
01/08/2026			BP LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	3,0	2,8647	8,5941
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	21,0	0,3076	6,4596
01/08/2026			CABO 4X16MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x16 mm ²	82,0	0,3045	24,9690
01/08/2026	26VRR358	REPOSIÇÃO	Reposição 01 pcr 16m sup 1 pet led 240W, 17m de kit cabo 4x4mm2.		18,0	9,8174	11,8734
01/08/2026			PCR 16M SUP 1 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/08/2026	26VRR359	REPOSIÇÃO	05 BP LED 120W, 02 PAS 7,5M LED 120W, 57M DE KIT CABO 2X4MM2, 49M DE MND E 52M DE CABO 4X4MM2		165,0	19,1271	111,9132
01/08/2026			BP LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	5,0	2,8647	14,3235
01/08/2026			PAS 7,5M LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V2)	2,0	14,9386	29,8772
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	57,0	0,3076	17,5332
01/08/2026			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	49,0	0,8877	43,4973
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	52,0	0,1285	6,6820
01/08/2026	26VRR360	REPOSIÇÃO	04 PAS 10M LED 150W, 52M DE KIT CABO 2X4MM2, 66M DE MND E 69M DE CABO 4X4MM2		191,0	19,8027	145,3655
01/08/2026			PAS 10M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	4,0	15,4789	61,9156
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	52,0	0,3076	15,9952
01/08/2026			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	66,0	0,8877	58,5882
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	69,0	0,1285	8,8665
01/08/2026	26VRR361	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 pcr 16m , reposição 01 BP led 150W, 7m de kit 2x4mm2.		9,0	3,7127	5,5583
01/08/2026			NR	Não Remunerado	1,0	0,0000	0,0000
01/08/2026			BP LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	1,0	3,4051	3,4051
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	7,0	0,3076	2,1532
01/08/2026	26VRR362	REPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE 05 PAS 10M , 65M DE KIT 2X4MM2		70,0	0,3076	19,9940
01/08/2026			NR	Não Remunerado	5,0	0,0000	0,0000
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	65,0	0,3076	19,9940
01/08/2026	26VRR363	REPOSIÇÃO	02 PAS 7,5M, 01 PAD 7,5M, 02 PAS 10M LED 150W, 70M KIT 2X4MM2, 134M DE CABO 4X4MM2, 33M3 DE VALA.		243,0	30,1393	104,1938
01/08/2026			PAS 7,5M LED 70W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V3)	2,0	5,8159	11,6318

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/08/2026			PAD 7,5M LED 70W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V3)	1,0	5,8159	5,8159
01/08/2026			LED 70W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V3)	1,0	2,1411	2,1411
01/08/2026			PAS 10M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	2,0	15,4789	30,9578
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	70,0	0,3076	21,5320
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	134,0	0,1285	17,2190
01/08/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	33,0	0,4514	14,8962
01/08/2026	26VRR364	REPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO 01 PCR 16M , RISCO DE QUEDA		1,0	9,6889	9,6889
01/08/2026			PCR 16M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/08/2026	26VRR365	REPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE 01 PCR 16M, 17M DE KIT 4X4MM2		18,0	9,8174	11,8734
01/08/2026			PCR 16M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/08/2026	26VRR366	REPOSIÇÃO	03 PCR 16M SUP 3 PET LED 240W, 02 PCR 16M SUP 4 PET LED 240W, 294M CABO 4X4MM2		308,0	29,5015	131,2019
01/08/2026			PCR 16M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	3,0	9,6889	29,0667
01/08/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	3,0	4,9976	14,9928
01/08/2026			PCR 16M SUP 4 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
01/08/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	6,0	4,9976	29,9856
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	294,0	0,1285	37,7790
01/08/2026	26VRR367	REPOSIÇÃO	REPOSIÇÃO 01 PAS 10M LED 150W, 13M DE KIT 2X4MM2		14,0	15,7865	19,4777
01/08/2026			PAS 10M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	13,0	0,3076	3,9988
01/08/2026	26VRR368	REPOSIÇÃO	10 PAS 10M LED 150W, 01 PAD 7,5M LED 150W, REMANEJAMENTO DE 02 PAS, REMANEJAMENTO DE 04 PCR 16M, 174M DE KIT 2X4MM2, 68M DE KIT 4X4MM2		260,0	38,6270	247,4174
01/08/2026			PAS 10M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	10,0	15,4789	154,7890
01/08/2026			PAD 7,5M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/08/2026			LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	1,0	3,4051	3,4051
01/08/2026			REMANEJAMENTO COM POSTE	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	2,0	1,9140	3,8280
01/08/2026			REMANEJAMENTO COM POSTE	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	4,0	1,9140	7,6560
01/08/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	174,0	0,3076	53,5224
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	68,0	0,1285	8,7380
01/08/2026	26VRR369	REPOSIÇÃO	18 PCR 16 M SUP 2 PET LED 240W, 306M DE KIT CABO 4X4MM2		342,0	14,8150	303,6780
01/08/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	18,0	9,6889	174,4002
01/08/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	18,0	4,9976	89,9568
01/08/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	306,0	0,1285	39,3210

Planilha de Serviços Executados com Uso do Banco de Crédito

Data Solicitação	No do Orçamento	Documento de Referência	Endereço	RA	Tipo Serviço	Descrição Serviço	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)	Custo em UC (Tab 37 Aditivo)
01/08/2026	26VRR330	1019/2026 - DIAMANTE	DF-010, próximo a Brasília Norte	SIA (RA XXIX)	REPOSIÇÃO	168m de cabo 4x4mm ² , 42m de MND e mecânica de 32m3	73,3162	R\$ 22.909,11
01/08/2026	26VRR331	1020/2026 - DIAMANTE	SQNW 105, Bloco B	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	11m de kit cabo 2x4mm ² e 42m de cabo 4x4mm ² ,	13,2946	R\$ 4.154,16
01/08/2026	26VRR332	1021/2026 - DIAMANTE	EIXO MONUMENTAL PRÓXIMO AO VIADUTO DA EPIA	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição de 02 PAS 10m LED 150W, lançamento de 26m de	38,9554	R\$ 12.172,39
01/08/2026	26VRR333	1022/2026 - DIAMANTE	Rua 8 Norte e Avenida das Araucárias	ÁGUAS CLARAS (RA XX)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 01 PAS 7,5m LED 150W , 01 PAS 10m LED	38,3402	R\$ 11.980,16
01/08/2026	26VRR334	1023/2026 - DIAMANTE	SHIGS 703 BLOCO B - ÁREA VERDE	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição 01 pas 5m led 40W, 8 m de kit cabo 2x4mm2.	8,1533	R\$ 2.547,66
01/08/2026	26VRR335	1024/2026 - DIAMANTE	DF-425, INCRA 06 - Gleba 2 Alexandre Gusmão	BRAZLÂNDIA (RA IV)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 10m LED 150W e 13m de KIT cabo	19,4777	R\$ 6.086,20
01/08/2026	26VRR336	063/2026 - DIAMANTE	Q. 101 Conjunto 5 / Estrada Parque Contorno (DF-251)	RECANTO DAS EMAS (XV)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 10m com luminária LED 150W, 13 m de	19,4777	R\$ 6.086,20
01/08/2026	26VRR337	RPA nº 051/2026 - Lote Leste (Engeluz)	DF- 450, retorno da Granja do Torto	LAGO NORTE (RA XVIII)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m sup 2 pet LED 240W, 17m de kit	16,8710	R\$ 5.271,68
01/08/2026	26VRR338	RPA nº 050/2026 - Lote Leste (Engeluz)	AR 06, Conjunto 03 - ao lado da parada de ônibus	SOBRADINHO II (RA XXVI)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 7,5m LED 120W, 11m de KIT cabo	18,3222	R\$ 5.725,14
01/08/2026	26VRR339	1027/2026 - DIAMANTE	Quadra 15, Conjunto D - área especial (área verde entre	SOBRADINHO (RA V)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAD 7,5m LED 150W ,22m de KIT cabo	25,6512	R\$ 8.015,23
01/08/2026	26VRR340	1028/2026 - DIAMANTE	BR-020, km 15 - próximo ao Córrego do Arrozal	PLANALTINA (RA VI)	REPOSIÇÃO	Reposição de 02 PCR 16m sup 2 pet LED 240W, 34m de KIT	33,7420	R\$ 10.543,36
01/08/2026	26VRR341	1029/2026 - DIAMANTE	DF-150, Balão da Fercal - próximo à Só Freios	FERCAL (RA XXXI)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m sup 1 pet LED 240W, 17m de KIT	11,8734	R\$ 3.710,08
01/08/2026	26VRR342	1030/2026 - DIAMANTE	Privê Lucena Roriz, Rua 1, Módulo 1 - Paróquia Nossa	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE 02 PCR 16M , 02 SUPORTES DE 4 PET	72,8516	R\$ 22.763,94
01/08/2026	26VRR343	1031/2026 - DIAMANTE	Balão da DF-180 com a DF-080 (entroncamento com a DF-	BRAZLÂNDIA (RA IV)	REPOSIÇÃO	Reposição de 06 PCR 16m sup 2 pet LED 240W, 102m de KIT	123,8762	R\$ 38.707,60
01/08/2026	26VRR344	1032/2026 - DIAMANTE	QNM 29, Área Especial	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m,17m de KIT 4x4mm ² ,	49,9424	R\$ 15.605,50
01/08/2026	26VRR345	1033/2026 - DIAMANTE	QNP 05, Conjunto L - Quadradão da 05 (quadra de	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, 17m de KIT cabo 4x4mm ² .	11,8734	R\$ 3.710,08
01/08/2026	26VRR346	1034/2026 - DIAMANTE	DF-290, em frente ao DVO - Vila DVO, QM 100, Conjunto S	SANTA MARIA (RA XIII)	REPOSIÇÃO	REPOSIÇÃO DE 05 PCR 16M SUP 2 PET LED 240W, 85M DE	161,9942	R\$ 50.618,33

Planilha de Serviços Executados com Uso do Banco de Crédito

Data Solicitação	No do Orçamento	Documento de Referência	Endereço	RA	Tipo Serviço	Descrição Serviço	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)	Custo em UC (Tab 37 Aditivo)
01/08/2026	26VRR347	1035/2025 - DIAMANTE	Setor Leste, Quadra 50, Conjunto L - campo	GAMA (RA II)	REPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE 04 PCR 16M, SUBSTITUIÇÃO DE 16	163,6331	R\$ 51.130,43
01/08/2026	26VRR348	1036/2026 - DIAMANTE	SHIGS 707/708 ASA SUL - PRAÇA 21 DE ABRIL	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	06 unid. >> INSTALAÇÃO - Poste de aço, curvo, simples,	1.259,2994	R\$ 393.493,28
01/08/2026	26VRR349	1037/2026 - DIAMANTE	SHCGN 716 NORTE, BLOCOS A,B,C,D,E - ASA NORTE	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	05 unid. => Instalação de braço longo 3595 x 60mm com	380,6580	R\$ 118.944,21
01/08/2026	26VRR350	1095/2026 - DIAMANTE	DF 280 - ÁGUA QUENTE	RECANTO DAS EMAS (XV)	REPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE 03 PCR 16M, RISCO DE QUEDA, 51M	35,6202	R\$ 11.130,24
01/08/2026	26VRR351	1096/2026 - DIAMANTE	AVENIDA DAS NAÇÃO L4 NORTE - NAS PROXIMIDADES	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE 04 PCR 16M COM RISCO DE QUEDA, 68M	47,4936	R\$ 14.840,33
01/08/2026	26VRR352	1097/2026 - DIAMANTE	ÁREA VERDE DO CONDOMÍNIO PORTO RICO	SANTA MARIA (RA XIII)	REPOSIÇÃO	132M DE CABO 4X16MM2 ALU AÉREO, SUBSTITUIÇÃO DE 04	60,1844	R\$ 18.805,82
01/08/2026	26VRR353	1098/2026 - DIAMANTE	SQS 207 - CAMPO DE FUTEBOL	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	04 PAS 10M LED 150W 52M DE KIT 2X4MM2, 186M DE CABO	122,5762	R\$ 38.301,39
01/08/2026	26VRR354	1099/2026 - DIAMANTE	QR 116 NA PRAÇA / QUADRA DE ESPORTE	SANTA MARIA (RA XIII)	REPOSIÇÃO	Reposição 02 pcr 16m sup 4 pet led 240W, 34m de kit cabo	262,4612	R\$ 82.011,25
01/08/2026	26VRR355	1100/2026 - DIAMANTE	QUADRA 805CONJUNTO 08 LOTE 01, EM FRENTE A ANTIGA	RECANTO DAS EMAS (XV)	REPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE 01 PCR 16M E 52M DE CABO 4X10MM2	12,7196	R\$ 3.974,49
01/08/2026	26VRR356	1102/2026 - DIAMANTE	QNM 18 18 CONJ A - NA FAIXA DE PEDESTRE	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	02 PAS 7,5M LED 150W, 22M DE KIT 2X4MM2	37,7250	R\$ 11.787,93
01/08/2026	26VRR357	1103/2026 - DIAMANTE	QNM 24 CONJ B - BECO	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	03 BP LED 120W, 21 DE KIT CABO2X4MM2, 82M DE CABO	40,0227	R\$ 12.505,89
01/08/2026	26VRR358	1136/2026 - DIAMANTE	AVENIDA DAS NAÇÕES VIA L4, PRÓXIMO A CAESB	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição 01 pcr 16m sup 1 pet led 240W, 17m de kit cabo	11,8734	R\$ 3.710,08
01/08/2026	26VRR359	1104/2026 - DIAMANTE	QUADRA 400 POR DO SOL	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	05 BP LED 120W, 02 PAS 7,5M LED 120W,57M DE KIT CABO	111,9132	R\$ 34.969,52
01/08/2026	26VRR360	1105/2026 - DIAMANTE	QUADRA COND GENESIS	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	04 PAS 10M LED 150W, 52M DE KIT CABO 2X4MM2, 66M DE	145,3655	R\$ 45.422,36
01/08/2026	26VRR361	1106/2026 - DIAMANTE	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 pcr 16m , reposição 01 BP led 150W, 7m	5,5583	R\$ 1.736,80
01/08/2026	26VRR362	1107/2026 - DIAMANTE	QI 16 BLOCO E, T H, L	GUARÁ (RA X)	REPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE 05 PAS 10M , 65M DE KIT 2X4MM2	19,9940	R\$ 6.247,53
01/08/2026	26VRR363	1108/2026 - DIAMANTE	SQS 116 PRÓXIMO DA PEC E VIA EIXINHO W	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	02 PAS 7,5M, 01 PAD 7,5M, 02 PAS 10M LED 150W, 70M KIT	104,1938	R\$ 32.557,44

Planilha de Serviços Executados com Uso do Banco de Crédito

Data Solicitação	No do Orçamento	Documento de Referência	Endereço	RA	Tipo Serviço	Descrição Serviço	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)	Custo em UC (Tab 37 Aditivo)
01/08/2026	26VRR364	1109/2026 - DIAMANTE	QI 25 BLOCO M - AVENIDA CENTRAL	GUARÁ (RA X)	REPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO 01 PCR 16M , RISCO DE QUEDA	9,6889	R\$ 3.027,49
01/08/2026	26VRR365	1110/2026 - DIAMANTE	CL 409 CAMPO SINTÉTICO	SANTA MARIA (RA XIII)	REPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE 01 PCR 16M, 17M DE KIT 4X4MM2	11,8734	R\$ 3.710,08
01/08/2026	26VRR366	1111/2026 - DIAMANTE	BR 060 NUCELO RURAL VARGEM DA BENÇÃO	RECANTO DAS EMAS (XV)	REPOSIÇÃO	03 PCR 16M SUP 3 PET LED 240W, 02 PCR 16M SUP 4 PET	131,2019	R\$ 40.996,66
01/08/2026	26VRR367	1112/2026 - DIAMANTE	EPPN EM FRENTE AO PENINSULA SHOPPING	LAGO NORTE (RA XVIII)	REPOSIÇÃO	REPOSIÇÃO 01 PAS 10M LED 150W, 13M DE KIT 2X4MM2	19,4777	R\$ 6.086,20
01/08/2026	26VRR368	1128/2026 - DIAMANTE	SQS 202 - SUL	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	10 PAS 10M LED 150W, 01 PAD 7,5M LED 150W,	247,4174	R\$ 77.310,51
01/08/2026	26VRR369	1127/2026 - DIAMANTE	BR 080 - FRENTE A ENTRADA DE BRAZLÂNDIA	BRAZLÂNDIA (RA IV)	REPOSIÇÃO	18 PCR 16 M SUP 2 PET LED 240W, 306M DE KIT CABO	303,6780	R\$ 94.890,26
