

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Brasília, 15 de junho de 2026

Índice

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	3
2.1. Manutenção.....	3
Os serviços de manutenção podem ser classificados em:.....	3
2.1.1. Preditiva	3
2.1.2. Manutenção Preventiva.....	4
2.1.3. Manutenção Corretiva.....	4
Dos serviços executados no mês de maio/26	6
a. Manutenção Emergencial	7
2.1.4. Furtos e Vandalismos	7
2.1.5. Ações de Melhorias.....	7
2.1.6. Projetos e Obras.....	8
2.4.1. Projetos de Expansão	8
2.4.2. Obras.....	9
2.1.7. Modernização.....	9
2.1.8. Resumo do Parque de Iluminação Pública por tipo e potência no mês	10
2.1.9. Receitas Acessórias	14
3. INDICADORES DE DESEMPENHO	14
3.1. Apuração dos Indicadores.....	14
3.1.1 Indicador de Pontos Acesos à Noite – IPAN	14
3.1.2 Indicador Iluminância e Uniformidade – IIL.....	15
3.1.3 Indicador de Temperatura de Cor – ITC.....	15
3.1.4 Indicador de Reprodução de Cor – IRC.....	15
3.1.5 Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização - ICL	16
3.1.6 Indicador da Conformidade da Potência Total - ICP.....	16
3.1.7 Indicador da Conformidade das Demais Informações do Cadastro - ICIC.....	16
3.1.8 Indicador de Pontos Apagados Durante o dia - IPAD.....	17
3.1.9 Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados - IDSGC	17
3.1.10 Indicador de Cumprimento do Tempo de Espera - ITM	18
3.1.11 Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão - IDST	18
3.1.12 Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão - IDFST	18
3.1.13 Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - IPOM.....	19
3.1.14 Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais – ICDM	19
3.1.15 Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços – ICRES.....	20
3.1.16 Indicador da Transparência da Concessão – ITC	21
3.1.17 Indicador de Eficientização - IE	22
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	22

1. INTRODUÇÃO

A CEB Iluminação Pública e Serviços - CEB IPES, prestadora dos serviços de iluminação pública no Distrito Federal, mediante CONTRATO DE CONCESSÃO publicado em 6 de dezembro de 2023, cuja outorga foi predeterminada pela Lei Distrital n.º 7.275, de 5 de julho de 2023, e regulamentada pelo Decreto Distrital n.º 45.033, de 4 de outubro de 2023.

O presente relatório mensal apresenta os resultados operacionais referentes à prestação dos serviços no Distrito Federal, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme solicitado no Caderno de Encargos do Contrato de Concessão.

2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com o Caderno de Encargos do Contrato de Concessão de prestação de serviço de iluminação pública do Distrito Federal, a Concessionária deve apresentar o Relatório Mensal de Prestação de Serviço. Os dados apresentados constaram as informações sobre as atividades executadas relacionadas as:

- I. Manutenção;
- II. Projetos e Obras;
- III. Modernização.

Os serviços de manutenção estão relacionados às atividades operacionais para manter a disponibilidade o parque de iluminação pública, enquanto os serviços de projetos e obras estão relacionados à expansão do parque e o item de modernização, à modernização do parque de iluminação pública.

2.1. Manutenção

Os serviços de manutenção podem ser classificados em:

- I. Manutenção Preditiva;
- II. Manutenção Preventiva;
- III. Manutenção Corretiva.

2.1.1. Preditiva

Por definição, a manutenção preditiva do sistema de iluminação pública é um conjunto de ações planejadas que utiliza tecnologias de monitoramento, análise de dados e sensores inteligentes para prever falhas, otimizar o desempenho do sistema e reduzir custos operacionais. A manutenção preditiva baseia-se no estado real dos equipamentos.

As principais atividades da Manutenção Preditiva são: inspeções remotas diárias via telegestão; Geração automática de relatórios de falhas potenciais; Medição e análise de parâmetros elétricos, buscando indícios de sobrecarga ou desgaste; Mapeamento de

pontos críticos, como áreas com maior incidência de queimas; Planejamento de intervenções baseado em risco e urgência; Atualizações de firmware de controladores e dispositivos inteligentes; Verificação da integridade de cabos, conectores e braços (em campo, conforme indicação de anomalias). Entretanto, a estrutura atual do parque de iluminação pública do Distrito Federal não permite a execução deste tipo de manutenção. Com a implantação da telegestão, esse tipo de manutenção fará parte das atividades da CEB IPES na gestão da manutenção da iluminação pública. A inserção da telegestão faz parte do plano de modernização que está em andamento na empresa.

2.1.2. Manutenção Preventiva

A **manutenção preventiva** é um conjunto de ações planejadas que busca evitar falhas antes que elas ocorram. Ela se baseia em **cronogramas regulares**, padrões de uso, recomendações do fabricante e análises históricas de desempenho dos equipamentos. A premissa fundamental é que todo ativo possui um ciclo de vida, sujeito a desgaste natural, e que intervenções periódicas reduzem a probabilidade de falhas repentinas.


No caso de sistemas de infraestrutura, como a iluminação pública, a manutenção preventiva engloba atividades como limpeza e inspeção das luminárias, substituição programada de componentes com vida útil conhecida, verificação dos níveis de isolamento, reaperto de conexões e testes de funcionamento. O objetivo é preservar o desempenho do sistema, garantir que as luminárias operem dentro dos parâmetros elétricos adequados e evitar interrupções do serviço

Manutenções preventivas podem também ter origem a partir de necessidades apontadas durante as manutenções corretivas, sendo que em alguns casos, são identificados cabos, quadros de comandos e/ou postes que necessitam reparos, gerando Relatórios de Não Conformidade (RNC). No mês de maio, foram gerados 266 RNC's que foram tratados como manutenção preventiva.

2.1.3. Manutenção Corretiva

No mês de maio, tivemos 6.237 solicitações de serviços abertas nos Canais de Atendimento ao Cliente, para reparos na iluminação pública do Distrito Federal. Estas solicitações foram abertas nos quatro canais disponíveis, conforme distribuição mostrada no gráfico 1.


Gráfico 1: Número de protocolos abertos por canal de atendimento.

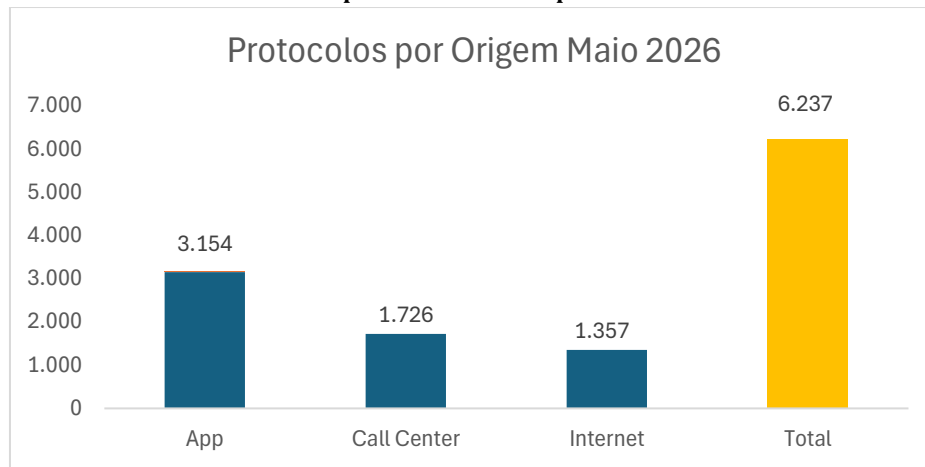

Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

Destas solicitações originaram-se ordens de serviço que, após atendimento inicial, tiveram os seguintes *status*: atendido, em atendimento ou pendente, conforme gráfico 2.

Gráfico 2: Status da Solicitação.

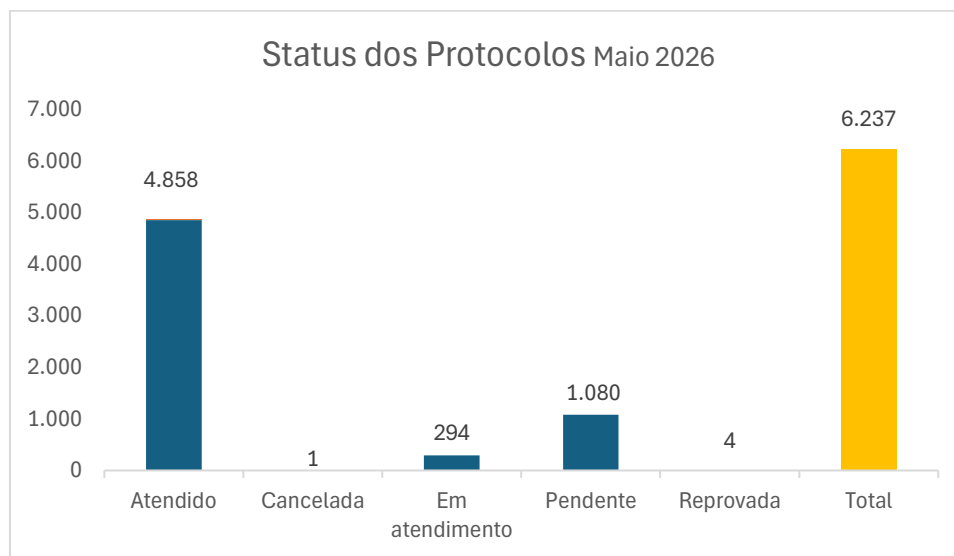


Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

A classificação "atendido" indica que houve atuação da equipe de manutenção com restabelecimento da iluminação pública. Nos casos "em atendimento", as equipes de manutenção geraram ordens de serviço, mas que ainda não foram concluídas até o período final deste relatório. Em 5 (cinco) casos, os protocolos foram cancelados ou reprovados pelo sistema devido a inconsistências, e nos casos de "pendente", até o dia 31/05/2026 as solicitações ainda não haviam sido concluídas ou não foram geradas ordens de serviços.

Dos serviços executados no mês de maio/26


Em relação à execução dos serviços no mês de maio de 2026, foram registrados 6.238 atendimentos relacionados às solicitações de clientes, distribuídos conforme gráfico 3. Não são considerados nesse gráfico, atendimentos originados por ocorrências geradas pela CEB, Empreiteira e canal ADM24hs.

Gráfico 3: Atendimentos por Origem de Solicitação – ref. Maio/26.

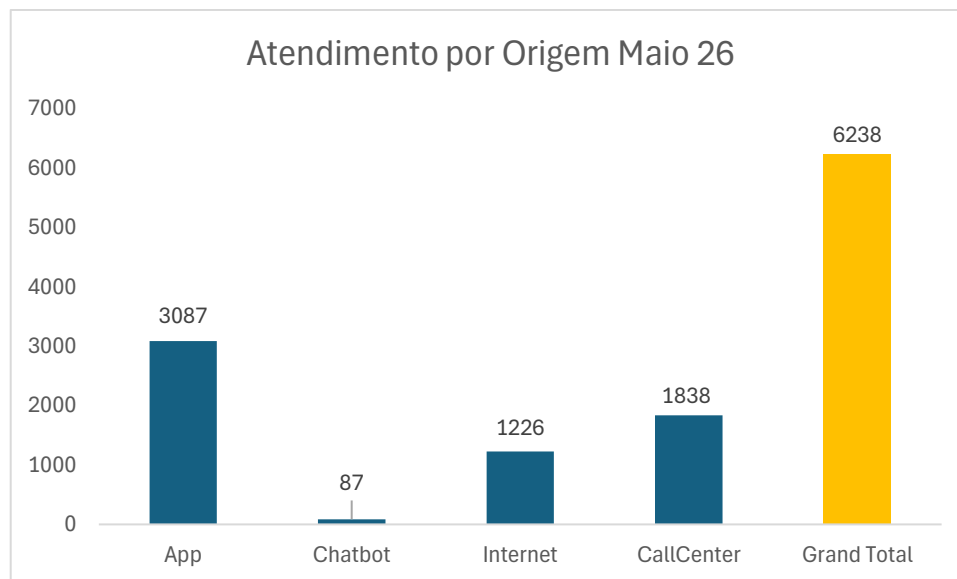

Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

Gráfico 4: Atendimentos – Acumulado 2026.

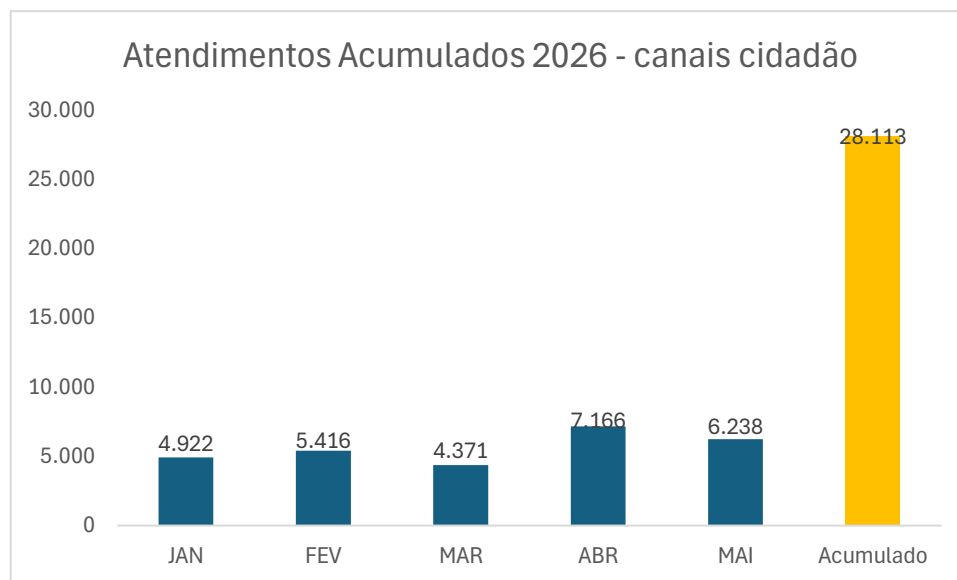


Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

a. Manutenção Emergencial

A manutenção emergencial é um tipo de manutenção corretiva, sendo que nestes casos, são reparos que exigem pronto atendimento. No mês de maio, foram registrados 166 atendimentos emergenciais, sendo 45 atendimentos a risco de choque elétrico, 19 atendimentos a fiação danificada, 43 atendimentos a fiação exposta, 19 em postes caídos e 40 em postes tortos ou danificados, conforme gráfico a seguir:

Gráfico 5: Manutenção Emergencial

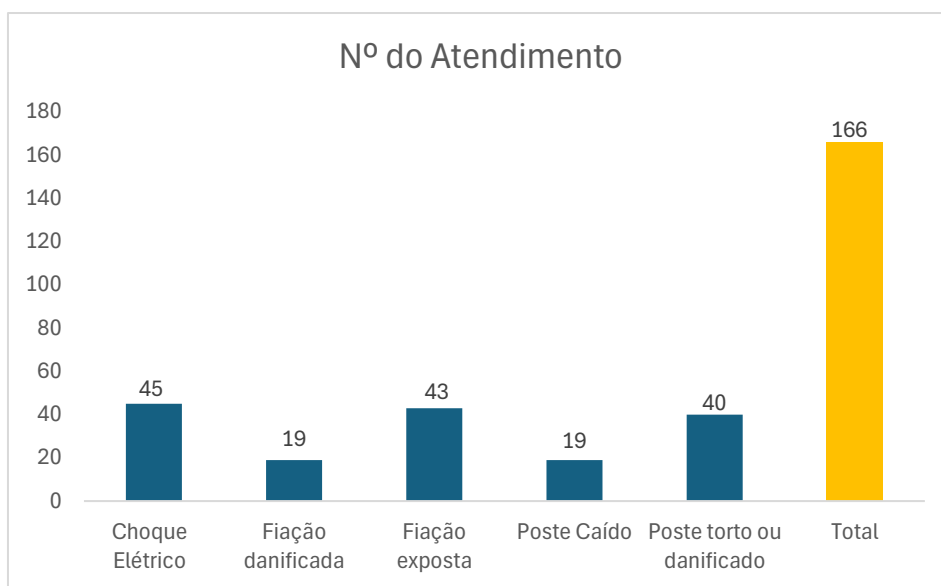

Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

2.1.4. Furtos e Vandalismos

Trata-se de crimes cometidos contra a infraestrutura do parque de iluminação pública do Distrito Federal, que além do prejuízo financeiro, prejudicam a prestação dos serviços de iluminação pública.

No mês de maio de 2026, foram furtados ou vandalizados 15.446 metros de cabo em todo o Distrito Federal. Esta ação danosa, traz prejuízo diretos e indiretos aos cofres públicos, prejudicando ainda a execução de outras demandas do sistema.

2.1.5. Ações de Melhorias

No decorrer do mês de maio de 2026, foram realizadas diversas ações de mutirão e de recuperação total ou parcial de iluminação pública em todo o Distrito Federal.

Essas ações vêm complementar as manutenções corretivas, visando a melhoria da qualidade de vida da população e maior segurança.

Tabelas dos principais pontos atendidos 05/2026		
Item	Endereço	local
1	EQS 206/207 Asa Sul	PLANO PILOTO
2	SMPW QD 14 – CT 01 – Próximo ao Balão do Aeroporto	Park Way
3	BR-020, Novo Viaduto da DF-128 – km 22,6 da BR-020 entrada com a DF-128	Planaltina
4	DF-001, km 124 – Núcleo Rural Lago Oeste	SOBRADINHO
5	QR 433 Campo de Futebol e Avenida Principal	Samambaia
6	EPNB - Próximo à Linha do Trem e Próximo ao Viaduto do Bandeirante	Núcleo Bandeirante
7	EPNB - Frente ao Posto Ipiranga, frente ao Café do Sítio e Trecho em Frente - Riacho Fundo	Riacho Fundo
8	EPNB - Frente à Placa da Mercedes, Frente à Subestação Px da UPA e Frente à UPA	Núcleo Bandeirante
9	QR 412	Samambaia
10	SHCGN 713 - Asa Norte, e Setor de Clubes	Plano Piloto
11	Ponte Alta Norte - 15°59'55.4"S 48°02'13.3"W	GAMA

Além dessas ações, foram executadas substituição de refletores de campos e quadras esportivas públicas, compondo o programa LED DÁ JOGO:

Led da Jogo

Ceilândia QNM 14, campo sintético da praça dos Eucaliptos

Ceilândia 02 quadras no Condomínio Privê

Ceilândia QNP 05, campo sintético

2.1.6. Projetos e Obras

2.4.1. Projetos de Expansão

Trata-se de projetos que possuem o objetivo de expandir o parque de iluminação pública do Distrito Federal.

Tabela 1: Quantidade de Pontos de Iluminação por Projeto no Mês.

Endereço	Região Administrativa	Qtd. De pontos por tipo de fonte de luz utilizada	Valor (Em R\$)	Valor (Em UC)
QE 50 CONJ I	GUARÁ (RA X)	28	R\$ 87.182,17	593,1179
QE 56 CONJ D	GUARÁ (RA X)	28	R\$ 84.985,04	588,9541
AV. ALAGADOS, PARQUE INFANTIL E ACADEMIA COBERTA	SANTA MARIA (RA XIII)	6	R\$ 21.568,46	160,7904
AV. ALAGADOS, PEC	SANTA MARIA (RA XIII)	5	R\$ 20.738,73	168,7825
AV. ALAGADOS, ESPAÇO PARA CAPOEIRA	SANTA MARIA (RA XIII)	7	R\$ 25.794,53	207,2186
AV. ALAGADOS, CAMPO DE AREIA E CAMPO SINTÉTICO	SANTA MARIA (RA XIII)	44	R\$ 86.837,26	496,7724
QR 314 ENTRE CONJUNTOS 3 E 4	SAMAMBAIA (RA XII)	1	R\$ 6.108,14	44,3232

QC 05 QUADRA DE TÊNIS	SAMAMBAIA (RA XII)	15	R\$ 57.031,34	313,6821
QN 15C, CONJUNTO 05 E A QN 15D, CONJUNTO 06	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	12	R\$ 39.914,05	345,7078
QE 56 CONJ D	GUARÁ (RA X)	29	R\$ 67.549,17	444,7428
CAMPO SINTÉTICO CAUB II	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	4	R\$ 19.519,68	151,7863
CAMPO SINTÉTICO QC 03, CONJUNTO 04	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	22	R\$ 85.010,24	441,5430
ÁREA VERDE DA QN 22, CONJ 4	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	6	R\$ 27.686,61	168,4616
QR/QS/QN 412 PRAÇAS DE SAMAMBAIA	SAMAMBAIA (RA XII)	19	R\$ 60.492,50	477,2400
Total		226	R\$ 690.417,91	4.603,1227

Fonte: Diretoria de Planejamento e Engenharia

No mês de maio, foram elaborados e enviados para aprovação do Poder Concedente, 14 projetos de expansão com a previsão de instalação de 226 novos pontos de iluminação.

2.4.2. Obras


No mês de maio, não houve conclusão de nenhum orçamento as built de obra.

Destaca-se que a partir do mês de abril/25 estão sendo consideradas como “Obras Concluídas”, aquelas concluídas pela área técnica e que foi realizado o orçamento as built do Banco de Crédito e enviado formalmente ao Poder Concedente.

2.1.7. Modernização

No mês de maio, foram modernizadas 50 luminárias, sendo que a quantidade de luminárias modernizadas acumulada no ano de 2026 atingiu o montante de 151.400.

Gráfico 6: Relatório Acumulado de Modernização

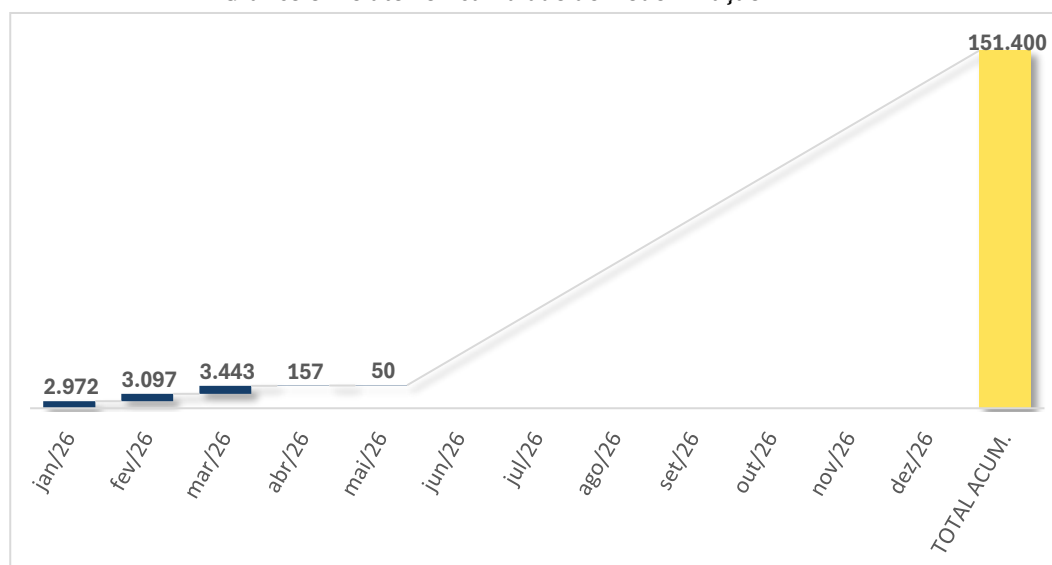

Fonte: Diretoria de Modernização e Obras

Até o mês de maio/25, a extração dos dados de modernização contidos no gráfico acima, era realizada através do “Relatório Completo de Pontos Modernizados”, conforme figura 1, aplicando os seguintes filtros: No campo, “Tipo Ponto de Serviço”, aplica-se “Ponto de IP”; e no campo, “Status”, aplica-se “Instalado”. Dessa forma, é possível gerar os dados e o relatório da modernização no período desejado. Neste caso, de janeiro/25 a maio de

2026.¹

A partir do mês de junho/25, está sendo utilizado o “Relatório de Modernização”, enviado pela Gerência de Modernização da CEB IPES, que consta no Relatório de Execução de Serviços. Compõe esse relatório as últimas modernizações realizadas pelas empreiteiras e validadas sob os aspectos técnicos e contratuais pela equipe CEB.

Figura 1: Relatório Completo de Pontos Modernizados – mai/26 (SCG/EXATI)

exali

Relatório completo de pontos modernizados

X

Relatório

Ajuda

Parque de Serviço

Brasília

Busca

Agrupamento

Por ponto de serviço

Total de pontos: 263.621

Total de pontos modernizados: 2.404

Total de pontos luminosos modernizados: 3.438

Porcentagem modernizada: 0.91%

Total de pontos luminosos pré-modernização: 3.136

Carga total anterior: 564.069

Carga total após última modernização: 541.104

Redução de carga última: 4.07%

Número de identificação	Descrição Obra	Região	Bairro	Endereço	Latitude	Longitude	Atendimento última modernização	Data última modernização	Hora última modernização	Responsável última modernização	Diferença última modernização	Quantidade anterior	Tipo de lâmpada anterior	Poste da lâmpada anterior
009930		TAGUATINGA	Taguatinga	Sector C Sul Qsc 16, Casa 18, Taguatinga	-15.8411854444	-48.0571202222	902972	26/05/2026	07:56:35	Leste- Equipe Extra Leve 16	1	1	Sódio	150
*309385		GAMA	Gama	Avenida Buriti Setor De Chacarais, Chacara 12 B, Lote 14, Ponte Alta Norte	-15.9806890833	-48.0509156667	893969	04/05/2026	08:56:13	Sul- Equipe Pesada 3	1	1	LED	120
172066		GAMA	Gama	Sle Eq 18 21 Praca 2, Lote Aroaespecial, Gama	-16.0181504722	-48.0564397222	893397	02/05/2026	08:27:14	Sul- Equipe Pesada 3	2	2	Sódio, Sódio	400; 400
*310216		LAGO SUL	Lago Sul	Sh Dom Bosco Quadra 5 Cond Villages Alvorada	-15.8037305833	-47.8074653056	898319	13/05/2026	16:49:43	Leste- Equipe Leve 6	0	1	LED	150
*310468		SAMAMBAIA	Samambaia	Quadra 301 Conjunto 5, Samambaia Sul	-15.8802771667	-48.0905426111	899453	16/05/2026	10:32:23	Sul- Equipe Pesada 3	0	2	LED, LED	240; 240
*310475		SAMAMBAIA	Samambaia	Quadra 301 Conjunto 5, Samambaia Sul	-15.8798160556	-48.0903490000	899467	16/05/2026	11:04:09	Sul- Equipe Pesada 3	0	2	LED, LED	240; 240

(Extraído do Exati em 15/06/2026)

Destacamos que a diferença entre o quantitativo apresentado no Gráfico 6 e na Figura 1, refere-se a ações das equipes de manutenção, devendo ser considerado na apuração dos pontos modernizados, os quantitativos constantes no Gráfico 6, os quais estão sendo apresentados formalmente para apuração do Fator de Modernização e Eficientização (FME).

2.1.8. Resumo do Parque de Iluminação Pública por tipo e potência no mês

Segue, abaixo, o resumo do parque de IP por tipo e potência no mês, cadastrado no SCG, em 05/05/2026, data-base do faturamento do consumo de energia elétrica do Parque de Iluminação Pública:

¹ Para extração do Relatório de Modernização no EXATI, é preciso expurgar as luminárias não LEDs (Sódio e Vapor Metálico) e os campos vazios, na coluna “Tipo de lâmpada última modernização”. Verificou-se que, a área técnica de manutenção estava atualizando o cadastro como modernização (Código, MOD), alguns serviços de manutenção. A área já foi orientada para ajustar o procedimento.

Tabela 3: Resumo do parque de IP por tipo e potência no mês

Tipo Lâmpada	POT. UNIT. (W)	PERDA REATOR (W)	POT. UNIT. TOTAL (W)	Quant. Final	POT. TOTAL (W)
VS 70	70	14	84	5	420
VS 600	600	54	654	0	0
VS 400	400	38	438	91	39.858
VS 250	250	30	280	60	16.800
VS 200	200	29	229	0	0
VS 150	150	22	172	97	16.684
VS 100	100	17	117	18	2.106
VM 400	400	40	440	0	0
VM 250	250	28	278	0	0
VM 150	150	18	168	0	0
VM 125	125	15	140	0	0
MVM 70	70	14	84	0	0
MVM 400	400	29	429	39	16.731
MVM 250	250	23	273	37	10.101
MVM 2000	2.000	100	2.100	52	109.200
MVM 150	150	22	172	400	68.800
MVM 1000	1.000	50	1.050	17	17.850
LED 80	80	-	80	2.443	195.440
LED 76	76	-	76	68	5.168
LED 72	72	-	72	11.948	860.256
LED 70	70	-	70	68.044	4.763.080

LED 68	68	-	68	1.223	83.164
LED 600	600	-	600	833	499.800
LED 60	60	-	60	293	17.580
LED 55	55	-	55	404	22.220
LED 54	54	-	54	1.396	75.384
LED 52	52	-	52	1	52
LED 50	50	-	50	84	4.200
LED 480	480	-	480	29	13.920
LED 45	45	-	45	528	23.760
LED 400	400	-	400	79	31.600
LED 40	40	-	40	19.597	783.880
LED 36	36	-	36	257	9.252
LED 314	314	-	314	1.068	335.352
LED 305	305	-	305	564	172.020
LED 304	304	-	304	1	304
LED 303	303	-	303	17	5.151
LED 302	302	-	302	0	0
LED 280	280	-	280	88	24.640
LED 271	271	-	271	2	542
LED 267	267	-	267	226	60.342
LED 254	254	-	254	3	762
LED 250	250	-	250	4	1.000
LED 248	248	-	248	16	3.968
LED 245	245	-	245	11.480	2.812.600
LED 244	244	-	244	6.515	1.589.660

LED 241	241	-	241	9.245	2.228.045
LED 240	240	-	240	42.522	10.205.280
LED 220	220	-	220	58	12.760
LED 215	215	-	215	21.993	4.728.495
LED 214	214	-	214	2	428
LED 205	205	-	205	20	4.100
LED 202	202	-	202	64	12.928
LED 201	201	-	201	148	29.748
LED 200	200	-	200	188	37.600
LED 180	180	-	180	130	23.400
LED 18	18	-	18	656	11.808
LED 163	163	-	163	8	1.304
LED 161	161	-	161	4	644
LED 160	160	-	160	1.927	308.320
LED 153	153	-	153	1	153
LED 150	150	-	150	31.398	4.709.700
LED 120	120	-	120	74.761	8.971.320
LED 115	115	-	115	285	32.775
LED 111	111	-	111	41	4.551
LED 110	110	-	110	13.668	1.503.480
LED 100	100	-	100	2.131	213.100
TOTAL				327.277	45.733.586

2.1.9. Receitas Acessórias

São receitas obtidas por meio de atividades relacionadas ao objeto do Contrato de Concessão.

No mês de Maio/26 houve a celebração de 1 (um) Contrato de Receita Acessória com o Condomínio do Centro Clínico Sul no valor de R\$ 2.405,76.

3. INDICADORES DE DESEMPENHO

O Contrato de Concessão pressupõe a prestação de serviço adequado aos usuários, sendo considerado serviço adequado aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade da contraprestação.

Diante disso, o Contrato de Concessão possui como Anexo IV – Indicadores de Desempenho, um documento que tem por objetivo estabelecer os parâmetros de qualidade e desempenho dos serviços a serem atendidos pela CEB IPES.

Esses parâmetros de qualidade e desempenho serão aferidos através da avaliação de um conjunto de “Indicadores de Desempenho”, que compõem o “Sistema de Mensuração de Desempenho – SMD”.

A avaliação será realizada por meio do cálculo do Índice de Desempenho Geral – IDG, composto por 05 (cinco) critérios de desempenho específicos, sendo:

- Critério de Disponibilidade (CD) – avalia a disponibilidade da iluminação pública;
- Critério de Qualidade (CQ) – avalia a qualidade dos serviços prestados e os níveis de iluminação;
- Critério de Operação (CO) – avalia a disponibilidade da infraestrutura e a prestação dos serviços, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos para a sua execução;
- Critério de Conformidade (CC) – avalia o atendimento aos prazos e requisitos exigidos para a apresentação de certificados e relatórios; e,
- Critério de Eficientização (CE) – avalia os níveis de eficiência energética atingidos pela CEB IPES.

3.1. Apuração dos Indicadores

3.1.1 Indicador de Pontos Aceso à Noite – IPAN

Compõe o Critério de Disponibilidade (CD), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade de Luz (IDL)”.

Visa apurar se os pontos de iluminação pública estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente acesos durante a noite.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal.

3.1.2 Indicador Iluminância e Uniformidade – IIL

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)”.

Visa apurar se um ponto de iluminação pública modernizado verificado atende ao nível de Iluminância e Uniformidade para as classes de iluminação das vias de veículos e pedestres.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal.

3.1.3 Indicador de Temperatura de Cor – ITC

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)”.

Visa apurar se um ponto de iluminação pública modernizado verificado atende ao nível de Temperatura de Cor.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal.

3.1.4 Indicador de Reprodução de Cor – IRC

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)”.

Visa apurar se um ponto de iluminação pública modernizado verificado atende ao nível de índice de Reprodução de Cor.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal.

3.1.5 Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização - ICL

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Qualidade de Dados (IQD)”.

Visa apurar a conformidade da caracterização da localização (logradouro, bairro, número do ponto de iluminação pública e posição georreferenciada), através do comparativo entre os dados do cadastro da rede distrital de iluminação pública e a informação verificada *in loco*.

Mensuração:

Não há mensuração no período de execução.

Comentário da CEB IPES:

Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliado somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.6 Indicador da Conformidade da Potência Total - ICP

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Qualidade de Dados (IQD)”.

Visa apurar a conformidade da potência total do ponto de iluminação pública, através do comparativo entre os dados do cadastro da rede distrital de iluminação pública e a informação verificada *in loco*.

Mensuração:

Não há mensuração no período de execução.

Comentário da CEB IPES:

Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliado somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.7 Indicador da Conformidade das Demais Informações do Cadastro - ICIC

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Qualidade de Dados (IQD)”.

Visa apurar a conformidade de algumas informações (caracterização, modelo da luminária, tecnologia da lâmpada, tipo de poste, altura de instalação da luminária, tipo de braço, quantidade de pontos, tipo de rede) do cadastro dos pontos de iluminação pública, através do comparativo entre os dados do cadastro da rede distrital de iluminação pública e a informação verificada *in loco*.

Mensuração:

Não há mensuração no período de execução.

Comentário da CEB IPES:

Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliado somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.8 Indicador de Pontos Apagados Durante o dia - IPAD

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Acendimento Diurno (IAD)”.

Visa apurar se o ponto de iluminação pública está efetivamente apagado durante o dia, conforme verificação *in loco* ou pela telegestão.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo impetração da obrigatoriedade da aferição mensal

3.1.9 Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados - IDSGC

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC)”.

Visa apurar se a central de atendimento operada pela CEB IPES está disponível de forma ininterrupta para o recebimento de chamados.

Mensuração:

O indicador de disponibilidade do sistema de gestão de chamados (call center) Emitido no sistema EXATI foi de 100%.

Figura 1: IDSGC – Sistema Exati



Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados (IDSGC)		
Nome	Valor	Tempo em minutos
Tempo total previsto para o período	744.00 h	44640 min
Tempo total de disponibilidade do sistema	743.43 h	44606 min
Tempo total de indisponibilidade do sistema	0.57 h	34 min
IDSGC calculado = (Tempo total de disponibilidade do sistema / Tempo total previsto para o período)	100.00%	
IDSGC	1.00	

Filtrar resultados

15 Linhas por página 1 de 5

3.1.10 Indicador de Cumprimento do Tempo de Espera - ITM

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC)”.

Visa apurar o tempo de espera das chamadas a partir da entrada da chamada até a transferência para o atendente, tendo o prazo máximo como 60 segundos.

Mensuração:

O indicador de cumprimento do tempo de espera (call center) calculado em função dos dados do sistema EXATI foi de 99%, sendo que das 2.704 chamadas registradas no citado sistema, 2.666 foram atendidas antes de 60 segundos.

Figura 2 - ITM – Sistema Exati



Indicador de Cumprimento do Tempo de Espera (ITM)	
Período Inicial	01/05/2026
Período Final	31/05/2026
Resumo	
Total de chamadas atendidas dentro do tempo de espera (Ata 60s)	2666
Total de chamadas atendidas via call center	2704
ITM calculado = (Total de chamadas atendidas dentro do tempo de espera (Ata 60s) / Total de chamadas atendidas via call center)	99.00%
ITM	1.00

3.1.11 Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão - IDST

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT)”.

Visa apurar se o sistema de telegestão (número de pontos de iluminação telegerencíveis) implantado pela CEB IPES, bem como suas funcionalidades básicas estão disponíveis de forma ininterrupta.

Mensuração:

Não há mensuração no período de execução.

Comentário da CEB IPES:

Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliados somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.12 Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão - IDFST

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT)”.

Visa apurar se o sistema de telegestão (número de pontos de iluminação telegerencíveis) implantado pela CEB IPES, bem como suas funcionalidades básicas estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento. Devem ser

observadas, minimamente, as seguintes funcionalidades: conformidade entre a localização geográfica e a verificada *in loco*, conformidade entre o *status* dos dispositivos, registro atualizado do consumo de energia e operação remota via sistema de telegestão.

Mensuração:

Não há mensuração no período de execução.

Comentário da CEB IPES:

Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliados somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.


3.1.13 Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - IPOM

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Cumprimento dos Prazos (ICP)”.

Visa apurar se os prazos para solução dos chamados de manutenção corretiva estão sendo cumpridos pela CEB IPES.

Mensuração:

Figura 3 - IPOM – Sistema Exati

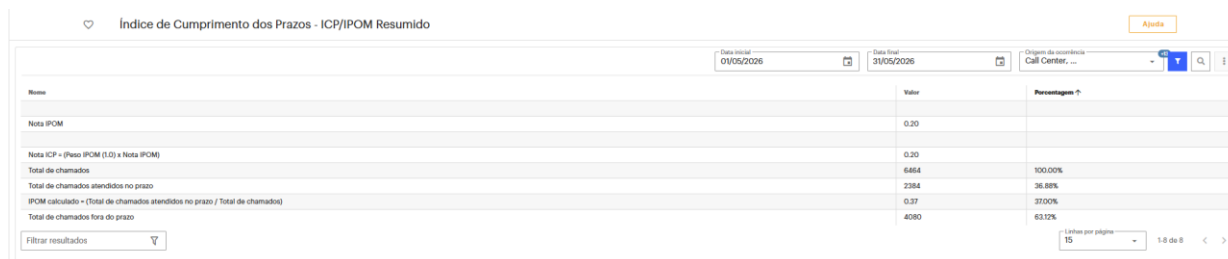

Índice de Cumprimento dos Prazos - ICP/IPOM Resumido		
Item	Valor	Porcentagem
Nota IPOM	0,20	
Nota ICP = (Peso IPOM (1,0) x Nota IPOM)	0,20	
Total de chamados	6464	100,00%
Total de chamados atendidos no prazo	2384	36,88%
IPOM calculado = (Total de chamados atendidos no prazo / Total de chamados)	0,37	37,00%
Total de chamados fora do prazo	4080	63,12%

Comentário da CEB IPES:

Este indicador está sendo objeto de ajustes junto ao Exati, tendo em vista que abrange o total de protocolos gerados. A parametrização ideal deveria ser feita de modo a expurgar solicitações que não se referem às falhas originárias do sistema de iluminação pública.

Na emissão do indicador deste mês, foi efetuada adequação ao texto do contrato de concessão, sendo desconsiderados protocolos originados de inspeções de controle interno da CEB IPES.

3.1.14 Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais - ICDM

Compõe o Critério de Conformidade (CC), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Conformidade dos Certificados (ICC)”.

Visa apurar a conformidade do tratamento e descarte dos materiais, sendo avaliado

através da apresentação de certificado válido e expedido por empresa credenciada e autorizada, de descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes retirados da rede de iluminação pública.

Mensuração:

Figura 12 - ICDM e ICC – Sistema Exati



The screenshot shows the 'exati' system interface for the 'Indicador ICDM e ICC'. It displays a table of certificates under the heading 'Certificados'. The table has columns for 'Descrição', 'Data entrega', 'Em conformidade', and 'Tem anexo'. Two certificates are listed, both dated 01/05/2026 and marked as 'Sim' for conformity. A note at the bottom indicates the data was extracted on 15/06/2026.

Descrição	Data entrega	Em conformidade	Tem anexo
Certificado de Descarte de Material - DMT 05/2026	01/05/2026	Sim	Sim
Certificado de Descarte de Material - ENG 05/2026	01/05/2026	Sim	Sim

(Extraído do Exati em 15/06/2026)

Comentário da CEB IPES:

Os atuais contratos estabelecem que a gestão e o descarte dos materiais poluentes são de responsabilidade das Contratadas, conforme abaixo:

- Contrato de Obras: Engeluz Iluminação e Eletricidade;
- Contratos de Manutenção: Engeluz Iluminação e Eletricidade, Diamante Engenharia, RH Engenharia e Real Energy.
- Contrato de Reposição: Diamante Engenharia;
- Contratos de Modernização: Dan Engenharia e RH Engenharia.

A CEB IPES faz o acompanhamento dos quantitativos retirados do parque de iluminação pública, a fiscalização do acondicionamento nas instalações das Contratadas e a certificação do correto descarte. As Contratadas acondicionam os materiais poluentes em caixas apropriadas, conforme o estado de conservação do resíduo, até serem entregues à empresa credenciada.

3.1.15 Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços – ICRES

Compõe o Critério de Conformidade (CC), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Conformidade das Informações (ICI)”.

Visa apurar se o Relatório de Execução dos Serviços está sendo entregue dentro do prazo e seguindo as exigências do Anexo I – Caderno de Encargos.

Mensuração:

Figura 13 - ICRES – Sistema Exati

exati

Indicador da Conformidade dos Relatóri...

Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços (ICRES)

Ajuda

ICRES

Data inicial
01/05/2026

Data final
01/05/2026

▼

Nome	Valor
Certificados conformes	1
Certificados não conformes	0
Certificados esperados no período	1
ICRES = (Certificados conforme / Certificados esperados no período)	1.00

Filtrar resultados

Linhas por página
15

1-5 de 5

Certificados

Data inicial
01/05/2026

Data final
31/05/2026

Novo certificado

Descrição	Data entrega	Em conformidade	Tem anexo
ICRES Q2 - Maio 2026	01/05/2026	Sim	Sim

(Extraído do Exati em 15/06/2026)

Comentário da CEB IPES:

Conforme demonstrado na “Figura 13 – ICRES – Sistema Exati”, do total de relatórios entregues no período, 100% foi considerado como “conforme”, resultando assim em uma “Nota ICRES” igual a “1”, de acordo com os critérios definidos no item 6.3.1 do Anexo IV – Indicadores de Desempenho.

3.1.16 Indicador da Transparência da Concessão – ITC

Compõe o Critério de Conformidade (CC), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Conformidade das Informações (ICI)”.

Visa apurar se o processo de transparência da Concessão foi realizado conforme detalhamento previsto no item 3.21 do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, o qual prevê que, a CEB IPES deve divulgar, minimamente, os seguintes documentos: relatório trimestral de desempenho, ofícios de aprovação emitidos pelo Poder Concedente, Contrato de Concessão e Termos Aditivos, Contratos de atividades relacionadas e demonstrações financeiras.

Mensuração:

Figura 14 – ITC – Sistema Exati

exati

Indicador da Transparência da CONCES...

Indicador da Transparência da CONCESSÃO (ITC)

Ajuda

Certificados

Data inicial
01/05/2026

Data final
31/05/2026

Novo certificado

Nome: ITC

Valor: 1.00

Descrição	Data entrega	Em conformidade	Tem anexo
Índice de Transparência da Concessão - ref. MAI_26	01/05/2026	Sim	Sim

(Extraído do Exati em 15/06/2026)

Comentário da CEB IPES:

Conforme demonstrado na “Figura 14 – ITC – Sistema Exati”, o processo de transparência da Concessão foi devidamente cumprido, resultando assim em uma “Nota ITC” igual a “1”, de acordo com os critérios definidos no item 6.3.2 do Anexo IV – Indicadores de Desempenho.

3.1.17 Indicador de Eficientização - IE

Compõe o Critério de Eficientização (CE), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Eficientização (IE)”.

Visa apurar o cumprimento dos níveis mínimos de eficientização, conforme os Marcos da Concessão definidos no Anexo I – Caderno de Encargos.

Mensuração:

Não há mensuração no período de execução.

Comentário da CEB IPES:

Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliados somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório Mensal de Serviços é uma obrigação do Contrato de Concessão. Este documento refere-se ao mês de Maio de 2026, mas possuindo alguns dados de meses anteriores.

Cumprе salientar que as luminárias de LED para manutenção e eficientização estão sendo entregues por lote, passando por ensaios de recebimento junto a laboratório credenciado antes da aplicação no parque de iluminação pública.

Por fim, junto a este Relatório, enviamos uma planilha em Excel com os dados completos dos protocolos abertos durante o mês, em atendimento ao item 4.1.5 do Caderno de Encargos da Concessionária, bem como o Relatório de Banco de Créditos.

Relatório Mensal de Execução de Serviços de Iluminação Pública

Tabela 8: Quantidade Diária dos Protocolos por Reclamação (item 7.4.9 – b) no Mês de Maio de 2026, canais utilizados pelo cidadão.

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Mês de Referência: **maio/2026**

Dia	05 ou mais pontos acesos de dia em sequência	05 ou mais pontos apagados de noite em sequência	Choque Elétrico	Fiação danificada	Fiação exposta	Luminária Acesa Durante o Dia	Luminária Apagada Durante a Noite	Luminária com baixa intensidade	Luminária Furtada/Vandalizada	Luminária Oscilando	Poste Caído	Poste torto ou danificado	Remoção de poste de iluminação pública	Reposição Cabo Preventivo	Totais
1	3	65	3		1	6	102	4	1	6	2				193
2		46	2				63	1	2	1	1	1			117
3		31	2	1	2	4	92		1	3		1			137
4	3	92	3			1	224	8	7	28		3			369
5		81	1		3	7	230	1	1	11		2	1	2	340
6	1	80	1		1	3	151	1	3	11		1			253
7	2	90	2		5	2	114	4	2	9					230
8	1	75	5		2	3	143		1	38		2		2	272
9	1	66	4			1	116		2	6	1				197
10		37				1	103	1	4	2					148
11		88	4		1	1	136	2	4	8	1	1			246
12	4	88	2	1	1	1	159	8	4	5	2	2			277
13		90				6	177	3	1	5		4			286
14	1	56		1	1	3	109	3		6	2		2		184
15		55	3	1	1	1	110			3		1	1	1	177
16		34	1	1	3	1	54	2		4			1		103
17	3	37	2	1	1	13	134		1	3		1			196
18	1	47		1	1	2	113	4	3	8		3	1		184
19	1	64		3			202	3	2	8		2	1		286
20	1	73		2	1	2	98	3	3	7			2		192
21	2	61	1	1	1	3	149	2	1	10	2	4		1	238
22	1	33	2		1		95			4		4			140
23		55	1		1		65			4					126
24	2	35	2			2	60	1	1	9					112
25	1	82	1			5	123	1	3	6	1	4			227
26	1	73	1	1	4	2	152	3	1	8	1				247
27	4	55	1		1	1	154	3	4	2		4	2		231
28	1	37	1	2	3	1	104	5	2	5		1	1		163
29	1	49	1			1	118	2	3	2	1	1	1	1	181
30		33			1	1	41		1	4		1			82
31	1	28				1	63		2	5		1			103
Total	36	1.836	46	16	38	75	3.754	65	62	231	14	44	13	7	6.237

Tabela 9: Material Utilizado (item 7.4.9 – g) no Mês de Maio de 2026

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL RELATÓRIO DE ATIVIDADES Materiais Utilizados Mês de Referência: maio/2026			
#	Descrição sucinta	Quantidade	Unidade
1	Cabo de cobre isolado 2x4 mm ²	5.035	metro
2	Cabo de cobre isolado 10mm ²	3.407	metro
3	Luminária LED	2.714	Unidade
4	Cabo de cobre isolado 4x10 mm ²	2.533	metro
5	Cabo multiplexado de alumínio trifásico e neutro 16mm ²	2.034	metro
6	Eletroduto corrugado DN 63	1.782	metro
7	Cabo de cobre isolado 4x4 mm ²	1.736	metro
8	Luminária LED e relé fotocontrolador	1.573	Unidade
9	Conector de Derivação Perfurante	1.520	Unidade
10	Cabo de cobre isolado 16mm ²	1.415	metro
11	Relé fotocontrolador	1.188	Unidade
12	Conector Perfurante- Subterrâneo Cdp 150-35	1.000	Unidade
13	Cabo de cobre isolado 4x16 mm ²	940	metro
14	Cabo multiplexado de alumínio trifásico e neutro 10mm ²	915	metro
15	Cabo de cobre isolado 25mm ²	807	metro
16	Cordoalha de aço 5,10mm	564	Unidade
17	Eletroduto Rígido DN 25	444	metro
18	Cabo de cobre isolado 4x25 mm ²	254	metro
19	Conector grampo metálico - 3/4 - 50mm ²	122	Unidade
20	Quadro de comando QIOT ou QIPA	118	Unidade
21	Haste de aterramento em aço 3m	88	Unidade
22	Braço longo para Luminaria 3,595m	73	Unidade
23	Cabo de cobre isolado 35 mm ²	30	metro
24	Braço médio para Luminaria 2,411m	6	Unidade

1. Introdução

Trata-se de relatório do BANCO DE CRÉDITO do mês acima referenciado.

Conforme o que determina o CONTRATO DE CONCESSÃO de Iluminação Pública do Distrito Federal, no seu Anexo I - Caderno de Encargos, o BANCO DE CRÉDITO é o saldo de créditos disponível para serem utilizados nas seguintes atividades: *"novos pontos luminosos em decorrência do crescimento vegetativo, remanejamento de pontos de iluminação, com ou sem reaproveitamentos de postes, trocas e manutenção dos pontos luminosos em decorrência do crescimento vegetativo e trocas e manutenção devido a vandalismo"*.

Na DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO, em 25/03/2024, foram adicionados ao BANCO DE CRÉDITO o montante de **26.272 UNIDADES DE CRÉDITO (UC)**, sendo 16.871 UC para uso em projetos de expansão e 9.402 UC para uso em correção de vandalis, remanejamento de rede de IP e reposição de ativo. A cada data de aniversário do CONTRATO, serão adicionados um determinado número de unidades de créditos ao BANCO DE CRÉDITO, determinado no Contrato de Concessão e calculados a partir das estimativas de crescimento vegetativo e vandalismo no Parque de IP do DF.

O item 11.1.3 do Caderno de Encargos, Anexo I do Contrato de Concessão, determina que *"os serviços de expansão e remanejamento do parque de iluminação pública, bem como das correções dos danos provocados por vandalismo, serão medidos para uso do saldo do BANCO DE CRÉDITOS. As medições serão realizadas utilizando-se da Planilha de Preços Unitários da Tabela 37. Os preços unitários da planilha são determinados em UNIDADE DE CRÉDITO"*.

Em 31/07/2024, os técnicos da CEB IPES e da SODF emitiram uma Nota Técnica Conjunta (SEI/GDF 147367449) intitulada *"Procedimento de Uso do Banco de Crédito - Contingenciamento de serviços e materiais faltantes"* onde recomendam a *"manutenção da execução dos serviços cobertos pelo BANCO DE CRÉDITO com realização de contingenciamento dos custos dos serviços e materiais faltantes da Tabela 37, bem como dos serviços com distorção considerável de valor, para fins de futuro ressarcimento"*.

Em 29/05/2025 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão (ID SEI 172102180) alterando a Tabela 37 do Caderno de Encargos, com inclusão de novos serviços e materiais no Banco de Créditos, conforme ANEXO D do referido Aditivo. Em 14/11/2025, foi assinado o Termo de Reratificação do Primeiro Aditivo (ID SEI 184008639) com os valores corrigidos das unidades de crédito dos serviços constantes da Tabela 37.

Assim, o presente relatório apresenta a Memória de Cálculo do saldo do BANCO DE CRÉDITO no mês de referência, **considerando a Tabela 37 atualizada** conforme parágrafo acima, as listas de eventos de uso dos créditos.

2. Uso no mês de mai/2026

As Unidades de Créditos são utilizadas no mês para 4 tipos de eventos, conforme determina o contrato: (i) execução de projetos de expansão; (ii) correção de danos no sistema de iluminação pública provocado por vandalismo; (iii) remanejamento de sistemas de iluminação pública solicitados; e (iv) reposição de sistemas de iluminação pública solicitados.

Nos subitens abaixo, apresentamos os valores dos usos dos créditos ordinários, calculados a partir dos itens da Tabela 37 do Caderno de Encargos, Anexo I do Contrato de Concessão, atualizada pelo aditivo, dos eventos que ocorreram no mês de referência e acumulados desde a data de eficácia.

2.1. Créditos Ordinários Realizado

Na tabela abaixo podem ser observados os valores dos usos dos créditos ordinários, calculados a partir dos itens da Tabela 37 do Caderno de Encargos, Anexo I do Contrato de Concessão, bem como os saldos inicial e final do Banco de Crédito no mês de referência.

REALIZADO	Saldo Inicial no Mês	Executado no Mês	Saldo Acumulado Mês
Projetos de Expansão Executado	8.948,5111 UC	0,0000 UC	8.948,5111 UC
Van/Rem/Rep Atestado pelo PC	2.950,4105 UC	(5.219,6923 UC)	(2.269,2818 UC)
Totais	11.898,9216 UC	(5.219,6923 UC)	6.679,2293 UC

Os usos dos **créditos ordinários acumulados** desde a data de eficácia do Contrato de Concessão são:

ACUMULADO	Saldo Início Período	Usos Acumulado até Mês	Saldo Final
Projetos de Expansão Executado	17.285,9452 UC	(8.337,4341 UC)	8.948,5111 UC
Van/Rem/Rep Atestado pelo PC	9.401,8466 UC	(11.671,1284 UC)	(2.269,2818 UC)
Totais	26.687,7918 UC	(20.008,5625 UC)	6.679,2293 UC

2.2 Créditos Negativos com Necessidade de Recomposição Financeira

Conforme previsto no Contrato de Concessão e no Caderno de Encargos (Anexo I – Tabela 37), cada Unidade de Crédito – UC possui um valor unitário monetário, atualizado periodicamente. Quando o saldo de créditos ordinários resulta negativo, identifica-se que o consumo das UC superou o limite disponível no período, caracterizando a necessidade de recomposição financeira pelo Poder Concedente, de forma a restabelecer o equilíbrio do Banco de Créditos da Concessão.

Valor unitário da Unidade de Crédito em mai/2026 é de: **R\$ 337,84/UC**

	Excedente no Mês (R\$)	Acumulado até o Mês (R\$)
Expansões, Vandalismos, Reposições e Remanejamentos	0,00	0,00
Totais	0,00	0,00

3. Quadro de Serviços com Uso do Banco de Crédito em mai/2026


Os serviços realizados durante o mês de referência estão sintetizados nos dados abaixo e podem ser encontrados em listas detalhadas nos Anexos II a III.

Anexo	Evento	Qt Serviços	Qt Luminárias	UC Ordinárias
Anexo II - EXPANSÃO - Lista de Obras Concluídas no Mês		0 Projetos	0 Lumin	0,0000 UC
Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês		46 Serviços	N/A	5.219,6923 UC

4. Fluxo de Processos

Abaixo está representado o fluxo de atividades para execução dos Projetos de Expansão desde o recebimento da solicitação até a conclusão da obra e elaboração do "as built" e emissão do orçamento definitivo. Vale ressaltar que as unidades de crédito que cobrem os custos de investimentos da obra são contabilizados no Banco de Crédito após a aprovação do projeto e orçamento de referência pelo Poder Concedente.

Após a emissão do orçamento definitivo, após a conclusão da obra, a diferença para o orçamento prévio (a maior ou menor) é contabilizada no Banco de Crédito, finalizando a contabilização do projeto.

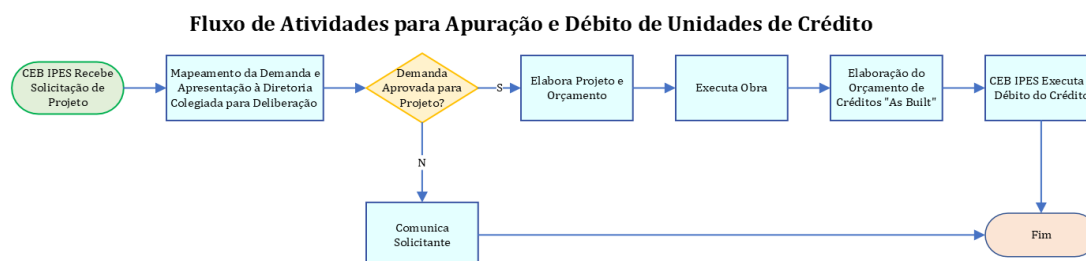

5. Lista de Anexos

Anexo I - Evolução do Banco de Crédito

Anexo II - EXPANSÃO - Lista de Obras Concluídas no Mês

Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês

Emissão:
Wires Santos Amorim
Gerente de Planejamento e Orçamento de Engenharia
CEB IPES

Aprovação:
Mauro Landim
Diretor de Planejamento e Engenharia
CEB IPES

Anexo I - Evolução do Banco de Crédito

A. CREDITOS ORDINÁRIOS ACUMULADOS

	Projetos Expansão	Van/Rem/Rep	Consolidado Geral
Saldo Inicial	17.285,9452 UC	9.401,8466 UC	26.687,7918 UC
Realizado	8.337,4341 UC	11.671,1284 UC	20.008,5625 UC
Saldo Final	8.948,5111 UC	(2.269,2818 UC)	6.679,2293 UC

B. CREDITOS ORDINÁRIOS REALIZADOS

BANCO DE CRÉDITO ORDINÁRIO REALIZADO						
BC >>	PROJETOS DE EXPANSÃO		VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO		CONSOLIDADO	
Novos Créditos >>	Novo Crédito	Saldo Anterior	Novo Crédito	Saldo Anterior	Novo Crédito	Saldo Anterior
	17.286 UC	0,0000 UC	9.402 UC	0,0000 UC	26.688 UC	0,0000 UC
Mês	Executado	Saldo	Executado	Saldo	Realizado	Saldo
Total >>	8.337,4341 UC	17.285,9452 UC	11.671,1284 UC	9.401,8466 UC	20.008,5625 UC	26.687,7918 UC
abr/2026	8.337,4341 UC	8.948,5111 UC	6.451,4361 UC	2.950,4105 UC	14.788,8702 UC	11.898,9216 UC
mai/2026	0,0000 UC	8.948,5111 UC	5.219,6923 UC	(2.269,2818 UC)	5.219,6923 UC	6.679,2293 UC

C. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA

RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA DO CRÉDITO REALIZADO				
Mês		Valor Unitário da UC	UC Excedente	Valor a Recompor (R\$)
Totais >>	Valores Acumulados >>		0,0000 UC	R\$ 0,00
abr/2026	337,84 UC		0,0000 UC	R\$ 0,00
mai/26	337,84 UC		0,0000 UC	R\$ 0,00

Anexo II - EXPANSÃO - Lista de Obras Concluídas no Mês

Data Solicitação	No do Projeto	No SEI	Título	RA	Qt Luminárias	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)
Quantidade: 0 Projetos				Totais:	0	0,0000

Não ocorreu aprovação de projetos no período.

Relatório do Banco de Crédito de mai/2026

Status: Executado CO

Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês

Data Solicitação	No do Orçamento	Endereço	RA	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)
Quantidade: 46 Serviços		Totais:		5.219,6923
01/05/2026	26VRR188	PRAÇA DOS ORIXÁS - ASA SUL	PLANO PILOTO (RA I)	217,2681
01/05/2026	26VRR189	2ª Avenida Sul QN 306 Conjunto 4/5	SAMAMBAIA (RA XII)	16,8710
01/05/2026	26VRR190	Via L4 Sul – entre a Vila Telebracília e o Viaduto da Ponte das Garças	PLANO PILOTO (RA I)	221,2950
01/05/2026	26VRR191	DF 473 – Próximo ao Balão de acesso ao Mercado Varejão da Fartura	SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)	16,8710
01/05/2026	26VRR192	BR 020 – Condomínio Parque Colorado	SOBRADINHO (RA V)	16,8710
01/05/2026	26VRR193	DF 001 - EM FRENTE AO CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA	LAGO SUL (RA XVI)	16,8710
01/05/2026	26VRR194	Setor Noroeste – Quadras 303/304 – Proximidades da Padoca Brasília	PLANO PILOTO (RA I)	24,5705
01/05/2026	26VRR195	AVENIDA SÃO SEBASTIÃO RESIDENCIAL VITÓRIA	SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)	16,8710
01/05/2026	26VRR196	Setor de Clubes Sul – Estacionamento do Restaurante Rubaiyat Brasília	PLANO PILOTO (RA I)	16,8710
01/05/2026	26VRR197	EPTG (Estrada Parque Taguatinga), altura do Lúcio Costa	GUARÁ (RA X)	9,6889
01/05/2026	26VRR198	Sria II EQ 31/33	GUARÁ (RA X)	11,8734
01/05/2026	26VRR199	Quadra 01 Conjunto D – Setor Burititi	PLANALTINA (RA VI)	4,2943
01/05/2026	26VRR200	St. N QNN 13 – Frente e Lateral do Colégio Cívico Militar (CCM) CED 07	CEILÂNDIA (RA IX)	47,4936
01/05/2026	26VRR201	EQS 206/207 Asa Sul	PLANO PILOTO (RA I)	1.683,7863
01/05/2026	26VRR202	QC 05 – Quadra de Tênis	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	317,3922
01/05/2026	26VRR203	SMPW QD 14 – CT 01 – Próximo ao Balão do Aeroporto	PARK WAY (RA XXIV)	74,3908
01/05/2026	26VRR204	Ponte Alta Norte - 15°59'55.4"S 48°02'13.3"W	GAMA (RA II)	0,0000
01/05/2026	26VRR205	QN 34 – Campo Society (Campo Sintético)	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	146,9464
01/05/2026	26VRR206	QR 118 – Campo Sintético – Samambaia Sul	SAMAMBAIA (RA XII)	21,4008
01/05/2026	26VRR207	QN 319 – Campo Sintético – Samambaia Sul	SAMAMBAIA (RA XII)	23,1842
01/05/2026	26VRR208	SCN Q. 01 Bloco - Edifício Business / Via N3 - Estacionamento de Superfície	PLANO PILOTO (RA I)	50,6130
01/05/2026	26VRR209	Quadra 11, Conjunto G, Lote 03	VARJÃO (RA XXIII)	4,2943
01/05/2026	26VRR210	Praça Jandaia, Quadra 205	ÁGUAS CLARAS (RA XX)	9,6889
01/05/2026	26VRR211	QA 106, Conjunto 8 Sul – Samambaia Sul – DF	SAMAMBAIA (RA XII)	26,8662
01/05/2026	26VRR212	SCLRN 709, Bloco A, Loja 19 a 25 – Asa Norte	PLANO PILOTO (RA I)	25,6512
01/05/2026	26VRR213	SQNW 109, Bloco C – Residencial Espaço Noroeste	PLANO PILOTO (RA I)	16,3066
01/05/2026	26VRR214	BR-020, Novo Viaduto da DF-128 – km 22,6 da BR-020 entrada com a DF-128	PLANALTINA (RA VI)	764,5492
01/05/2026	26VRR215	Vila N3 Oeste - Próximo ao Liberty Mall Shopping	PLANO PILOTO (RA I)	14,6865
01/05/2026	26VRR216	DF-065 - Riacho Fundo II (2XPJ+58X Riacho Fundo II)	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	14,6865
01/05/2026	26VRR217	DF-130, km 1, Chácara 17 – Arapoanga, ponto de referência: Garagem de Ônibus e Transporte Escolar	PLANALTINA (RA VI)	19,4777
01/05/2026	26VRR218	SCIA Quadra 15 conjunto 01/03, próximo ao Restaurante Pimenta Rosa	SCIA/ESTRUTURAL (RA XXV)	14,6865
01/05/2026	26VRR219	DF-001, km 124 – Núcleo Rural Lago Oeste	SOBRADINHO (RA V)	58,8882
01/05/2026	26VRR220	Via L2 Sul	PLANO PILOTO (RA I)	14,6865
01/05/2026	26VRR221	QR 118, na Quadra de Areia	SAMAMBAIA (RA XII)	29,3215

Relatório do Banco de Crédito de mai/2026

Status: Executado CO

Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês

Data Solicitação	No do Orçamento	Endereço	RA	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)
01/05/2026	26VRR222	QNO 17 conjunto 24, Campo Sintético	CEILÂNDIA (RA IX)	32,1012
01/05/2026	26VRR223	SIA Trecho 6 - Sudoeste/Octogonal (próx. 53X3+GX4 Sudoeste)	SIA (RA XXIX)	18,9374
01/05/2026	26VRR224	QR 433 Campo de Futebol e Avenida Principal	SAMAMBAIA (RA XII)	50,6130
01/05/2026	26VRR225	SHCGN 713 - Asa Norte, e Setor de Clubes	PLANO PILOTO (RA I)	451,0924
01/05/2026	26VRR226	QR 433 Campo de Futebol e Avenida Principal	SAMAMBAIA (RA XII)	16,8710
01/05/2026	26VRR227	EPNB - Próximo à Linha do Trem e Próximo ao Viaduto do Bandeirante	NÚCLEO BANDEIRANTE	66,6952
01/05/2026	26VRR228	EPNB - Frente ao Posto Ipiranga, frente ao Café do Sítio e Trecho em Frente - Riacho Fundo	RIACHO FUNDO (RA XVII)	88,7995
01/05/2026	26VRR229	EPNB - Frente à Placa da Mercedes, Frente à Subestação Px da UPA e Frente à UPA	NÚCLEO BANDEIRANTE	126,7199
01/05/2026	26VRR230	EPNB - Próximo ao Viaduto da Samambaia	RIACHO FUNDO (RA XVII)	101,7799
01/05/2026	26VRR231	Quadra 03 Conjunto B, entre as casas 44 e 46 / Conjunto C lotes 31 e 33 - Faixa Verde de Sobradinho DF	SOBRADINHO (RA V)	24,5705
01/05/2026	26VRR232	Avenida P4 no canteiro central da EQNP 24/28 e EQNP 28/32/36	CEILÂNDIA (RA IX)	9,6889
01/05/2026	26VRR233	QR 412	SAMAMBAIA (RA XII)	262,6101

Planilha de Serviços Executados com Uso do Banco de Crédito

Data Solicitação	No do Orçamento	Documento de Referência	Endereço	RA	Tipo Serviço	Descrição Serviço	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)	Custo em UC (Tab 37 Aditivo)
01/05/2026	26VRR188	599/2026 - DIAMANTE	PRAÇA DOS ORIXÁS - ASA SUL	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição de 204m de cabo 4x10mm ² , execução de 197m de Reposição de 01 PCR	217,2681	R\$ 67.889,76
01/05/2026	26VRR189	600/2026 - DIAMANTE	2ª Avenida Sul QN 306 Conjunto 4/5	SAMAMBAIA (RA XII)	REPOSIÇÃO	16m sup 2 petalas e 02 luminárias LED	16,8710	R\$ 5.271,68
01/05/2026	26VRR190	601/2026 - DIAMANTE	Via L4 Sul – entre a Vila Telebracília e o Viaduto da Ponte das Garcas	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição de 159m de cabo 4x10mm ² , 39m3 de vala, substituição	221,2950	R\$ 69.148,05
01/05/2026	26VRR191	602/2026 - DIAMANTE	DF 473 – Próximo ao Balão de acesso ao Mercado Varejão da Fartura	SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias de LED	16,8710	R\$ 5.271,68
01/05/2026	26VRR192	603/2026 - DIAMANTE	BR 020 – Condomínio Parque Colorado	SOBRADINHO (RA V)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, e luminárias de LED	16,8710	R\$ 5.271,68
01/05/2026	26VRR193	181/2024 - DIAMANTE	DF 001 - EM FRENTE AO CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA	LAGO SUL (RA XVI)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias de LED	16,8710	R\$ 5.271,68
01/05/2026	26VRR194	604/2026 - DIAMANTE	Sector Noroeste – Quadras 303/304 – Proximidades da Padoca Brasília	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PAD 7,5m, com luminárias de LED 120W e 22m	24,5705	R\$ 7.677,54
01/05/2026	26VRR195	013/2026 - DIAMANTE	AVENIDA SÃO SEBASTIÃO RESIDENCIAL VITÓRIA	SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias de LED	16,8710	R\$ 5.271,68
01/05/2026	26VRR196	606/2026 - DIAMANTE	Sector de Clubes Sul – Estacionamento do Restaurante Rubaiyat Brasília EPTG (Estrada Parque	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias de LED	16,8710	R\$ 5.271,68
01/05/2026	26VRR197	034/2026 - DIAMANTE	Taguatinga), altura do Lúcio Costa	GUARÁ (RA X)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 01 PET ORNAMENTAL e	9,6889	R\$ 3.027,49
01/05/2026	26VRR198	607/2026 - DIAMANTE	Sria II EQ 31/33	GUARÁ (RA X)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, e 17m de cabo 4x4mm ²	11,8734	R\$ 3.710,08
01/05/2026	26VRR199	607/2026 - DIAMANTE	Quadra 01 Conjunto D – Setor Burititi	PLANALTINA (RA VI)	REPOSIÇÃO	Instalação de 01 BP com luminária de LED 70W e 07m de Kit cabo	4,2943	R\$ 1.341,84
01/05/2026	26VRR200	609/2026 - DIAMANTE	St. N QNN 13 – Frente e Lateral do Colégio Cívico Militar (CCM). CED 07	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Substituição de 04 PCR 16m, 68m de cabo 4x4mm ²	47,4936	R\$ 14.840,33
01/05/2026	26VRR201	610/2026 - DIAMANTE	EQS 206/207 Asa Sul	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	02 PCR 16M SUP 4 PET LED 240W, 03 PCR 16M SUP 2 PET LED 01 pcr 16m sup 4 pet	1.683,7863	R\$ 526.132,71
01/05/2026	26VRR202	611/2026 - DIAMANTE	QC 05 – Quadra de Tênis	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	REPOSIÇÃO	led 240W, 02 pcr 16m sun 2 pet led 240W 20 232m de cabo	317,3922	R\$ 99.175,54
01/05/2026	26VRR203	612/2026 - DIAMANTE	SMPW QD 14 – CT 01 – Próximo ao Balão do Aeroporto	PARK WAY (RA XXIV)	REPOSIÇÃO	4x10mm ² ; 58m3 de vala aberta - Emendas	74,3908	R\$ 23.244,89

Planilha de Serviços Executados com Uso do Banco de Crédito

Data Solicitação	No do Orçamento	Documento de Referência	Endereço	RA	Tipo Serviço	Descrição Serviço	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)	Custo em UC (Tab 37 Aditivo)
01/05/2026	26VRR204	613/2026 - DIAMANTE	Ponte Alta Norte - 15°59'55.4"S 48°02'13.3"W	GAMA (RA II)	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 PCR 16m – Poste Circular de Concreto, com 01 pcr 16m sup 2 pet led 240W, 17m de kit 4x4mm2_01	0,0000	R\$ 0,00
01/05/2026	26VRR205	614/2026 - DIAMANTE	QN 34 – Campo Society (Campo Sintético)	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	REPOSIÇÃO	Substituição de 12 Projetores Led 600W.	146,9464	R\$ 45.916,34
01/05/2026	26VRR206	615/2026 - DIAMANTE	QR 118 – Campo Sintético – Samambaia Sul	SAMAMBAIA (RA XII)	REPOSIÇÃO	Substituição de 13 Projetor Led 600W LED	21,4008	R\$ 6.687,11
01/05/2026	26VRR207	616/2026 - DIAMANTE	QN 319 – Campo Sintético – Samambaia Sul	SAMAMBAIA (RA XII)	REPOSIÇÃO	Substituição de 02 PCR 16m, reposição de 01 PCR 16m sup 2 pet LED Fornecimento e	23,1842	R\$ 7.244,37
01/05/2026	26VRR208	677/2026 - DIAMANTE	SCN Q. 01 Bloco - Edifício Business / Via N3 - Estacionamento de Superfície	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	instalação de 01 BP, com luminária LED	50,6130	R\$ 15.815,04
01/05/2026	26VRR209	678/2026 - DIAMANTE	Quadra 11, Conjunto G, Lote 03	VARJÃO (RA XXIII)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m.	4,2943	R\$ 1.341,84
01/05/2026	26VRR210	679/2026 - DIAMANTE	Praça Jandaia, Quadra 205	ÁGUAS CLARAS (RA XX)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 04 PET, luminárias LED 240W	9,6889	R\$ 3.027,49
01/05/2026	26VRR211	680/2026 - DIAMANTE	QA 106, Conjunto 8 Sul – Samambaia Sul – DF	SAMAMBAIA (RA XII)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAD 7,5m, com luminárias LED 150W e 22m de	26,8662	R\$ 8.394,88
01/05/2026	26VRR212	681/2026 - DIAMANTE	SCLRN 709, Bloco A, Loja 19 a 25 – Asa Norte	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAD 5m, com luminárias LED 40W e 16m de KIT	25,6512	R\$ 8.015,23
01/05/2026	26VRR213	682/2026 - DIAMANTE	SQNW 109, Bloco C – Residencial Espaço Noroeste	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Retirada de 30 PCR 16m, reinstalação de 13 pcr 16m, retirada de	16,3066	R\$ 5.095,32
01/05/2026	26VRR214	683/2026 - DIAMANTE	BR-020, Novo Viaduto da DF- 128 – km 22,6 da BR-020 entrada com a DF-128	PLANALTINA (RA VI)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, e luminárias de LED	764,5492	R\$ 238.898,69
01/05/2026	26VRR215	032/2026 - DIAMANTE	Vila N3 Oeste - Próximo ao Liberty Mall Shopping	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 01 PET, com luminária de LED	14,6865	R\$ 4.589,09
01/05/2026	26VRR216	033/2026 - DIAMANTE	DF-065 - Riacho Fundo II (2XPJ+58X Riacho Fundo II)	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PAS 10m, luminária LED 150W, 13m de KIT cabo	14,6865	R\$ 4.589,09
01/05/2026	26VRR217	684/2026 - DIAMANTE	DF-130, km 1, Chácara 17 – Arapoanga, ponto de referência: Garagem de SCIA Quadra 15 conjunto	PLANALTINA (RA VI)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m danificado, SUP 02 PET luminárias LED	19,4777	R\$ 6.086,20
01/05/2026	26VRR218	639/2026 - DIAMANTE	01/03, próximo ao Restaurante Pimenta Rosa	SCIA/ESTRUTURAL (RA XXV)	REPOSIÇÃO	Reposição de 06 PAS 10m, com luminárias LED 70W e 78m de	14,6865	R\$ 4.589,09
01/05/2026	26VRR219	685/2026 - DIAMANTE	DF-001, km 124 – Núcleo Rural Lago Oeste	SOBRADINHO (RA V)	REPOSIÇÃO		58,8882	R\$ 18.400,80

Planilha de Serviços Executados com Uso do Banco de Crédito

Data Solicitação	No do Orçamento	Documento de Referência	Endereço	RA	Tipo Serviço	Descrição Serviço	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)	Custo em UC (Tab 37 Aditivo)
01/05/2026	26VRR220	037/2026 - DIAMANTE	Via L2 Sul	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, e 02 luminárias de LED	14,6865	R\$ 4.589,09
01/05/2026	26VRR221	686/2026 - DIAMANTE	QR 118, na Quadra de Areia	SAMAMBAIA (RA XII)	REPOSIÇÃO	Reposição de 02 PAS 7,5m com luminárias LED 120W, 22m de KIT	29,3215	R\$ 9.162,09
01/05/2026	26VRR222	687/2026 - DIAMANTE	QNO 17 conjunto 24, Campo Sintético	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Substituição de 18 refletores de LED 600W	32,1012	R\$ 10.030,66
01/05/2026	26VRR223	031/2026 - DIAMANTE	SIA Trecho 6 - Sudoeste/Octogonal (próx. 53X3+GX4 Sudoeste)	SIA (RA XXIX)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 10m, com luminária de LED 150W e 13m de	18,9374	R\$ 5.917,37
01/05/2026	26VRR224	688/2026 - DIAMANTE	QR 433 Campo de Futebol e Avenida Principal	SAMAMBAIA (RA XII)	REPOSIÇÃO	Reposição de 03 PCR 16m com suportes 02 nétalas, 06 luminárias	50,6130	R\$ 15.815,04
01/05/2026	26VRR225	690/2026 - DIAMANTE	SHCGN 713 - Asa Norte, e Setor de Clubes	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Remanejamento 04 poste de aço, 826m de 4x4mm ² , 258m de	451,0924	R\$ 140.952,84
01/05/2026	26VRR226	688/2026 - DIAMANTE	QR 433 Campo de Futebol e Avenida Principal	SAMAMBAIA (RA XII)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m com suportes 02 nétalas, 02 luminárias	16,8710	R\$ 5.271,68
01/05/2026	26VRR227	692/2026 - DIAMANTE	EPNB - Próximo à Linha do Trem e Próximo ao Viaduto do Bandeirante	NÚCLEO BANDEIRANTE (RA VIII)	REPOSIÇÃO	Escavação de 52m ³ de vala, substituição de 208m de cabo	66,6952	R\$ 20.840,25
01/05/2026	26VRR228	693/2026 - DIAMANTE	EPNB - Frente ao Posto Ipiranga, frente ao Café do Sítio e Trecho em Frente -	RIACHO FUNDO (RA XVII)	REPOSIÇÃO	Escavação de 85m ³ de vala, 255m de cabo 4x4mm ² , 85m de cabo	88,7995	R\$ 27.747,18
01/05/2026	26VRR229	694/2026 - DIAMANTE	EPNB - Frente à Placa da Mercedes, Frente à Subestação Px da UPA e	NÚCLEO BANDEIRANTE (RA VIII)	REPOSIÇÃO	Escavação de 117m ³ de vala, 297m de cabo 4x4mm ² , 172m de cabo	126,7199	R\$ 39.596,17
01/05/2026	26VRR230	695/2026 - DIAMANTE	EPNB - Próximo ao Viaduto da Samambaia	RIACHO FUNDO (RA XVII)	REPOSIÇÃO	Escavação de 84m ³ de vala, 83m de cabo 4x4mm ² , 256m de	101,7799	R\$ 31.803,17
01/05/2026	26VRR231	713/2026 - DIAMANTE	Quadra 03 Conjunto B, entre as casas 44 e 46 / Conjunto C lotes 31 e 33 - Faixa Verde de	SOBRADINHO (RA V)	REPOSIÇÃO	Reposição do de 01 PAD 7,5m com luminárias LED 120W	24,5705	R\$ 7.677,54
01/05/2026	26VRR232	714/2026 - DIAMANTE	Avenida P4 no canteiro central da EQNP 24/28 e EQNP 28/32/36	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m.	9,6889	R\$ 3.027,49
01/05/2026	26VRR233	/2026 - DIAMANTE	QR 412	SAMAMBAIA (RA XII)	REPOSIÇÃO	05 PAS 7,5M LED 70W, 03 PAS 5 LED 40W, 01 PAD 5M LED 40W	262,6101	R\$ 82.057,78

Lista de Serviços de Correção de Vandalismo e Reposições - Abr/2026 a Mar/2027

5.219,6923

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/05/2026	26VRR188	REPOSIÇÃO	Reposição de 204m de cabo 4x10mm ² , execução de 197m de MND, 22h solda de grades e janelas de postes de aço.		423,0	1,0955	217,2681
			CABO 4X10MM2	Instalação de Cabo 4x10 mm2	204,0	0,2078	42,3912
			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	197,0	0,8877	174,8769
			NR	Não Remunerado	22,0	0,0000	0,0000
01/05/2026	26VRR189	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m sup 2 petalas e 02 luminárias LED 240W, 17m de Kit 4x4mm2		19,0	14,8150	16,8710
			PCR 16 COM 2 PETALAS LED 240	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/05/2026	26VRR190	REPOSIÇÃO	Reposição de 159m de cabo 4x10mm ² , 39m3 de vala, substituição de 02 luminárias de LED 120W, substituição de 33 luminárias de LED 240W.		233,0	8,5215	221,2950
			CABO 4X10MM2	Instalação de Cabo 4x10 mm2	159,0	0,2078	33,0402
			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	39,0	0,4514	17,6046
			LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	2,0	2,8647	5,7294
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	33,0	4,9976	164,9208
01/05/2026	26VRR191	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias de LED 240W, e 17m KIT cabo 4x4mm ² .		19,0	14,8150	16,8710
			PCR 16 COM 2 PETALAS LED 240	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/05/2026	26VRR192	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, e luminárias de LED 240W, 17M DE KIT 4x4mm2.		19,0	14,8150	16,8710
			PCR 16 COM 2 PETALAS LED 240	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/05/2026	26VRR193	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias de LED 240W, 17m kit 4x4mm2.		19,0	14,8150	16,8710
			PCR 16 COM 2 PETALAS LED 240	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/05/2026	26VRR194	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PAD 7,5m, com luminárias de LED 120W, e 22m de cabo 2x4mm ² .		24,0	18,1109	24,5705
			PAD 7,5 LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz COM poste (V2)	1,0	14,9386	14,9386
			LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	1,0	2,8647	2,8647
			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	22,0	0,3076	6,7672
01/05/2026	26VRR195	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias de LED 240W, e 17m de cabo 4x4mm ² .		19,0	14,8150	16,8710

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
			PCR 16 COM 2 PETALAS LED 240	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/05/2026	26VRR196	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias de LED 240W e 17m de KIT cabo 4x4mm².		19,0	14,8150	16,8710
			PCR 16 COM 2 PETALAS LED 240	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/05/2026	26VRR197	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 01 PET ORNAMENTAL, e luminária de LED 240W.		1,0	9,6889	9,6889
			PCR 16M SUP 1 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/05/2026	26VRR198	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, e 17m de cabo 4x4mm².		18,0	9,8174	11,8734
			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/05/2026	26VRR199	REPOSIÇÃO	Instalação de 01 BP com luminária de LED 70W, e 07m de Kit cabo 2x4mm².		8,0	2,4487	4,2943
			BP LED 70W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V3)	1,0	2,1411	2,1411
			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	7,0	0,3076	2,1532
01/05/2026	26VRR200	REPOSIÇÃO	Substituição de 04 PCR 16m, 68m de cabo 4x4mm².		72,0	9,8174	47,4936
			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	4,0	9,6889	38,7556
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	68,0	0,1285	8,7380
01/05/2026	26VRR201	REPOSIÇÃO	02 PCR 16M SUP 4 PET LED 240W, 03 PCR 16M SUP 2 PET LED 240W, 10 PAD 7,5M LED 120W, 07 PAS 5M LED 40W, REMANEJAMENTO 13 PAS 5M E 03 PAS 7,5M, 396M DE KIT 2X4MM2, 85M KIT 4X4MM2, 946M DE CABO 4X4MM2, 385M DE CABO 4X10MM2, 358M3 DE VALA, 593M DE MND, 465M DE CABO 4X35 ALU DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGENS, SUBSTITUIÇÃO 29 LED 40W.		3.314,0	64,8330	1.683,7863
			PCR 16M SUP 4 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	6,0	4,9976	29,9856
			PCR 11M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	3,0	9,6889	29,0667
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	3,0	4,9976	14,9928
			PAD 7,5 LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz COM poste (V2)	10,0	14,9386	149,3860
			LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	10,0	2,8647	28,6470
			PAS 5M LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	7,0	5,6925	39,8475
			REMANEJAMENTO COM POSTE	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	13,0	1,9140	24,8820
			REMANEJAMENTO COM POSTE	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	3,0	1,9140	5,7420
			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	396,0	0,3076	121,8096
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	85,0	0,1285	10,9225
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	946,0	0,1285	121,5610

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
			CABO 4X10MM	Instalação de Cabo 4x10 mm2	385,0	0,2078	80,0030
			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	358,0	0,4514	161,6012
			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	593,0	0,8877	526,4061
			CABO 4X35MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x35 mm ²	465,0	0,3322	154,4730
			LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	29,0	5,6925	165,0825
01/05/2026	26VRR202	REPOSIÇÃO	01 pcr 16m sup 4 pet led 240W, 02 pcr 16m sup 2 pet led 240W, 20 substituições led 240w, 01 pas 7,5m led 70W, 266m de cabo 4x4mm2, 193m de cabo 4x10mm2, 41m de mnd, 104m3 de vala, 11m de kit 2x4mm2, 51m de kit 4x4mm2.		693,0	42,2980	317,3922
			PCR 16M SUP 4 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
			PCR 11M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	2,0	4,9976	9,9952
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	20,0	4,9976	99,9520
			PAS 7,5M LED 70W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V3)	1,0	5,8159	5,8159
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	266,0	0,1285	34,1810
			CABO 4X10MM	Instalação de Cabo 4x10 mm2	193,0	0,2078	40,1054
			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	41,0	0,8877	36,3957
			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	104,0	0,4514	46,9456
			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	11,0	0,3076	3,3836
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	51,0	0,1285	6,5535
01/05/2026	26VRR203	REPOSIÇÃO	232m de cabo 4x10mm ² ; 58m3 de vala aberta; Emendas isoladas.		290,0	6,6592	74,3908
			CABO 4X10MM2	Instalação de Cabo 4x10 mm2	232,0	0,2078	48,2096
			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	58,0	0,4514	26,1812
01/05/2026	26VRR204	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 PCR 16m – Poste Circular de Concreto, com suporte 4 Pétalas, e luminárias		1,0	0,0000	0,0000
			NR	Não Remunerado	1,0	0,0000	0,0000
01/05/2026	26VRR205	REPOSIÇÃO	01 pcr 16m sup 2 pet led 240W, 17m de kit 4x4mm2, 01 remanejamento de pcr 16m , substituição de 18 led 150W, 278m de cabo 4x4mm2, 69m3 de vala.		385,0	20,7140	148,9464
			PCR 11M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
			REMANEJAMENTO COM POSTE	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	1,0	1,9140	1,9140
			LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	18,0	3,4051	61,2918
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	278,0	0,1285	35,7230
			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	69,0	0,4514	31,1466
01/05/2026	26VRR206	REPOSIÇÃO	Substituição de 12 Projetores Led 600W.		12,0	1,7834	21,4008
			PROJETOR	Instalação de 1 (um) ponto projetor sem poste	12,0	1,7834	21,4008
01/05/2026	26VRR207	REPOSIÇÃO	Substituição de 13 Projetor Led 600W LED		13,0	1,7834	23,1842

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
			PROJETOR	Instalação de 1 (um) ponto projetor sem poste	13,0	1,7834	23,1842
01/05/2026	26VRR208	REPOSIÇÃO	Substituição de 02 PCR 16m, reposição de 01 PCR 16m sup 2 pet LED 240W, 51m de kit 4x4mm2.		57,0	29,5015	50,6130
			PCR 16 M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	2,0	4,9976	9,9952
			PCR 16 M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	51,0	0,1285	6,5535
01/05/2026	26VRR209	REPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação de 01 BP, com luminária LED 70W, e reposição de 07m de cabo 2x4mm².		8,0	2,4487	4,2943
			BP LED 70W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V3)	1,0	2,1411	2,1411
			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	7,0	0,3076	2,1532
01/05/2026	26VRR210	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m.		1,0	9,6889	9,6889
			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/05/2026	26VRR211	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 04 PET, luminárias LED 240W, e 17m de KIT cabo 4x4mm².		21,0	14,8150	28,8682
			PCR 16M SUP 4 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	3,0	4,9976	14,9928
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/05/2026	26VRR212	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAD 7,5m, com luminárias LED 150W e 22m de KIT cabo 2x4mm².		24,0	19,1916	25,6512
			PAD 7,5M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
			LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	1,0	3,4051	3,4051
			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	22,0	0,3076	6,7672
01/05/2026	26VRR213	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAD 5m, com luminárias LED 40W e 16m de KIT cabo2x4mm².		18,0	11,6926	16,3066
			PAD 5M LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	1,0	5,6925	5,6925
			LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	1,0	5,6925	5,6925
			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	16,0	0,3076	4,9216
01/05/2026	26VRR214	REPOSIÇÃO	Retirada de 30 PCR 16m, reinstalação de 13 pcr 16m, retirada de 04 PAS 10m, 15 BP, 105m de kit 2x4mm2, 1850m de cabo 4x16mm2 ALU aéreo		2.017,0	13,1857	764,5482
			NR	Não Remunerado	30,0	0,0000	0,0000
			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	13,0	9,6889	125,9557
			NR	Não Remunerado	4,0	0,0000	0,0000
			BP LED 120 W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	15,0	2,8647	42,9705
			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	105,0	0,3076	32,2980
			CABO 4X16MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x16 mm²	1.850,0	0,3045	563,3250

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/05/2026	26VRR215	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, e luminárias de LED 240W.		2,0	14,6865	14,6865
			PCR 16 M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/05/2026	26VRR216	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 01 PET, com luminária de LED 240W.		2,0	14,6865	14,6865
			PCR 16 M LED 240	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/05/2026	26VRR217	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PAS 10m, luminária LED 150W, 13m de KIT cabo 2x4mm ² .		14,0	15,7865	19,4777
			PAS 10 M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	13,0	0,3076	3,9988
01/05/2026	26VRR218	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m danificado, SUP 02 PET, luminárias LED 240W, e reposição de 17m de kit cabo 4x4mm ² .		2,0	14,6865	14,6865
			PCR 16 M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/05/2026	26VRR219	REPOSIÇÃO	Reposição de 06 PAS 10m, com luminárias LED 70W, e 78m de cabo 2x4mm ² .		84,0	6,1235	58,8682
			PAS 10M LED 70W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V3)	6,0	5,8159	34,8954
			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	78,0	0,3076	23,9928
01/05/2026	26VRR220	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, e 02 luminárias de LED 240W.		2,0	14,6865	14,6865
			PCR 16 COM 2 PETALAS LED 240	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/05/2026	26VRR221	REPOSIÇÃO	Reposição de 02 PAS 7,5m com luminárias LED 120W, 22m de KIT cabo 2x4mm ² e 85m de cabo 4x4mm ² , 23m3 de Vala.		109,0	6,2520	29,3215
			PAS 7,5M 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V3)	2,0	5,8159	11,6318
			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	22,0	0,3076	6,7672
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	85,0	0,1285	10,9225
01/05/2026	26VRR222	REPOSIÇÃO	Substituição de 18 refletores de LED 600W.		18,0	1,7834	32,1012
			PROJETOR	Instalação de 1 (um) ponto projetor sem poste	18,0	1,7834	32,1012
01/05/2026	26VRR223	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 10m, com luminária de LED 150W, e 13m de KIT cabo 2x4mm ² .		14,0	15,2462	18,9374
			PAS 10M LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V2)	1,0	14,9386	14,9386
			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	13,0	0,3076	3,9988
01/05/2026	26VRR224	REPOSIÇÃO	Reposição de 03 PCR 16m com suportes 02 pétalas, 06 luminárias LED 244W, 51m de cabo 4x4mm ² , substituição de 04, 03 retiradas de PCR 16m abalroadas		64,0	14,8150	50,6130
			PCR 16 M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	3,0	9,6889	29,0667
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	3,0	4,9976	14,9928

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	51,0	0,1285	6,5535
			NR	Não Remunerado	4,0	0,0000	0,0000
			NR	Não Remunerado	3,0	0,0000	0,0000
01/05/2026	26VRR225	REPOSIÇÃO	Remanejamento 04 poste de aço, 826m de 4x4mm2, 258m de cabo 4x10mm2, 252m3 de vala, 43 janelas de inspeção 40h de solda, 18 substituições de LED 40W, 76m de mnd.		1.434,0	9,2819	451,0924
			REMANEJAMENTO COM POSTE	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	4,0	1,9140	7,6560
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	826,0	0,1285	106,1410
			CABO 4X10MM	Instalação de Cabo 4x10 mm2	258,0	0,2078	53,6124
			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	252,0	0,4514	113,7528
			LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	18,0	5,6925	102,4650
			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	76,0	0,8877	67,4652
01/05/2026	26VRR226	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m com suportes 02 pétalas, 02 luminárias LED 244W, 17m de KIT cabo 4x4mm².		19,0	14,8150	16,8710
			PCR 16 M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/05/2026	26VRR227	REPOSIÇÃO	Escavação de 52m3 de vala, substituição de 208m de cabo 4x10mm², execução de 10 emendas isoladas, recomposição de vala; normalização dos circuitos.		260,0	0,6592	66,6952
			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	52,0	0,4514	23,4728
			CABO 4X10MM	Instalação de Cabo 4x10 mm2	208,0	0,2078	43,2224
01/05/2026	26VRR228	REPOSIÇÃO	Escavação de 85m3 de vala, 255m de cabo 4x4mm², 85m de cabo 4x10mm² e circuitos normalizados.		425,0	0,7877	88,7995
			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	85,0	0,4514	38,3690
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	255,0	0,1285	32,7675
			CABO 4X10MM	Instalação de Cabo 4x10 mm2	85,0	0,2078	17,6630
01/05/2026	26VRR229	REPOSIÇÃO	Escavação de 117m3 de vala, 297m de cabo 4x4mm², 172m de cabo 4x10mm², 16 emendas isoladas. Circuitos normalizados.		586,0	0,7877	126,7199
			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	117,0	0,4514	52,8138
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	297,0	0,1285	38,1645
			CABO 4X10MM	Instalação de Cabo 4x10 mm2	172,0	0,2078	35,7416
01/05/2026	26VRR230	REPOSIÇÃO	Escavação de 84m3 de vala, 83m de cabo 4x4mm2, 256m de cabo 4x10mm², 20 emendas isoladas. Circuitos normalizados.		423,0	0,7877	101,7799
			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	84,0	0,4514	37,9176
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	83,0	0,1285	10,6655
			CABO 4X10MM	Instalação de Cabo 4x10 mm2	256,0	0,2078	53,1968
01/05/2026	26VRR231	REPOSIÇÃO	Reposição do de 01 PAD 7,5m com luminárias LED 120W, e reposição de 22m de cabo 2x4mm².		24,0	18,1109	24,5705
			PAD 7,5 LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz COM poste (V2)	1,0	14,9386	14,9386

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
			LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	1,0	2,8647	2,8647
			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	22,0	0,3076	6,7672
01/05/2026	26VRR232	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m.		1,0	9,6889	9,6889
			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/05/2026	26VRR233	REPOSIÇÃO	05 PAS 7,5M LED 70W, 03 PAS 5 LED 40W, 01 PAD5M LED 40W, 01PCR16M SUP 4 PET LED 240W,02 PCR16M SUP 2 PET LED 240W, 64m de MND, 271m de cabo 4x4mm2, 106m de cabo 4x10mm2, 78m3 de Vala, 01 BP led 70W		538,0	56,0829	262,6161
			PAS 7,5M LED 70W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V3)	5,0	5,8159	29,0795
			PAS 5M LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	3,0	5,6925	17,0775
			PAD 5M LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	1,0	5,6925	5,6925
			LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	1,0	5,6925	5,6925
			PCR 16M SUP 4 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	3,0	4,9976	14,9928
			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	2,0	4,9976	9,9952
			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	64,0	0,8877	56,8128
			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	271,0	0,1285	34,8235
			CABO 4X10MM2	Instalação de Cabo 4x10 mm2	106,0	0,2078	22,0268
			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	78,0	0,4514	35,2092
			BP LED 70W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V3)	1,0	2,1411	2,1411
