

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Brasília, 25 de agosto de 2026

Índice

1. INTRODUÇÃO	4
2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	4
2.1. Manutenção	4
2.1.1. Preditiva	4
2.1.2. Manutenção Preventiva	5
2.1.3. Manutenção Corretiva	5
a. Dos serviços executados no mês de julho/26	7
b. Manutenção Emergencial	7
2.1.4. Furtos e Vandalismos	8
2.1.5. Ações de Melhorias	8
2.1.6. Projetos e Obras	9
2.1.6.1. Projetos de Expansão	9
2.4.6.2. Obras	10
2.1.7. Modernização	10
2.1.8. Resumo do Parque de Iluminação Pública por tipo e potência no mês	12
2.1.9. Receitas Acessórias	13
3. INDICADORES DE DESEMPENHO	13
3.1. Apuração dos Indicadores	14
3.1.1 Indicador de Pontos Acesos à Noite – IPAN	14
3.1.2 Indicador Iluminância e Uniformidade – IIL	15
3.1.3 Indicador de Temperatura de Cor – ITC	15
3.1.4 Indicador de Reprodução de Cor – IRC	16
3.1.5 Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização - ICL	16
3.1.6 Indicador da Conformidade da Potência Total - ICP	17
3.1.7 Indicador da Conformidade das Demais Informações do Cadastro - ICIC	17
3.1.8 Indicador de Pontos Apagados Durante o dia - IPAD	18
3.1.9 Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados - IDSGC ..	18
3.1.10 Indicador de Cumprimento do Tempo de Espera - ITM	19
3.1.11 Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão - IDST ..	19
3.1.12 Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão - IDFST	20
3.1.13 Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - IPOM	20
3.1.14 Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais – ICDM	20
3.1.15 Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços – ICRES	21

3.1.16	Indicador da Transparência da Concessão – ITC	22
3.1.17	Indicador de Eficientização - IE	23
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	23

1. INTRODUÇÃO

A CEB Iluminação Pública e Serviços - CEB IPES, prestadora dos serviços de iluminação pública no Distrito Federal, mediante CONTRATO DE CONCESSÃO publicado em 6 de dezembro de 2023, cuja outorga foi predeterminada pela Lei Distrital n.º 7.275, de 5 de julho de 2023, e regulamentada pelo Decreto Distrital n.º 45.033, de 4 de outubro de 2023.

O presente relatório mensal apresenta os resultados operacionais referentes à prestação dos serviços no Distrito Federal, no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, conforme solicitado no Caderno de Encargos do Contrato de Concessão.

2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com o Caderno de Encargos do Contrato de Concessão de prestação de serviço de iluminação pública do Distrito Federal, a Concessionária deve apresentar o Relatório Mensal de Prestação de Serviço. Os dados apresentados contemplam as informações sobre as atividades executadas relacionadas as:

- I. Manutenção;
- II. Projetos e Obras;
- III. Modernização.

Os serviços de manutenção estão relacionados às atividades operacionais para manter a disponibilidade do parque de iluminação pública, enquanto os serviços de projetos e obras estão relacionados à expansão do parque e o item de modernização, à modernização do parque de iluminação pública.

2.1. Manutenção

Os serviços de manutenção podem ser classificados em:

- I. Manutenção Preditiva;
- II. Manutenção Preventiva;
- III. Manutenção Corretiva.

2.1.1. Preditiva

Por definição, a manutenção preditiva do sistema de iluminação pública é um conjunto de ações planejadas que utiliza tecnologias de monitoramento, análise de dados e sensores inteligentes para prever falhas, otimizar o desempenho do sistema e reduzir custos operacionais. A manutenção preditiva baseia-se no estado real dos equipamentos.

As principais atividades da Manutenção Preditiva são: inspeções remotas diárias via telegestão; Geração automática de relatórios de falhas potenciais; Medição e análise de parâmetros elétricos, buscando indícios de sobrecarga ou desgaste; Mapeamento de pontos críticos, como áreas com maior incidência de queimas; Planejamento de

intervenções baseado em risco e urgência; Atualizações de firmware de controladores e dispositivos inteligentes; Verificação da integridade de cabos, conectores e braços (em campo, conforme indicação de anomalias). Entretanto, a estrutura atual do parque de iluminação pública do Distrito Federal não permite a execução deste tipo de manutenção. Com a implantação da telegestão, esse tipo de manutenção fará parte das atividades da CEB IPES na gestão da manutenção da iluminação pública. A inserção da telegestão faz parte dos planos de investimento que estão em andamento na empresa.

2.1.2. Manutenção Preventiva

A **manutenção preventiva** é um conjunto de ações planejadas que busca evitar falhas antes que elas ocorram. Ela se baseia em **cronogramas regulares**, padrões de uso, recomendações do fabricante e análises históricas de desempenho dos equipamentos. A premissa fundamental é que todo ativo possui um ciclo de vida, sujeito a desgaste natural, e que intervenções periódicas reduzem a probabilidade de falhas repentinas.


No caso de sistemas de infraestrutura, como a iluminação pública, a manutenção preventiva engloba atividades como limpeza e inspeção das luminárias, substituição programada de componentes com vida útil conhecida, verificação dos níveis de isolamento, reaperto de conexões e testes de funcionamento. O objetivo é preservar o desempenho do sistema, garantir que as luminárias operem dentro dos parâmetros elétricos adequados e evitar interrupções do serviço

Manutenções preventivas podem também ter origem a partir de necessidades apontadas durante as manutenções corretivas, sendo que em alguns casos, são identificados cabos, quadros de comandos e/ou postes que necessitam de reparos mesmo estando em funcionamento, gerando Relatórios de Não Conformidade (RNC). No mês de julho, foram gerados 174 RNC's que foram tratados como manutenção preventiva.

2.1.3. Manutenção Corretiva

No mês de julho de 2026, tivemos 5.176 solicitações de serviços abertas nos Canais de Atendimento ao Cliente, para reparos na iluminação pública do Distrito Federal. Estas solicitações foram abertas nos quatro canais disponíveis, conforme distribuição mostrada no gráfico 1.


Gráfico 1: Número de protocolos abertos por canal de atendimento.

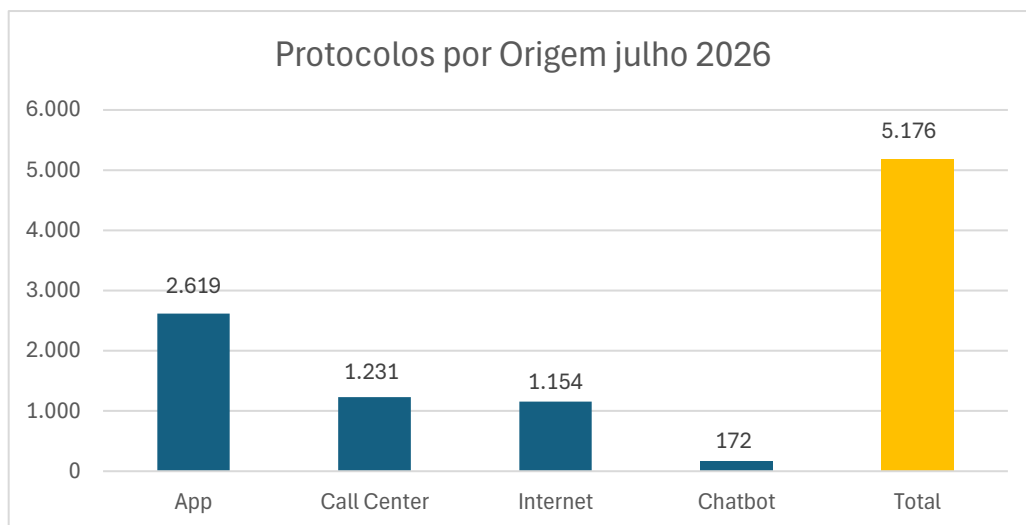

Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

Destas solicitações originaram-se ordens de serviço que, após atendimento inicial, tiveram os seguintes status: atendido, em atendimento ou pendente, conforme gráfico 2.

Gráfico 2: Status da Solicitação.

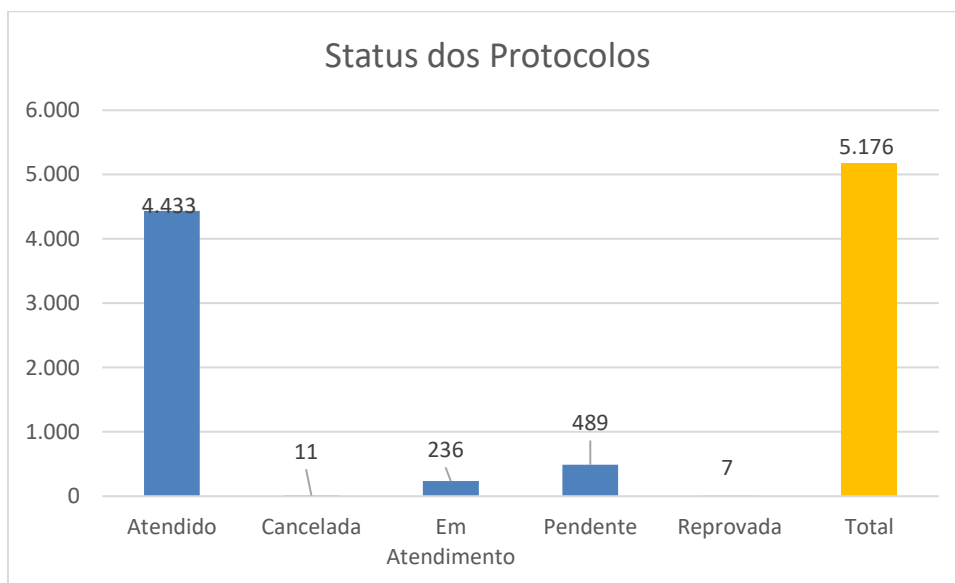


Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

A classificação "atendido" indica que houve atuação da equipe de manutenção com restabelecimento da iluminação pública. Nos casos "em atendimento", as equipes de manutenção geraram ordens de serviço, mas que ainda não foram concluídas até o período final deste relatório. Em 18 (dezoito) casos, os protocolos foram cancelados ou reprovados pelo sistema devido a inconsistências, e nos casos de "pendente", até o dia 31/07/2026 as solicitações ainda não haviam sido concluídas ou não foram geradas ordens de serviços pela programação.

a. Dos serviços executados no mês de julho/26


Em relação à execução dos serviços no mês de julho de 2026, foram registrados 5.569 atendimentos relacionados às solicitações de clientes, distribuídos conforme gráfico 3. Não são considerados nesse gráfico, atendimentos originados por ocorrências geradas pela CEB, Empreiteiras e canal ADM24hs.

Gráfico 3: Atendimentos por Origem de Solicitação – ref. julho/26.

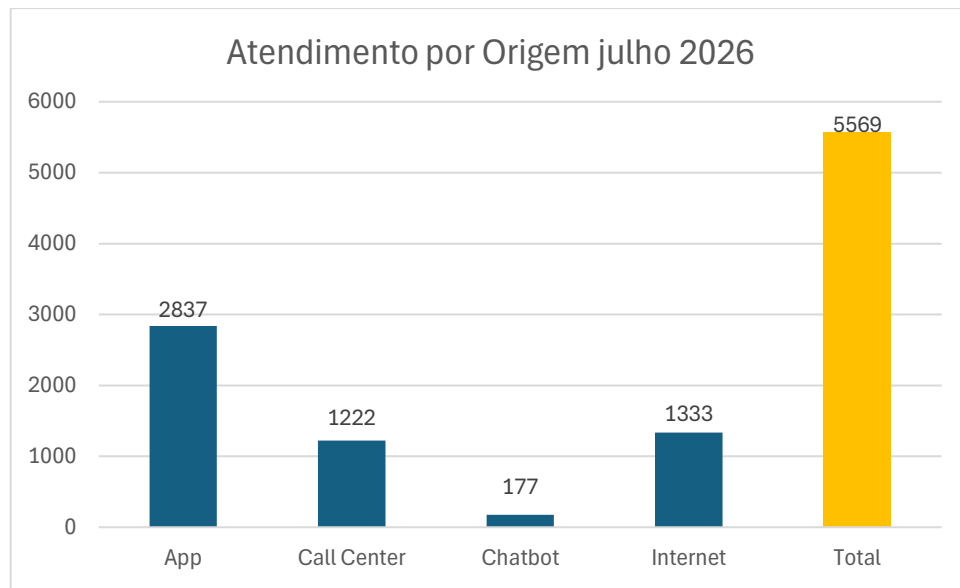

Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

Gráfico 4: Atendimentos – Acumulado 2026.

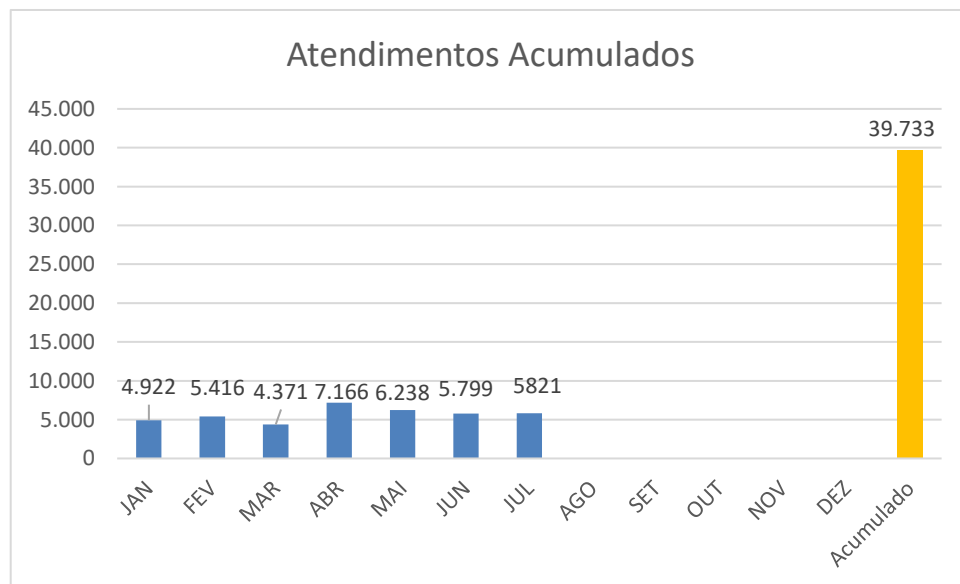


Fonte: Diretoria de Operação e Manutenção

b. Manutenção Emergencial

A manutenção emergencial é um tipo de manutenção corretiva, sendo que nestes casos, são reparos que exigem pronto atendimento. No mês de julho de 2026, foram registrados 159 atendimentos emergenciais, sendo 67 atendimentos a risco de choque elétrico, 04 atendimentos a fiação danificada, 28 atendimentos a fiação exposta, 17 em postes caídos e 43 em postes tortos ou danificados, conforme gráfico a seguir:

Gráfico 5: Manutenção Emergencial

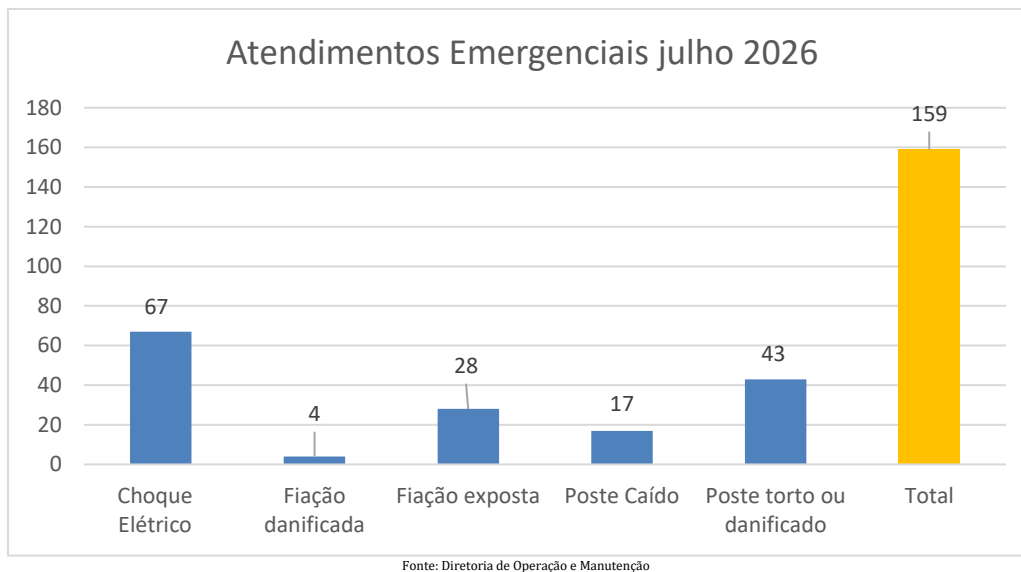

2.1.4. Furtos e Vandalismos

No mês de julho de 2026, foram registrados furtos e atos de vandalismo que resultaram na subtração de 13.435 metros de cabos da rede de iluminação pública em todo o Distrito Federal. Essa situação ocasionou expressivos prejuízos à CEB IPES, tanto em razão dos custos de reposição dos materiais quanto da necessidade de mobilização de equipes para atendimento das ocorrências.

Além do impacto financeiro, esses eventos comprometeram diretamente à execução das atividades rotineiras de manutenção preventiva, exigindo o redirecionamento de recursos operacionais para ações corretivas emergenciais.

Adicionalmente, a interrupção do funcionamento da iluminação pública em decorrência dos furtos e atos de vandalismo expôs a população a riscos durante o período em que os locais permaneceram sem iluminação, afetando a segurança de pedestres e motoristas, aumentando a sensação de insegurança e comprometendo a utilização adequada dos espaços públicos até a completa recomposição da infraestrutura danificada.

2.1.5. Ações de Melhorias

No decorrer do mês de julho de 2026, foram realizadas diversas ações de mutirão e de recuperação total ou parcial de iluminação pública em todo o Distrito Federal.

Essas ações vêm complementar as manutenções corretivas, visando a melhoria da qualidade de vida da população e maior segurança.

No período foram recuperadas:

Tabelas dos principais pontos atendidos 07/2026		
Item	Endereço	local
1	Execução de 289m de MND, 56m de kit cabo 2x4mm², 34m de kit cabo 2x4mm², 392m de cabo 4x4mm², 477m de cabo 4x10mm² e 193m de cabo 4x35mm² ALU, 145m³ de Vala, 08 Bpled 120W, 02 pcr 16m sup 2 pet Led 240W	PLANO PILOTO
2	Substituição de 05 PCR 16m, reposição de 04 PAS 7,5m LED 120W, 44m de Kit 2x4mm².	LAGO NORTE
3	Reposição de 19 BP, com luminárias LED 150W, 133m de KIT cabo 2x4mm², 17m de KIT 4x4mm², 1209m de cabo 4x16mm² ALU aéreo, reposição de instalação de 05 postes circular, 01 PCR 16m sup 2 pet led 240W.	CEILÂNDIA
4	Remanejamento de 06 PAS 10m, 78m de Kit 2x4mm², 253m de cabo 4x4mm², 55m³ de vala, 32m de MND.	LAGO SUL
5	28 braços pesados com luminárias LED 120W; 940 m de cabo de alumínio quadruplex 4x16 mm² .	CEILÂNDIA
6	296 M DE MND, 341M DE CABO 4X4M2, 738M DE CABO 4X10MM2, 239M DE CABO 4X25MM2, 255M3 DE VALA, 02 PCR , 01 PCR 16M SUP 2 PET LED 240W, 17M DE KIT CABO 2X4MM2, 02 HASTES DE ATERRAMENTO E 20M DE CORDOALHA.	PLANO PILOTO
7	Substituição de 03 PCR 16m, 51m de Kit 4x4mm².	LAGO NORTE
8	Reposição de 03 PCR 16m, 03 SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 51m de KIT cabo 4x4mm².	JARDIM BOTÂNICO
9	TESTE DE 450M DE CABO PP ALU 4X10MM2 LANÇADO NO SOLO, 02 PCR 11 M, 557M3 DE VALA, 143=13M DE CABO 4X16MM2 ALU, 463M DE CABO 4X25MM2 ALU, 78M CABO 4X35MM2 ALU, , 1504M DE DUTO CORRUGADO, 28M DE MND.	PLANO PILOTO
10	Retirada de 01 pcr16, e reposição de 01 PCR 16m, SUP 04 PET, luminárias LED 240W e 17m de KIT cabo 4x4mm².	GUARÁ

Além dessas ações, foram executadas substituição de refletores de campos de futebol e túneis, bem como luminárias de vias públicas, ações dentro do mutirão 100% LED, em parceria com a Diretoria de Obras.

2.1.6. Projetos e Obras

2.1.6.1. Projetos de Expansão

Trata-se de projetos que possuem o objetivo de expandir o parque de iluminação pública do Distrito Federal.

Tabela 1: Quantidade de Pontos de Iluminação por Projeto no Mês.

Endereço	Região Administrativa	Qtd. de pontos por tipo de fonte de luz utilizada	Valor (Em R\$)	Valor (Em UC)
DF-11 – VIA EPIG – TRECHO 01	PLANO PILOTO (RA I)	251	R\$ 1.061.500,13	7.439,5628

Endereço	Região Administrativa	Qtd. de pontos por tipo de fonte de luz utilizada	Valor (Em R\$)	Valor (Em UC)
PRAÇA DA QUADRA 206, CONJ 6	SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)	4	R\$ 14.551,61	91,3880
PRAÇA DA QUADRA 205, CONJ 7 – RESIDENCIAL OESTE	SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)	8	R\$ 21.587,81	127,6571
ÁREA VERDE 412/414 AO LADO DA ESCOLA	SAMAMBAIA (RA XII)	2	R\$ 1.917,42	5,7294
316 SUL QUADRA DE ESPORTE	PLANO PILOTO (RA I)	5	R\$ 20.589,93	121,0399
SHCES 202	PLANO PILOTO (RA I)	18	R\$ 52.193,00	418,5856
RUA SANTO ANTÔNIO	SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)	11	R\$ 56.181,95	445,6635
PRAÇA DO BELA VISTA	SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)	9	R\$ 36.253,06	297,5482
IGREJA ESTACIONAMENTO DO PARK SUL	GUARÁ (RA X)	68	R\$ 288.178,16	1.695,9100
CAMPO SINTÉTICO 26 DE SETEMBRO	VICENTE PIRES (RA XXX)	24	R\$ 69.231,90	515,2884
CAMPO SINTÉTICO, CAUB 2	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	8	R\$ 34.559,68	296,8074
QUADRA DE ESPORTES DA QD 15 VILA DAS ACÁCIAS	SOBRADINHO II (RA XXVI)	4	R\$ 25.913,20	173,8539
RUAS BURITI SOBRADINHO II	SOBRADINHO II (RA XXVI)	16	R\$ 13.569,70	153,0501
QUADRA 02 ENTRE OS CONJUNTOS C/D	SOBRADINHO (RA V)	26	R\$ 56.236,13	422,1896
TOTAL		454	R\$ 1.752.463,68	12.204,2739

Fonte: Diretoria de Planejamento e Engenharia

No mês de julho foram elaborados 14 projetos de expansão com previsão de instalação de 454 novos pontos de iluminação.

2.4.6.2. Obras

No mês de julho, houve a conclusão de cinco orçamentos *as built* de obra.

Tabela 2: Quantidade de Pontos de Iluminação por Obra no Mês.

Endereço	Região Administrativa	Qtd. de pontos por tipo de fonte de luz utilizada	Valor (Em R\$)	Valor (Em UC)
AR 13 EM FRENTE AO PEC PRÓXIMO AO RESTAURANTE COMUNITÁRIO	SOBRADINHO II (RA XXVI)	15	R\$ 51.360,36	368,1038
EQNM 21/23 – CAMPO DE FUTEBOL / PEC	CEILÂNDIA (RA IX)	20	R\$ 80.857,52	495,3067
CAMPO SINTÉTICO QC 03, CONJUNTO 04	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	12	R\$ 62.690,52	511,8468
CAMPO SINTÉTICO, CAUB 2	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	8	R\$ 34.559,68	296,8074
ÁREA VERDE, QN 22, CONJUNTOS 03 E 04	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	8	R\$ 17.835,92	153,0501
TOTAL		63	R\$ 247.304,00	1.825,1148

Fonte: Diretoria de Planejamento e Engenharia

No mês de julho foram concluídas 5 (cinco) obras de implantação de expansão, com a instalação de 63 novos pontos de iluminação.


2.1.7. Modernização

Considerando o cumprimento das trocas de luminárias convencionais para luminárias

LED, referentes ao Ano 3 do Marco I - conclusão do marco conforme premissas do Plano de Modernização e Eficientização (PME)-, constante do Anexo I – Caderno de Encargos do Contrato de Concessão, informamos a instalação de 188.263 luminárias LED em substituição à 189.116 luminárias convencionais, no período compreendido entre abril/2024 e julho/2026.

Para fins de compilação e conferência dos dados apresentados, foi realizando o somatório dos quantitativos utilizando como base o cadastro atualizado dos pontos e luminárias do parque de IP, os dados demonstrados no gráfico abaixo foram aglutinados por trimestre para melhor compreensão.

Gráfico 6: Relatório Acumulado de Modernização

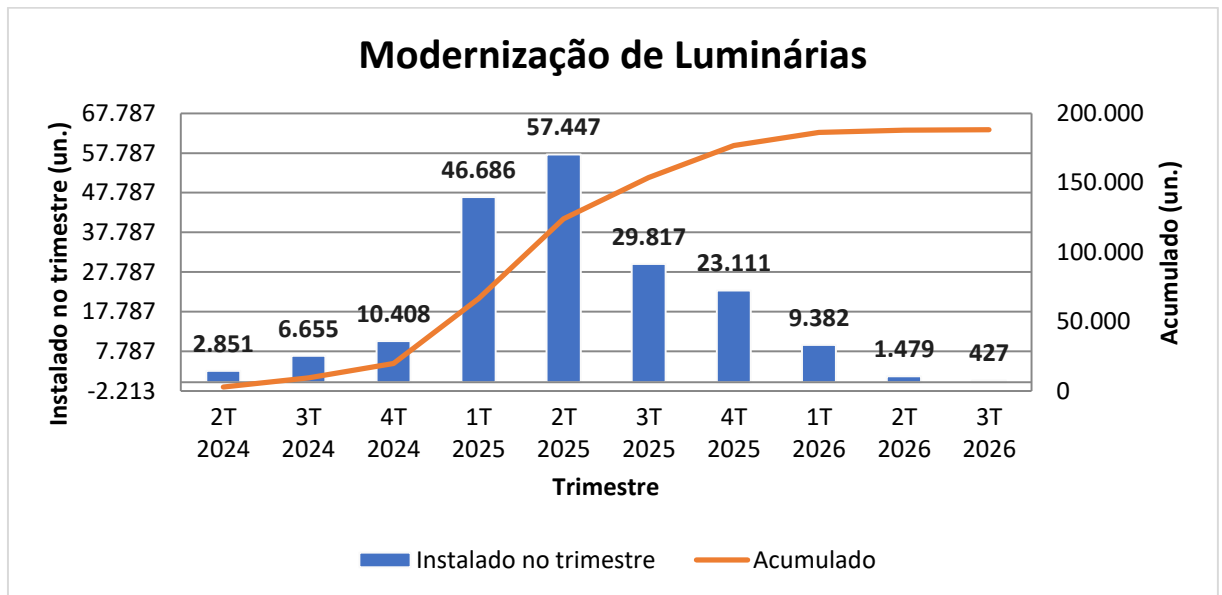

Considerando a conclusão da etapa citada iniciaremos o acompanhamento, neste relatório mensal, da Substituição de Quadros de Comando, item previsto nos Serviços Acessórios do PME.

“A CONCESSIONÁRIA deve realizar a troca de todos os quadros de comando dos circuitos de iluminação pública utilizados no Distrito Federal em estado avançado de degradação, usando tecnologias obsoletas como proteção por fusíveis e que possuam grau de proteção inferior a IP66 devera o ser trocados por quadros novos com proteção por disjuntores e grau de proteção IP66.”

Segue, abaixo, a distribuição mensal dos 540 quadros modernizados até o mês de julho de 2026.

Tabela 3: Atualização da Modernização dos quadros de Comando

Mês	IP-1	IP-2	IP-3	Total/Mês
-----	------	------	------	-----------

dez/25	0	2	0	2
jan/26	18	20	0	38
fev/26	59	122	3	184
jun/26	71	94	0	165
jul/26	53	98	0	151
Total/Tipo	201	336	3	540

2.1.8. Resumo do Parque de Iluminação Pública por tipo e potência no mês

Segue, abaixo, o resumo do parque de IP por tipo e potência no mês, cadastrado no SCG, em 07 de julho de 2026, data-base do faturamento do consumo de energia elétrica do Parque de Iluminação Pública:

Tabela 3: Resumo do parque de IP por tipo e potência no mês

Tipo Lâmpada	POT. UNIT. (W)	PERDA REATOR (W)	POT. UNIT. TOTAL (W)	Quant. Final	POT. TOTAL (W)
VS 70	70	14	84	9	756
VS 400	400	38	438	24	10.512
VS 250	250	30	280	20	5.600
VS 150	150	22	172	36	6.192
VS 100	100	17	117	9	1.053
MVM 70	70	14	84	1	84
MVM 400	400	29	429	52	22.308
MVM 250	250	23	273	39	10.647
MVM 2000	2.000	100	2.100	52	109.200
MVM 150	150	22	172	420	72.240
MVM 1000	1.000	50	1.050	2	2.100
LED 80	80	-	80	2.346	187.680
LED 76	76	-	76	67	5.092
LED 72	72	-	72	11.283	812.376
LED 70	70	-	70	71.216	4.985.120
LED 68	68	-	68	1.203	81.804
LED 600	600	-	600	817	490.200
LED 60	60	-	60	269	16.140
LED 55	55	-	55	428	23.540
LED 54	54	-	54	1.323	71.442
LED 52	52	-	52	1	52
LED 50	50	-	50	84	4.200
LED 480	480	-	480	29	13.920
LED 45	45	-	45	517	23.265
LED 400	400	-	400	84	33.600
LED 40	40	-	40	19.806	792.240

LED 36	36	-	36	257	9.252
LED 314	314	-	314	1.060	332.840
LED 305	305	-	305	570	173.850
LED 303	303	-	303	17	5.151
LED 280	280	-	280	86	24.080
LED 271	271	-	271	2	542
LED 267	267	-	267	226	60.342
LED 254	254	-	254	3	762
LED 250	250	-	250	4	1.000
LED 248	248	-	248	9	2.232
LED 245	245	-	245	11.007	2.696.715
LED 244	244	-	244	6.123	1.494.012
LED 241	241	-	241	9.131	2.200.571
LED 240	240	-	240	44.913	10.779.120
LED 220	220	-	220	58	12.760
LED 215	215	-	215	22.096	4.750.640
LED 214	214	-	214	2	428
LED 205	205	-	205	20	4.100
LED 202	202	-	202	64	12.928
LED 201	201	-	201	144	28.944
LED 200	200	-	200	183	36.600
LED 180	180	-	180	117	21.060
LED 18	18	-	18	656	11.808
LED 163	163	-	163	8	1.304
LED 161	161	-	161	4	644
LED 160	160	-	160	1.795	287.200
LED 153	153	-	153	1	153
LED 150	150	-	150	32.464	4.869.600
LED 120	120	-	120	76.051	9.126.120
LED 115	115	-	115	273	31.395
LED 111	111	-	111	40	4.440
LED 110	110	-	110	12.727	1.399.970
LED 100	100	-	100	2.104	210.400
Total				332.352	46.372.326

2.1.9. Receitas Acessórias

São receitas obtidas por meio de atividades relacionadas ao objeto do Contrato de Concessão.

No mês de Julho/26 não houve a celebração de Contrato de Receita Acessória.

3. INDICADORES DE DESEMPENHO

O Contrato de Concessão pressupõe a prestação de serviço adequado aos usuários, sendo considerado serviço adequado aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade da contraprestação.

Diante disso, o Contrato de Concessão possui como Anexo IV – Indicadores de Desempenho, um documento que tem por objetivo estabelecer os parâmetros de qualidade e desempenho dos serviços a serem atendidos pela CEB IPES.

Esses parâmetros de qualidade e desempenho serão aferidos através da avaliação de um conjunto de “Indicadores de Desempenho”, que compõem o “Sistema de Mensuração de Desempenho – SMD”.

A avaliação será realizada por meio do cálculo do Índice de Desempenho Geral – IDG, composto por 05 (cinco) critérios de desempenho específicos, sendo:

- Critério de Disponibilidade (CD) – avalia a disponibilidade da iluminação pública;
- Critério de Qualidade (CQ) – avalia a qualidade dos serviços prestados e os níveis de iluminação;
- Critério de Operação (CO) – avalia a disponibilidade da infraestrutura e a prestação dos serviços, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos para a sua execução;
- Critério de Conformidade (CC) – avalia o atendimento aos prazos e requisitos exigidos para a apresentação de certificados e relatórios; e,
- Critério de Eficientização (CE) – avalia os níveis de eficiência energética atingidos pela CEB IPES.

3.1. Apuração dos Indicadores

3.1.1 Indicador de Pontos Acesos à Noite – IPAN

Compõe o Critério de Disponibilidade (CD), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade de Luz (IDL)”.

Visa apurar se os pontos de iluminação pública estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente acesos durante a noite.

Mensuração:

Neste período de julho de 2026 não houve apuração do IPAN, conforme demonstrado na Figura 2.

exati Critério de Disponibilidade Resumido - CD (IDL e IPAN)

01/01/2026 31/03/2026 Empresa Usuária

Item	Valor	Porcentagem
Total de pontos avaliados	0	100.00%
Total de pontos conformes	0	100.00%
Total de pontos não conformes	0	0.00%
IPAN calculado = (Total de pontos conformes / Total de pontos avaliados)	100.00%	
Nota IPAN	1.00	
Nota IDL = (Peso IPAN (1.0) x Nota IPAN)	1.00	
Nota CD = (100% x Nota IDL)	1.00	

Filtrar resultados

Linhas por página: 15 1 de 10

(Extraído do Exati em 03/08/2026)

A Figura 2 corresponde aos resultados apurados no Sistema Exati. Como pode-se notar foi implementado no sistema Exati a segregação das avaliações, por empresa usuária, podendo assim separar os levantamentos de campo realizados pelo Verificador Independente (OPUS 1) e da Concessionária (CEB IPES).

3.1.2 Indicador Iluminância e Uniformidade – IIL

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)”.

Visa apurar se um ponto de iluminação pública modernizado verificado atende ao nível de Iluminância e Uniformidade para as classes de iluminação das vias de veículos e pedestres.

Mensuração:

No mês de julho/26 foram realizadas avaliações técnicas pela equipe da CEB IPES para mensuração de iluminância e cálculo da uniformidade, resultando nos dados da Figura 3. As avaliações detalhadas constam no sistema EXATI.

Figura 3 – IIL Resumido – Sistema Exati

Indicador de Iluminância e Uniformidade - Resumido (IIL)

01/01/2026 31/07/2026 Empresa Usuária: OPUS 1

Item	Valor	Porcentagem
Total de pontos avaliados	146	100.00%
Total de pontos conformes	143	98.00%
Total de pontos não conformes	3	2.00%
IIL calculado = (Total de pontos conformes / Total de pontos avaliados)	98.00%	
IIL	1.00	

Filtrar resultados

Linhas por página: 15 1 de 6

(Extraído do Exati em 03/08/2026)

Esse índice ainda não é passível de sanção, a CEB IPES e o Verificador Independente já iniciaram a aferição deste indicador para acompanhamento da evolução. Neste mês tivemos uma melhora no percentual de pontos conformes em comparação com o mês anterior. Como pode-se notar foi implementado no sistema Exati a segregação das avaliações, por empresa usuária, podendo assim separar os levantamentos de campo realizados pelo Verificador Independente (OPUS 1) e da Concessionária (CEB IPES).

3.1.3 Indicador de Temperatura de Cor – ITC

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)”.

Visa apurar se um ponto de iluminação pública modernizado verificado atende ao nível de Temperatura de Cor.

Mensuração:

No mês de julho/26 não foram realizadas avaliações técnicas pela equipe da CEB IPES para mensuração de temperatura de cor, resultando nos dados da Figura 4 do sistema EXATI.

Figura 4 – ITC Resumido – Sistema Exati



Item	Valor	Percentagem
Total de pontos avaliados	0	100.00%
Total de pontos conformes	0	100.00%
Total de pontos não conformes	0	0.00%
ITC calculado = (Total de pontos conformes / Total de pontos avaliados)	100.00%	
ITC	1.00	

(Extraído do Exati em 03/08/2026)

Esse índice ainda não é passível de sanção. Como pode-se notar foi implementado no sistema Exati a segregação das avaliações, por empresa usuária, podendo assim separar os levantamentos de campo realizados pelo Verificador Independente (OPUS 1) e da Concessionária (CEB IPES).

3.1.4 Indicador de Reprodução de Cor – IRC

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)”.

Visa apurar se um ponto de iluminação pública modernizado verificado atende ao nível de índice de Reprodução de Cor.

Mensuração:

No mês de julho/26 não foram realizadas avaliações técnicas pela equipe da CEB IPES para mensuração de reprodução de cor em todos os lotes, resultando nos dados da Figura 5 do sistema EXATI.

Figura 5 – IRC Resumido – Sistema Exati



Item	Valor	Percentagem
Total de pontos avaliados	0	100.00%
Total de pontos conformes	0	100.00%
Total de pontos não conformes	0	0.00%
IRC calculado = (Total de pontos conformes / Total de pontos avaliados)	100.00%	
IRC	1.00	

(Extraído do Exati em 03/08/2026)

Esse índice ainda não é passível de sanção. Como pode-se notar foi implementado no sistema Exati a segregação das avaliações, por empresa usuária, podendo assim separar os levantamentos de campo realizados pelo Verificador Independente (OPUS 1) e da Concessionária (CEB IPES).

3.1.5 Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização - ICL

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho

“Índice de Qualidade de Dados (IQD)”.

Visa apurar a conformidade da caracterização da localização (logradouro, bairro, número do ponto de iluminação pública e posição georreferenciada), através do comparativo entre os dados do cadastro da rede distrital de iluminação pública e a informação verificada *in loco*.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo obrigatoriedade da aferição mensal. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliado somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.6 Indicador da Conformidade da Potência Total - ICP

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Qualidade de Dados (IQD)”.

Visa apurar a conformidade da potência total do ponto de iluminação pública, através do comparativo entre os dados do cadastro da rede distrital de iluminação pública e a informação verificada *in loco*.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo obrigatoriedade da aferição mensal. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliado somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.7 Indicador da Conformidade das Demais Informações do Cadastro - ICIC

Compõe o Critério de Qualidade (CQ), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Qualidade de Dados (IQD)”.

Visa apurar a conformidade de algumas informações (caracterização, modelo da luminária, tecnologia da lâmpada, tipo de poste, altura de instalação da luminária, tipo de braço, quantidade de pontos, tipo de rede) do cadastro dos pontos de iluminação pública, através do comparativo entre os dados do cadastro da rede distrital de iluminação pública e a informação verificada *in loco*.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Nesse ponto cabe ressaltar que a CEBIPES efetua medição deste indicador a título de monitoramento próprio, não havendo obrigatoriedade da aferição mensal. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliado somente após a conclusão do 1º marco

do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.8 Indicador de Pontos Apagados Durante o dia - IPAD

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Acendimento Diurno (IAD)”.

Visa apurar se o ponto de iluminação pública está efetivamente apagado durante o dia, conforme verificação *in loco* ou pela telegestão.

Mensuração:

Neste período de julho de 2026 não houve apuração do IPAD, conforme demonstrado na Figura 6.

Figura 6 – IPAD Resumido – Sistema Exati



Índice de Acendimento Diurno - IAD/IPAD Resumido		
	Valor	Porcentagem
Total de pontos avaliados	0	100.00%
Total de pontos conformes	0	100.00%
Total de pontos não conformes	0	0.00%
IPAD calculado = (Total de pontos conformes / Total de pontos avaliados)	100.00%	
Nota IPAD	1.00	
Nota IAD = (Peso IPAD (1.0) x Nota IPAD)	1.00	

(Extraído do Exati em 03/08/2026)

A Figura 6 corresponde ao indicador emitido no Sistema Exati. Como pode-se notar foi implementado no sistema Exati a segregação das avaliações, por empresa usuária, podendo assim separar os levantamentos de campo realizados pelo Verificador Independente (OPUS 1) e da Concessionária (CEB IPES).

3.1.9 Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados - IDSGC

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC)”.

Visa apurar se a central de atendimento operada pela CEB IPES está disponível de forma ininterrupta para o recebimento de chamados.

Mensuração:

O indicador de disponibilidade do sistema de gestão de chamados (*call center*) emitido no sistema EXATI foi de 100%.

Figura 7 – IDSGC – Sistema Exati



Nome	Valor	Tempo em minutos
Tempo total previsto para o período	368.00 h	6.6660 min
Tempo total de disponibilidade do sistema	368.77 h	6.6660 min
Tempo total de indisponibilidade do sistema	1.23 h	38 min
IDSGC calculado = (Tempo total de disponibilidade do sistema / Tempo total previsto para o período)	100.00%	
IDSGC	1.00	

(Extraído do Exati em 03/08/2026)

3.1.10 Indicador de Cumprimento do Tempo de Espera - ITM

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC)”.

Visa apurar o tempo de espera das chamadas a partir da entrada da chamada até a transferência para o atendente, tendo o prazo máximo como 60 segundos.

Mensuração:

O indicador de cumprimento do tempo de espera (*call center*) calculado em função dos dados do sistema EXATI foi de 100%, sendo que das 2.591 chamadas registradas no citado sistema, 2.582 foram atendidas antes de 60 segundos.

Figura 8 – ITM – Sistema Exati



Nome	Valor
Total de chamadas atendidas dentro do tempo de espera (Até 60s)	2582
Total de chamadas atendidas via call center	2591
ITM calculado = (Total de chamadas atendidas dentro do tempo de espera (Até 60s) / Total de chamadas atendidas via call center)	100.00%
ITM	1.00

(Extraído do Exati em 03/08/2026)

3.1.11 Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão - IDST

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT)”.

Visa apurar se o sistema de telegestão (número de pontos de iluminação telegerencíveis) implantado pela CEB IPES, bem como suas funcionalidades básicas estão disponíveis de forma ininterrupta.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliados somente após a conclusão do 1º

marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

3.1.12 Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão - IDFST

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT)”.

Visa apurar se o sistema de telegestão (número de pontos de iluminação telegerencíveis) implantado pela CEB IPES, bem como suas funcionalidades básicas estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento. Devem ser observadas, minimamente, as seguintes funcionalidades: conformidade entre a localização geográfica e a verificada *in loco*, conformidade entre o *status* dos dispositivos, registro atualizado do consumo de energia e operação remota via sistema de telegestão.

Mensuração:

Não houve mensuração no período abrangido por esse relatório. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliados somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.


3.1.13 Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - IPOM

Compõe o Critério de Operação (CO), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Cumprimento dos Prazos (ICP)”.

Visa apurar se os prazos para solução dos chamados de manutenção corretiva estão sendo cumpridos pela CEB IPES.

Mensuração:

Figura 9 – IPOM – Sistema Exati

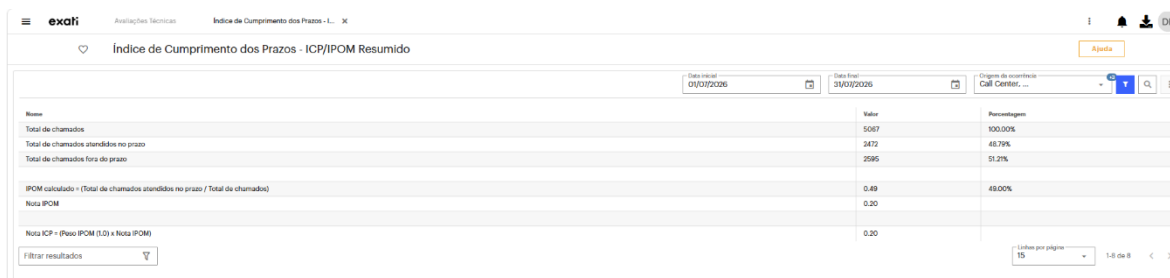

Metric	Value	Percentage
Total de chamados	5067	100.00%
Total de chamados atendidos no prazo	3472	48.79%
Total de chamados fora de prazo	2595	51.21%
IPOM calculado = (Total de chamados atendidos no prazo / Total de chamados)	0.69	49.00%
Nota IPOM	0.20	
Nota ICP = (Peso IPOM (1.0) x Nota IPOM)	0.20	

(Extraído do Exati em 03/08/2026)

Neste mês, observamos considerável melhora em relação ao calculado no mês anterior.

3.1.14 Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais – ICDM

Compõe o Critério de Conformidade (CC), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Conformidade dos Certificados (ICC)”.

Visa apurar a conformidade do tratamento e descarte dos materiais, sendo avaliado através da apresentação de certificado válido e expedido por empresa credenciada e autorizada, de descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes retirados da rede de iluminação pública.

Mensuração:

Figura 10 – ICDM e ICC – Sistema Exati

exati

Detalhes do Construtor

Indicador ICDM e ICC

<

Os atuais contratos estabelecem que a gestão e o descarte dos materiais poluentes são de responsabilidade das Contratadas, conforme abaixo:

- Contrato de Obras: Engeluz Iluminação e Eletricidade;
- Contratos de Manutenção: Engeluz Iluminação e Eletricidade, Diamante Engenharia, RH Engenharia e Real Energy.
- Contrato de Reposição: Diamante Engenharia;
- Contratos de Modernização: Dan Engenharia e RH Engenharia.

A CEB IPES faz o acompanhamento dos quantitativos retirados do parque de iluminação pública, a fiscalização do acondicionamento nas instalações das Contratadas e a certificação do correto descarte. As Contratadas acondicionam os materiais poluentes em caixas apropriadas, conforme o estado de conservação do resíduo, até serem entregues à empresa credenciada

3.1.15 Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços – ICRES

Compõe o Critério de Conformidade (CC), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Conformidade das Informações (ICI)”.

Visa apurar se o Relatório de Execução dos Serviços está sendo entregue dentro do prazo e seguindo as exigências do Anexo I – Caderno de Encargos.

Mensuração:

Figura 11 – ICRES – Sistema Exati



Conforme demonstrado na “Figura 11 – ICRES – Sistema Exati”, do total de relatórios entregues no período, 100% foi considerado como “conforme”, resultando assim em uma “Nota ICRES” igual a “1”, de acordo com os critérios definidos no item 6.3.1 do Anexo IV – Indicadores de Desempenho.

3.1.16 Indicador da Transparência da Concessão – ITC

Compõe o Critério de Conformidade (CC), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “índice de Conformidade das Informações (ICI)”.

Visa apurar se o processo de transparência da Concessão foi realizado conforme detalhamento previsto no item 3.21 do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, o qual prevê que, a CEB IPES deve divulgar, minimamente, os seguintes documentos: relatório trimestral de desempenho, ofícios de aprovação emitidos pelo Poder Concedente, Contrato de Concessão e Termos Aditivos, Contratos de atividades relacionadas e demonstrações financeiras.

Mensuração:

Figura 12 – ITC – Sistema Exati



Conforme demonstrado na “Figura 12 – ITC – Sistema Exati”, o processo de transparência da Concessão foi devidamente cumprido, resultando assim em uma “Nota ITC” igual a “1”, de acordo com os critérios definidos no item 6.3.2 do Anexo IV – Indicadores de Desempenho.

3.1.17 Indicador de Eficientização - IE

Compõe o Critério de Eficientização (CE), sendo formado pelo Indicador de Desempenho “Índice de Eficientização (IE)”.

Visa apurar o cumprimento dos níveis mínimos de eficientização, conforme os Marcos da Concessão definidos no Anexo I – Caderno de Encargos.

Mensuração:

Não há mensuração no período de execução. Indicador não passível de aferição nesta etapa contratual, sendo avaliados somente após a conclusão do 1º marco do Contrato e aprovação do cadastro base.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório Mensal de Serviços é uma obrigação do Contrato de Concessão. Este documento refere-se ao mês de julho de 2026, mas possuindo alguns dados de meses anteriores.

Cumpre salientar que as luminárias de LED para manutenção e eficientização estão sendo entregues por lote, passando por ensaios de recebimento junto a laboratório credenciado antes da aplicação no parque de iluminação pública.

Por fim, junto a este Relatório, enviamos uma planilha em Excel com os dados completos dos protocolos abertos durante o mês, em atendimento ao item 4.1.5 do Caderno de Encargos da Concessionária.

Relatório Mensal de Execução de Serviços de Iluminação Pública

Tabela 8: Quantidade Diária dos Protocolos por Reclamação (item 7.4.9 - b) no Mês de julho de 2026, canais utilizados pelo cidadão.

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Quantidade diária dos protocolos por reclamação

Mês de Referência: **Julho/2026**

Dia	05 ou mais pontos acesos de dia em seqüência	05 ou mais pontos apagados de noite em seqüência	Choque Elétrico	Fiação danificada	Fiação exposta	Luminária Acesa Durante o Dia	Luminária Apagada Durante a Noite	Luminária com baixa intensidade	Luminária Furtada/Vandalizada	Luminária Oscilando	Poste Caído	Poste torto ou danificado	Remoção de poste de iluminação pública	Reposição Cabo Preventivo	Totais
1	3	48	3			2	169	3	2	2		3		3	238
2	1	42	6			3	216		2	6		1			277
3	2	63		1		2	99		1	3			1	1	173
4	2	30	9		1		94		1	2		1			140
5		25	1		1	1	59		2					2	91
6		39	2		2	3	131	1	1	4	1	3			187
7	3	47	2				84	1		7		1		1	146
8		81			1		100	12	1	4	3	2			204
9	3	49	3		1	1	134	9	1	3	2				206
10	1	39	1			1	117	1		3		3			166
11		25	2		1	3	55			1		1			88
12		22			2	1	26		1			1			53
13	1	76	2		1		93	2	2	5		1		1	184
14	2	37	1			7	124			6		1		1	179
15		70	4			1	112	1		6				3	197
16	1	55					79	4	5	1		1			146
17	1	38			1	1	90			3		1			135
18	3	14	1				46	5	1	4	2				76
19	1	33			1		49	7		3					94
20	1	53	4		1	2	94		2	9	1	1		1	169
21	5	46	4		1	6	145	4	2	6	1	1		1	222
22	5	43	1		1	2	90	1		3				1	147
23	4	43	1			2	106	4		6		4		1	171
24	1	30	1		3		124	5	1	2		2		1	170
25		25				2	93	2		4	1	1		1	129
26		26	1				86			2				1	116
27	3	45	2		1	5	131	2	2	7		1			199
28	2	42	1		1	1	224	1	2	5				2	281
29		44	12		2	4	170	10		1		2			245
30	1	36	2		1	1	118	4	4	4	1	5			177
31	1	48	2			3	107		2	3		3		1	170
Total	47	1.314	68	1	23	54	3.365	79	35	115	12	40	1	22	5.176

Tabela 9: Material Utilizado (item 7.4.9 – g) no mês de julho de 2026

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Materiais Utilizados

Mês de Referência: **julho/2026**

#	Descrição sucinta	Quantidade	Unidade
1	Luminária LED	1.315	unidade
2	Luminária LED e relé fotocontrolador	1.274	unidade
3	Relé fotocontrolador	1.090	unidade
4	Conector Perfurante- Subterrâneo Cdp 150-35	827	unidade
5	Conector de Derivação Perfurante	613	unidade
6	Cabo de cobre isolado 2x4 mm ²	536	metro
7	Cabo de cobre isolado 4x10 mm ²	107	metro
8	Cabo de cobre isolado 4x4 mm ²	82	metro
9	Cabo de cobre isolado 10mm ²	63	metro
10	Cabo de cobre isolado 4x16 mm ²	58	metro
11	Eletroduto corrugado DN 63	41	metro
12	Quadro de comando QIOT ou QIPA	35	unidade
13	Eletroduto Rígido DN 25	34	metro
14	Cabo multiplexado de alumínio trifásico e neutro 16mm ²	28	metro
15	Cabo de cobre isolado 16mm ²	25	metro
16	Cabo multiplexado de alumínio trifásico e neutro 10mm ²	23	metro
17	Conector grampo metálico - 3/4 - 50mm ²	23	unidade
18	Haste de aterramento em aço 3m	21	unidade
19	Cordoalha de aço 5,10mm	20	unidade
20	Braço longo para Luminária 3,595m	16	unidade
21	Cabo de cobre isolado 4x25 mm ²	5	metro
22	Cabo de cobre isolado 35 mm ²	4	metro
23	Cabo multiplexado de alumínio trifásico e neutro 25mm ²	2	metro
24	Cabo de cobre isolado 25mm ²	1	metro
25	Cabo de cobre isolado 35mm ²	1	metro

1. Introdução

Trata-se de relatório do BANCO DE CRÉDITO do mês acima referenciado.

Conforme o que determina o CONTRATO DE CONCESSÃO de Iluminação Pública do Distrito Federal, no seu Anexo I - Caderno de Encargos, o BANCO DE CRÉDITO é o saldo de créditos disponível para serem utilizados nas seguintes atividades: "novos pontos luminosos em decorrência do crescimento vegetativo, remanejamento de pontos de iluminação, com ou sem reaproveitamentos de postes, trocas e manutenção dos pontos luminosos em decorrência do crescimento vegetativo e trocas e manutenção devido a vandalismo".

Na DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO, em 25/03/2024, foram adicionados ao BANCO DE CRÉDITO o montante de **26.272 UNIDADES DE CRÉDITO** (UC), sendo 16.871 UC para uso em projetos de expansão e 9.402 UC para uso em correção de vandalis, remanejamento de rede de IP e reposição de ativo. A cada data de aniversário do CONTRATO, serão adicionados um determinado número de unidades de créditos ao BANCO DE CRÉDITO, determinado no Contrato de Concessão e calculados a partir das estimativas de crescimento vegetativo e vandalismo no Parque de IP do DF.

O item 11.1.3 do Caderno de Encargos, Anexo I do Contrato de Concessão, determina que "os serviços de expansão e remanejamento do parque de iluminação pública, bem como das correções dos danos provocados por vandalismo, serão medidos para uso do saldo do BANCO DE CRÉDITOS. As medições serão realizadas utilizando-se da Planilha de Preços Unitários da Tabela 37. Os preços unitários da planilha são determinados em UNIDADE DE CRÉDITO".

Em 31/07/2024, os técnicos da CEB IPES e da SODF emitiram uma Nota Técnica Conjunta (SEI/GDF 147367449) intitulada "Procedimento de Uso do Banco de Crédito - Contingenciamento de serviços e materiais faltantes" onde recomendam a "manutenção da execução dos serviços cobertos pelo BANCO DE CRÉDITO com realização de contingenciamento dos custos dos serviços e materiais faltantes da Tabela 37, bem como dos serviços com distorção considerável de valor, para fins de futuro ressarcimento".

Em 29/05/2025 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão (ID SEI 172102180) alterando a Tabela 37 do Caderno de Encargos, com inclusão de novos serviços e materiais no Banco de Créditos, conforme ANEXO D do referido Aditivo. Em 14/11/2025, foi assinado o Termo de Reratificação do Primeiro Aditivo (ID SEI 184008639) com os valores corrigidos das unidades de crédito dos serviços constantes da Tabela 37.

Assim, o presente relatório apresenta a Memória de Cálculo do saldo do BANCO DE CRÉDITO no mês de referência, **considerando a Tabela 37 atualizada** conforme parágrafo acima, as listas de eventos de uso dos créditos.

2. Uso do Banco de Crédito no mês de jul/2026

Os quadros a seguir apresentam a posição do Banco de Crédito no mês de referência, evidenciando o consumo de Unidades de Crédito (UC), o saldo disponível ao final do período e a correspondente necessidade de recomposição financeira. Os valores são apurados com base nos serviços executados no mês, conforme a Tabela 37 do Caderno de Encargos (Anexo I do Contrato de Concessão), e refletem a situação do Banco de Crédito até a data de encerramento da competência.

2.1. Situação do Banco de Crédito no mês

No mês de jul/2026, foram consumidas 7.239,0959 UC do Banco de Créditos Ordinários, correspondentes às atividades de Projetos de Expansão, Vandalismo, Remanejamento e Reposição executadas no período.

Em decorrência do consumo dos créditos, foi apurada necessidade de recomposição financeira de R\$ 1.986.655,55 conforme memória de cálculo apresentada neste relatório.

O saldo acumulado do Banco de Créditos ao final do mês é NEGATIVO, correspondendo a 5.880,4628 UC. Esse saldo representa uma necessidade acumulada de recomposição financeira de R\$ 1.986.655,55, razão pela qual se faz necessária a recomposição financeira pelo Poder Concedente, conforme previsto no Contrato de Concessão.

Indicador	Expansão	Van./Rem./Rep.	Total
Saldo anterior	7.734,2625 UC	(6.375,6294 UC)	1.358,6331 UC
Consumo do mês	1.825,1148 UC	5.413,9811 UC	7.239,0959 UC
Recomposição recebida no mês	0,0000 UC	0,0000 UC	0,0000 UC
Saldo ao final do mês			(5.880,4628 UC)

2.2 Controle das Recomposições Financeiras

O controle das recomposições financeiras é realizado por competência mensal, considerando o ciclo anual do Banco de Crédito estabelecido no Contrato de Concessão, compreendido entre os meses de abril de um ano e março do ano subsequente. A tabela a seguir apresenta o histórico das recomposições financeiras apuradas no ciclo vigente, indicando o processo administrativo correspondente, a situação de cada competência e o respectivo saldo pendente, permitindo o acompanhamento da tramitação até a efetiva recomposição financeira pelo Poder Concedente.

Competência	Valor de Recomposição Apurado	Processo SEI	Situação	Saldo Pendente
abr/26	R\$ 0,00	04028-00000544/2026-15	Sem déficit	R\$ 0,00
mai/26	R\$ 0,00	04028-00000646/2026-22	Sem déficit	R\$ 0,00
jun/26	R\$ 0,00	04028-00000760/2026-52	Sem déficit	R\$ 0,00
jul/26	R\$ 1.986.655,55	04028-00000891/2026-30	Em tramitação	R\$ 1.986.655,55
ago/26				
set/26				
out/26				
nov/26				
dez/26				
jan/27				
fev/27				
mar/27				
Total Pago	R\$ 0,00		Total Pendente	R\$ 1.986.655,55

3. Quadro de Serviços com Uso do Banco de Crédito em jul/2026


Os serviços executados no mês que geraram utilização do Banco de Crédito estão resumidos na tabela abaixo. O detalhamento de cada evento encontra-se nos Anexos II e III.

Anexo	Evento	Qt Serviços	Qt Luminárias	UC Ordinárias
Anexo II - EXPANSÃO - Lista de Obras Concluídas no Mês		5 Projetos	63 Lumin	1.825,1148 UC
Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês		45 Serviços	N/A	5.413,9811 UC

4. Fluxo de Processos

O fluxo abaixo apresenta as etapas para apuração, validação e contabilização das Unidades de Crédito decorrentes da execução dos Projetos de Expansão, desde o recebimento da demanda até o lançamento definitivo no Banco de Crédito.

Fluxo de Atividades para Apuração, Atesto e Débito de Unidades de Crédito



5. Lista de Anexos

Anexo I - Evolução do Banco de Crédito

Anexo II - EXPANSÃO - Lista de Obras Concluídas no Mês

Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês

Emissão:

Wires Santos Amorim

Gerente de Planejamento e Orçamento de Engenharia
CEB IPES

Aprovação:

Mauro Landim

Diretor de Planejamento e Engenharia
CEB IPES

Anexo I - Evolução do Banco de Crédito

A. CREDITOS ORDINÁRIOS ACUMULADOS

	Projetos Expansão	Van/Rem/Rep	Consolidado Geral
Saldo Inicial	17.285,9452 UC	9.401,8466 UC	26.687,7918 UC
Realizado	11.376,7975 UC	21.191,4571 UC	32.568,2546 UC
Saldo Final	5.909,1477 UC	(11.789,6105 UC)	(5.880,4628 UC)

B. CREDITOS ORDINÁRIOS REALIZADOS

BANCO DE CRÉDITO ORDINÁRIO REALIZADO							
BC >>	PROJETOS DE EXPANSÃO		VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO		CONSOLIDADO		
Novos Créditos >>	Novo Crédito	Saldo Anterior	Novo Crédito	Saldo Anterior	Novo Crédito		Saldo Anterior
	17.285,9453 UC	0,0000 UC	9.402,0000 UC	0,0000 UC	26.687,9453 UC	0,0000 UC	0,0000 UC
Mês	Executado	Saldo	Executado	Saldo	Realizado	Recomposto	Saldo
Total >>	11.376,7975 UC	17.285,9452 UC	21.191,4571 UC	9.401,8466 UC	32.568,2546 UC	0,0000 UC	26.687,7918 UC
abr/2026	8.337,4341 UC	8.948,5111 UC	6.451,4361 UC	2.950,4105 UC	14.788,8702 UC		11.898,9216 UC
mai/2026	0,0000 UC	8.948,5111 UC	5.219,6923 UC	(2.269,2818 UC)	5.219,6923 UC		6.679,2293 UC
jun/2026	1.214,2486 UC	7.734,2625 UC	4.106,3476 UC	(6.375,6294 UC)	5.320,5962 UC		1.358,6331 UC
jul/2026	1.825,1148 UC	5.909,1477 UC	5.413,9811 UC	(11.789,6105 UC)	7.239,0959 UC		(5.880,4628 UC)

C. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA

RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA DO CRÉDITO REALIZADO			
Mês	Valor Unitário da UC	UC Excedente	Valor a Recompor (R\$)
Totais >>	Valores Acumulados >>	(5.880,4628 UC)	(R\$ 1.986.655,55)
abr/26	337,84 UC	0,0000 UC	R\$ 0,00
mai/26	337,84 UC	0,0000 UC	R\$ 0,00
jun/26	337,84 UC	0,0000 UC	R\$ 0,00
jul/26	337,84 UC	(5.880,4628 UC)	(R\$ 1.986.655,55)

Relatório do Banco de Crédito de jul/2026

Anexo II - EXPANSÃO - Lista de Obras Concluídas no Mês

Data Solicitação	No do Projeto	No SEI	Título	RA	Qt Luminárias	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)
Quantidade: 5 Projetos			Totais:			63
						1.825,1148
21/06/2024	26CEB001	00138-00004185/2022-71	EQNM 21/23 - CAMPO DE FUTEBOL / PEC	CEILÂNDIA (RA IX)	20	495,3067
25/03/2025	25CEB096	00304-00000416/2025-42	AR 13 EM FRENTE AO PEC PRÓXIMO AO RESTAURANTE COMUNITÁRIO	SOBRADINHO II (RA XXVI)	15	368,1038
-	26CEB060	04028-00000491/2026-24	CAMPO SINTÉTICO QC 03, CONJUNTO 04	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	12	511,8468
-	26CEB964	04028-00000488/2026-19	CAMPO SINTÉTICO, CAUB 2	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	8	296,8074
-	26CEB963	04028-00000490/2026-80	AREA VERDE, QN 22, CONJUNTO 03 E 04	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	8	153,0501

Relatório do Banco de Crédito de jul/2026

Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês

Data Solicitação	No do Orçamento	Endereço	RA	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)
Quantidade: 45 Serviços			Totais:	5.413,9811
01/07/2026	26VRR285	SQS 106 Sul - Em frente ao Centro de Ensino Fundamental 01 - CEF 01 da SQS 106 Sul	PLANO PILOTO (RA I)	8,1533
01/07/2026	26VRR286	Estac. Ginásio do CAVE/Centro de Convivência do Idoso, QE 23, AE do CAVE - PROCESSO SEI 00137-00002552/2026-54	GUARÁ (RA X)	26,8662
01/07/2026	26VRR287	ESTACIONAMENTO DA CODEPLAN E PROCURADORIA DO DF	PLANO PILOTO (RA I)	615,5801
01/07/2026	26VRR288	DF-130 - Paranoá	PARANOÁ (RA VII)	16,8710
01/07/2026	26VRR289	BR 251 ROD. JULIO GARCIA	PARANOÁ (RA VII)	16,8710
01/07/2026	26VRR290	SQS 105, Bloco E - Estacionamento	PLANO PILOTO (RA I)	18,8625
01/07/2026	26VRR291	DF-480, entrada do Gama-Setor Industrial (SCE), sentido Av. Contorno	GAMA (RA II)	205,5216
01/07/2026	26VRR292	Granja do Torto, vias de acesso ao Capital Moto Week e estacionamentos externo.	LAGO NORTE (RA XVIII)	133,1921
01/07/2026	26VRR293	Alça do viaduto da L4, sentido Aeroporto	PLANO PILOTO (RA I)	19,4777
01/07/2026	26VRR294	QNM 11 Hélio Prates, sentido Elmo Serejo	CEILÂNDIA (RA IX)	490,6192
01/07/2026	26VRR295	QNF 32, ao lado do CEF 01	TAGUATINGA (RA III)	9,6889
01/07/2026	26VRR296	QI 29, Canteiro Central, em frente ao Supermercado Maravilha	LAGO SUL (RA XVI)	121,2207
01/07/2026	26VRR297	Parque Estação Biológica (PqEB), atrás do Shopping Boulevard (antigo estacionamento SES-GDF / área Embrapa Agroenergia)	PLANO PILOTO (RA I)	0,0000
01/07/2026	26VRR298	QR 407, Conjunto 9, Lote 15, Samambaia Norte	SAMAMBAIA (RA XII)	16,8710
01/07/2026	26VRR299	EPIA Norte, entrada do Lago Norte	LAGO NORTE (RA XVIII)	50,6130
01/07/2026	26VRR300	DF-130 - Paranoá	PARANOÁ (RA VII)	16,8710
01/07/2026	26VRR301	EPPR DF-005, KM 4 (ponto de referência: Área Verde)	LAGO NORTE (RA XVIII)	16,8710
01/07/2026	26VRR302	EPPR DF-005, KM 4 Norte, Lago Norte (ponto de referência: próximo da parada de ônibus)	LAGO NORTE (RA XVIII)	16,8710
01/07/2026	26VRR303	QNL - Viaduto Samambaia	TAGUATINGA (RA III)	16,8710
01/07/2026	26VRR304	Estrada Parque Contorno (DF-001)	LAGO NORTE (RA XVIII)	16,8710
01/07/2026	26VRR305	DF-180, Condomínio Bela Vista, Ceilândia - DF (Projeto 26CEB953)	CEILÂNDIA (RA IX)	980,7473
01/07/2026	26VRR306	INCRA — Renascidos em Pentecostes	CEILÂNDIA (RA IX)	366,4416
01/07/2026	26VRR307	SQN 306 e 404 (Asa Norte), QN 12E Conj 02 (Riacho Fundo II) e QI 02 Conj D (Guará)	PLANO PILOTO (RA I)	86,7114
01/07/2026	26VRR308	Viaduto da Ponte do Bragueto	PLANO PILOTO (RA I)	243,7863
01/07/2026	26VRR309	SHIN QI 7 – área verde ao lado da pista	LAGO NORTE (RA XVIII)	19,4777
01/07/2026	26VRR310	Quadra 116 lotes 14/15, Avenida Recanto das Emas	RECANTO DAS EMAS (XV)	29,9280
01/07/2026	26VRR311	SQN 312 - Entre os Blocos C e D	PLANO PILOTO (RA I)	18,8625
01/07/2026	26VRR312	SQN – 312 Bloco D, em frente ao Comercio	PLANO PILOTO (RA I)	26,8816
01/07/2026	26VRR313	EPIG, embaixo do Viaduto	SUBURBIO E/OU TOGONAL (RA VIII)	26,8816
01/07/2026	26VRR314	Condomínio Centro Clínico Sul, SHLS 716, Conjunto L, Asa Sul, Brasília DF Próximo as coordenadas -15.825299, -47.928580:	PLANO PILOTO (RA I)	7,0444
01/07/2026	26VRR315	Viaduto da Ponte Honestino Guimarães	PLANO PILOTO (RA I)	719,8292

Relatório do Banco de Crédito de jul/2026

Anexo III - VANDALISMO, REMANEJAMENTO E REPOSIÇÃO - Serviços Realizados no Mês

Data Solicitação	No do Orçamento	Endereço	RA	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)
01/07/2026	26VRR316	Granja do Torto (estacionamento)	LAGO NORTE (RA XVIII)	35,6202
01/07/2026	26VRR317	QN 406 - ESCOLA CLASSE Nº 415	SAMAMBAIA (RA XII)	95,1723
01/07/2026	26VRR318	QR 02 Conjunto G, Lote 78	CANDANGOLÂNDIA (RA XIX)	0,0000
01/07/2026	26VRR319	Canteiro central - DF 463	BOTÂNICO (RA XVIII)	50,6130
01/07/2026	26VRR320	Quadra 3, DF-463 - Canteiro Central, Jardins Mangueiral	BOTÂNICO (RA XVIII)	16,8710
01/07/2026	26VRR321	Praça Central, ao lado do Skate Park	PARANOÁ (RA VII)	26,8662
01/07/2026	26VRR322	Q. 32 Conjunto M	PARANOÁ (RA VII)	26,8662
01/07/2026	26VRR323	SQS 409 - Calçada, Asa Sul	PLANO PILOTO (RA I)	56,9250
01/07/2026	26VRR324	QNM 10 CONJUNTO H	CEILÂNDIA (RA IX)	56,2904
01/07/2026	26VRR325	VIA W-6 (CABO PP CA 10MM2) PISTA CONTORNO DO PARQUE NOROESTE	PLANO PILOTO (RA I)	655,1642
01/07/2026	26VRR326	QUADRA 15 CASA 90 A , SETOR LESTE	GAMA (RA II)	2,8647
01/07/2026	26VRR327	DF 001 PRÓXIMO AO VIADUTO DO RIACHO FUNDO /RECANTO DAS EMAS	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	14,6865
01/07/2026	26VRR328	QNP 30 CONJ J - CENTRO DE ENSINO 10	CEILÂNDIA (RA IX)	14,6865
01/07/2026	26VRR329	VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ / NÚCLEO BANDEIRANTE	GUARÁ (RA X)	0,0000



Orçamento de Expansão com Uso de Unidades de Crédito

Versão 9.3

Projeto N°:

26CEB963

Data:

24/07/2026

Endereço:

Area Verde, QN 22, Conjunto 03 e 04 - Riacho Fundo II

Processo SEI:

04028-00000490/2026-80

Região Adm:

RIACHO FUNDO II (RA XXI)

Modalidade:

sem RDU - NeoEnergia-BsB

Orçamentista:

Lindomar Soares Barbosa (Matr. 7571-0)

Resp. Técnico:

Mauro Landim

Síntese dos Resultados

Quantidade de Luminárias: **8 Lum**
Preço da Unidade de Crédito: **R\$ 337,84 /UC**

Total de Unidades de Crédito: **153,05 UC**
VPL Concessão: **R\$ 51.706,45**

Planilha de Serviços do Banco de Crédito

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	UC / Unidade	Valor em UC	Peso
11	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	un	6,0	4,9976 UC	29,99 UC	19,59%
12	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	un	2,0	9,6889 UC	19,38 UC	12,66%
41	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x4mm², cobre, Classe-2.	m	150,0	0,3238 UC	48,57 UC	31,73%
43	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x16mm², cobre, Classe-2.	m	3,0	0,5093 UC	1,53 UC	1,00%
51	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	m	77,0	0,4514 UC	34,76 UC	22,71%
56	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	un	18,0	0,8877 UC	15,98 UC	10,44%
57	Aterramento - Rede Aérea Exclusiva, PG ou Quadro IP	un	3,0	0,9508 UC	2,85 UC	1,86%

Observação:

1) Os itens e valores correspondem aos aprovados no Termo Aditivo 1º ao Contrato de Concessão (172102180).



Orçamento de Expansão com Uso de Unidades de Crédito

Versão 9.3

Projeto N°:

26CEB964

Data:

24/07/2026

Endereço:

CAMPO SINTÉTICO, CAUB 2 - Riacho Fundo II

Processo SEI:

04028-00000488/2026-19

Região Adm:

RIACHO FUNDO II (RA XXI)

Modalidade:

sem RDU - NeoEnergia-BsB

Orçamentista:

Flavio Garcias Barreto (Matr. 4641-8)

Resp. Técnico:

Mauro Landim

Síntese dos Resultados

Quantidade de Luminárias: **8 Lum**
Preço da Unidade de Crédito: **R\$ 337,84 /UC**

Total de Unidades de Crédito: **296,81 UC**
VPL Concessão: **R\$ 100.273,41**

Planilha de Serviços do Banco de Crédito

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	UC / Unidade	Valor em UC	Peso
11	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	un	4,0	4,9976 UC	19,99 UC	6,74%
12	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	un	4,0	9,6889 UC	38,76 UC	13,06%
41	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x4mm², cobre, Classe 2.	m	440,0	0,3238 UC	142,47 UC	48,00%
51	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	m	125,0	0,4514 UC	56,43 UC	19,01%
56	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	un	20,0	0,8877 UC	17,75 UC	5,98%
57	Aterramento - Rede Aérea Exclusiva, PG ou Quadro IP	un	4,0	0,9508 UC	3,80 UC	1,28%
58	Instalação de Comando - Quadro QIPA 1 ou 2	un	1,0	17,6072 UC	17,61 UC	5,93%

Observação:

1) Os itens e valores correspondem aos aprovados no Termo Aditivo 1º ao Contrato de Concessão (172102180).



Orçamento de Expansão com Uso de Unidades de Crédito

Versão 9.3

Projeto N°:

26CEB060

Data:

24/07/2026

Endereço:

QC 3, CJ 4, CAMPO SINTÉTICO - Riacho Fundo II

Processo SEI:

04028-00000491/2026-24

Região Adm:

RIACHO FUNDO II (RA XXI)

Modalidade:

sem RDU - NeoEnergia-BsB

Orçamentista:

Lindomar Soares Barbosa (Matr. 7571-0)

Resp. Técnico:

Mauro Landim

Síntese dos Resultados

Quantidade de Luminárias: **12 Lum**
Preço da Unidade de Crédito: **R\$ 337,84 /UC**

Total de Unidades de Crédito: **511,85 UC**
VPL Concessão: **R\$ 172.922,32**

Planilha de Serviços do Banco de Crédito

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	UC / Unidade	Valor em UC	Peso
11	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	un	6,0	4,9976 UC	29,99 UC	5,86%
12	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	un	6,0	9,6889 UC	58,13 UC	11,36%
41	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x4mm², cobre, Classe-2.	m	134,0	0,3238 UC	43,39 UC	8,48%
42	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x10mm², cobre, Classe-2.	m	516,0	0,3861 UC	199,23 UC	38,92%
43	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x16mm², cobre, Classe-2.	m	6,0	0,5093 UC	3,06 UC	0,60%
47	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	un	2,0	1,9140 UC	3,83 UC	0,75%
50	Substituição de Comando - Quadro IP	un	1,0	0,4470 UC	0,45 UC	0,09%
51	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	m	255,0	0,4514 UC	115,11 UC	22,49%
56	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	un	20,0	0,8877 UC	17,75 UC	3,47%
57	Aterramento - Rede Aérea Exclusiva, PG ou Quadro IP	un	6,0	0,9508 UC	5,70 UC	1,11%
58	Instalação de Comando - Quadro QIPA 1 ou 2	un	2,0	17,6072 UC	35,21 UC	6,88%

Observação:

1) Os itens e valores correspondem aos aprovados no Termo Aditivo 1º ao Contrato de Concessão (172102180).



Orçamento de Expansão com Uso de Unidades de Crédito

Versão 9.3

Projeto N°:

25CEB096

Data:

24/07/2026

Endereço:

AR 13 EM FRETE AO PEC PROXÍMO AO RESTAURANTE COMUNITÁRIO

Processo SEI:

04028-00000372/2024-18

Região Adm:

SOBRADINHO II (RA XXVI)

Modalidade:

sem RDU - NeoEnergia-BsB

Orçamentista:

Lindomar Soares Barbosa (Matr. 7571-0)

Resp. Técnico:

Mauro Landim

Síntese dos Resultados

Quantidade de Luminárias: 15 Lum
Preço da Unidade de Crédito: R\$ 337,84 /UC

Total de Unidades de Crédito: 368,10 UC
VPL Concessão: R\$ 124.360,19

Planilha de Serviços do Banco de Crédito

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	UC / Unidade	Valor em UC	Peso
3	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V3)	un	8,0	2,1411 UC	17,13 UC	4,65%
8	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V3)	un	7,0	5,8159 UC	40,71 UC	11,06%
41	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x4mm², cobre, Classe-2.	m	246,0	0,3238 UC	79,65 UC	21,64%
42	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x10mm², cobre, Classe-2.	m	59,0	0,3861 UC	22,78 UC	6,19%
43	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x16mm², cobre, Classe-2.	m	3,0	0,5093 UC	1,53 UC	0,42%
47	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	un	3,0	1,9140 UC	5,74 UC	1,56%
51	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	m	188,0	0,4514 UC	84,86 UC	23,05%
56	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	un	103,0	0,8877 UC	91,43 UC	24,84%
57	Aterramento - Rede Aérea Exclusiva, PG ou Quadro IP	un	7,0	0,9508 UC	6,66 UC	1,81%
58	Instalação de Comando - Quadro QJPA 1 ou 2	un	1,0	17,6072 UC	17,61 UC	4,78%

Observação:

1) Os itens e valores correspondem aos aprovados no Termo Aditivo 1º ao Contrato de Concessão (172102180).



Orçamento de Expansão com Uso de Unidades de Crédito

Versão 9.3

Projeto N°:

26CEB001

Data:

24/07/2026

Endereço:

EQNM 21/23 CAMPO SINTÉTICO

Processo SEI:

00138-00004185/2022-71

Região Adm:

CEILÂNDIA (RA IX)

Modalidade:

sem RDU - NeoEnergia-BsB

Orçamentista:

André dos Anjos Luz Júnior (Matr. 5336-8)

Resp. Técnico:

Mauro Landim

Síntese dos Resultados

Quantidade de Luminárias: 20 Lum
Preço da Unidade de Crédito: R\$ 337,84 /UC

Total de Unidades de Crédito: 495,31 UC
VPL Concessão: R\$ 167.334,42

Planilha de Serviços do Banco de Crédito

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	UC / Unidade	Valor em UC	Peso
11	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	un	4,0	4,9976 UC	19,99 UC	4,04%
12	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	un	4,0	9,6889 UC	38,76 UC	7,82%
41	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x4mm², cobre, Classe-2.	m	475,0	0,3238 UC	153,81 UC	31,05%
42	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 4x10mm², cobre, Classe-2.	m	151,0	0,3861 UC	58,30 UC	11,77%
48	Instalação de 1 (um) ponto projetor sem poste	un	12,0	1,7834 UC	21,40 UC	4,32%
50	Substituição de Comando - Quadro IP	un	1,0	0,4470 UC	0,45 UC	0,09%
56	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	un	180,0	0,8877 UC	159,79 UC	32,26%
57	Aterramento - Rede Aérea Exclusiva, PG ou Quadro IP	un	8,0	0,9508 UC	7,61 UC	1,54%
58	Instalação de Comando - Quadro QIPA 1 ou 2	un	2,0	17,6072 UC	35,21 UC	7,11%

Planilha de Serviços Executados com Uso do Banco de Crédito

Data Solicitação	No do Orçamento	Documento de Referência	Endereço	RA	Tipo Serviço	Descrição Serviço	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)	Custo em UC (Tab 37 Aditivo)
01/07/2026	26VRR285	888/2026 - DIAMANTE	SQS 106 Sul - Em frente ao Centro de Ensino Fundamental	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 05m com luminária LED 40W e 08m de KIT cabo	8,1533	R\$ 2.547,66
01/07/2026	26VRR286	839/2026 - DIAMANTE	Estac. Ginásio do CAVE/Centro de Convivência do Idoso, QE	GUARÁ (RA X)	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 pcr16, e reposição de 01 PCR 16m, SUP 04 PET	26,8662	R\$ 8.394,88
01/07/2026	26VRR287	889/2026 - DIAMANTE	ESTACIONAMENTO DA CODEPLAN E PROCURADORIA	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Execução de 289m de MND, 56m de kit cabo 2x4mm² 34m de kit	615,5801	R\$ 192.350,31
01/07/2026	26VRR288	050/2026 - DIAMANTE	DF-130 - Paranoá	PARANOÁ (RA VII)	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 pcr 16m, reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET	16,8710	R\$ 5.271,68
01/07/2026	26VRR289	059/2026 - DIAMANTE	BR 251 ROD. JULIO GARCIA	PARANOÁ (RA VII)	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 pcr 16m, reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET	16,8710	R\$ 5.271,68
01/07/2026	26VRR290	043/2026 - ENGELUZ	SQS 105, Bloco E - Estacionamento	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Instalado 01 poste de aço de 7,5m com luminária LED 150W e	18,8625	R\$ 5.893,97
01/07/2026	26VRR291	891/2026 - DIAMANTE	DF-480, entrada do Gama-Setor Industrial (SCE), sentido	GAMA (RA II)	REPOSIÇÃO	Reposição de 07 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W	205,5216	R\$ 64.219,33
01/07/2026	26VRR292	892/2026 - DIAMANTE	Granja do Torto, vias de acesso ao Capital Moto Week e	LAGO NORTE (RA XVIII)	REPOSIÇÃO	Substituição de 05 PCR 16m, reposição de 04 PAS 7,5m LED 120W	133,1921	R\$ 41.618,54
01/07/2026	26VRR293	893/2026 - DIAMANTE	Alça do viaduto da L4, sentido Aeroporto	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Substituído 01 PAS de 10m, 13m kit cabo 2x4mm²	19,4777	R\$ 6.086,20
01/07/2026	26VRR294	894/2026 - DIAMANTE	QNM 11 Hélio Prates, sentido Elmo Serejo	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	Reposição de 19 BP, com luminárias LED 150W 133m de KIT	490,6192	R\$ 153.303,78
01/07/2026	26VRR295	895/2026 - DIAMANTE	QNF 32, ao lado do CEF 01	TAGUATINGA (RA III)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, risco de queda.	9,6889	R\$ 3.027,49
01/07/2026	26VRR296	896/2026 - DIAMANTE	QI 29, Canteiro Central, em frente ao Supermercado	LAGO SUL (RA XVI)	REPOSIÇÃO	Remanejamento de 06 PAS 10m, 78m de Kit 2x4mm² 253m de cabo	121,2207	R\$ 37.877,83
01/07/2026	26VRR297	929/2026 - DIAMANTE	Parque Estação Biológica (PqEB), atrás do Shopping	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Remoção de 03 postes de iluminação	0,0000	R\$ 0,00
01/07/2026	26VRR298	930/2026 - DIAMANTE	QR 407, Conjunto 9, Lote 15, Samambaia Norte	SAMAMBAIA (RA XII)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e	16,8710	R\$ 5.271,68
01/07/2026	26VRR299	931/2026 - DIAMANTE	EPIA Norte, entrada do Lago Norte	LAGO NORTE (RA XVIII)	REPOSIÇÃO	Reposição de 03 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e	50,6130	R\$ 15.815,04

Planilha de Serviços Executados com Uso do Banco de Crédito

Data Solicitação	No do Orçamento	Documento de Referência	Endereço	RA	Tipo Serviço	Descrição Serviço	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)	Custo em UC (Tab 37 Aditivo)
01/07/2026	26VRR300	050/2026 - DIAMANTE	DF-130 - Paranoá	PARANOÁ (RA VII)	REPOSIÇÃO	01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 17m de KIT	16,8710	R\$ 5.271,68
01/07/2026	26VRR301	932/2026 - DIAMANTE	EPPR DF-005, KM 4 (ponto de referência: Área Verde)	LAGO NORTE (RA XVIII)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 17m de KIT	16,8710	R\$ 5.271,68
01/07/2026	26VRR302	933/2026 - DIAMANTE	EPPR DF-005, KM 4 Norte, Lago Norte (ponto de referência: Estação de Metrô de São Paulo)	LAGO NORTE (RA XVIII)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 17m de KIT	16,8710	R\$ 5.271,68
01/07/2026	26VRR303	934/2026 - DIAMANTE	QNL - Viaduto Samambaia	TAGUATINGA (RA III)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 17m de KIT	16,8710	R\$ 5.271,68
01/07/2026	26VRR304	935/2026 - DIAMANTE	Estrada Parque Contorno (DF-001)	LAGO NORTE (RA XVIII)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 17m de KIT	16,8710	R\$ 5.271,68
01/07/2026	26VRR305	955/2026 - DIAMANTE	DF-180, Condomínio Bela Vista, Ceilândia - DF (Projeto 20050050)	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	26CEB953). Reposição de PAS 7,5m de PAS 7,5m	980,7473	R\$ 306.454,11
01/07/2026	26VRR306	956/2026 - DIAMANTE	INCRA — Renascidos em Pentecostes	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	28 braços pesados com luminárias LED 120W; 940 m de cabo de	366,4416	R\$ 114.502,01
01/07/2026	26VRR307	957/2026 - DIAMANTE	SQN 306 e 404 (Asa Norte), QN 12E Conj 02 (Riacho Fundo II) e 2000-01-0000-0000	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	• SQN 306 – Asa Norte (10/07): reposição de 01 PAD 7,5M LED	86,7114	R\$ 27.094,71
01/07/2026	26VRR308	958/2026 - DIAMANTE	Viaduto da Ponte do Bragueto	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 10m LED 150W, 13m de KIT, cabo 2x4mm ²	243,7863	R\$ 76.175,91
01/07/2026	26VRR309	959/2026 - DIAMANTE	SHIN QI 7 – área verde ao lado da pista	LAGO NORTE (RA XVIII)	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 10m, com luminária LED 150W e 13m de KIT	19,4777	R\$ 6.086,20
01/07/2026	26VRR310	960/2026 - DIAMANTE	Quadra 116 lotes 14/15, Avenida Recanto das Emas	RECANTO DAS EMAS (XV)	REPOSIÇÃO	Remanejamento de 01 PCR 16m e substituição de 92m de	29,9280	R\$ 9.351,60
01/07/2026	26VRR311	961/2026 - DIAMANTE	SQN 312 - Entre os Blocos C e D	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PAS 7,5m com luminária LED 150W e 11m de	18,8625	R\$ 5.893,97
01/07/2026	26VRR312	962/2026 - DIAMANTE	SQN – 312 Bloco D, em frente ao Comercio	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PAD 10m com luminárias LED 150W e 26m de KIT	26,8816	R\$ 8.399,69
01/07/2026	26VRR313	963/2026 - DIAMANTE	EPIG, embaixo do Viaduto	SUDOESTE/OCTOGONAL (RA XXII)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PAD 10m com luminárias LED 150W e 26m de kit	26,8816	R\$ 8.399,69
01/07/2026	26VRR314	964/2026 - DIAMANTE	Condomínio Centro Clinico Sul, SHLS 716, Conjunto L, Asa Sul, Brasília-DF	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO 01 PAS 5M, 16M DE CABO 4X10MM, 04M3 DE	7,0444	R\$ 2.201,16
01/07/2026	26VRR315	965/2026 - DIAMANTE	Viaduto da Ponte Honestino Guimarães	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	296 M DE MND, 341M DE CABO 4X4M2, 738M DE CABO 4X10MM2	719,8292	R\$ 224.925,03

Planilha de Serviços Executados com Uso do Banco de Crédito

Data Solicitação	No do Orçamento	Documento de Referência	Endereço	RA	Tipo Serviço	Descrição Serviço	Orçamento em UC (Tab 37 Aditivo)	Custo em UC (Tab 37 Aditivo)
01/07/2026	26VRR316	967/2026 - DIAMANTE	Granja do Torto (estacionamento)	LAGO NORTE (RA XVIII)	REPOSIÇÃO	Substituição de 03 PCR 16m, 51m de Kit 4x4mm2 02 PCR 11M , RETIRADA DE 06 PAS 10M 53M DF MND	35,6202	R\$ 11.130,24
01/07/2026	26VRR317	968/2026 - DIAMANTE	QN 406 - ESCOLA CLASSE Nº 415	SAMAMBAIA (RA XII)	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 BP com luminária LED 72W.	95,1723	R\$ 29.738,49
01/07/2026	26VRR318	969/2026 - DIAMANTE	QR 02 Conjunto G, Lote 78	CANDANGOLÂNDIA (RA XIX)	REPOSIÇÃO	Reposição de 03 PCR 16m, 03 SUP 02 PET, luminárias LED 240W e Reposição de 01 PCR	0,0000	R\$ 0,00
01/07/2026	26VRR319	970/2026 - DIAMANTE	Canteiro central - DF 463	JARDIM BOTÂNICO (RA XXVII)	REPOSIÇÃO	16m, SUP 02 PET, luminárias LED	50,6130	R\$ 15.815,04
01/07/2026	26VRR320	978/2026 - DIAMANTE	Quadra 3, DF-463 - Canteiro Central, Jardins Mangueiral	JARDIM BOTÂNICO (RA XXVII)	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, SUP 04 PET, luminárias LED 240W e Reposição de 01 PCR	16,8710	R\$ 5.271,68
01/07/2026	26VRR321	979/2026 - DIAMANTE	Praça Central, ao lado do Skate Park	PARANOÁ (RA VII)	REPOSIÇÃO	16m, SUP 04 PET, luminárias LED 240W e Reposição de 01 PCR	26,8662	R\$ 8.394,88
01/07/2026	26VRR322	062/2026 - DIAMANTE	Q. 32 Conjunto M	PARANOÁ (RA VII)	REPOSIÇÃO	16m, SUP 04 PET, luminárias LED 240W e Substituição de 10	26,8662	R\$ 8.394,88
01/07/2026	26VRR323	980/2026 - DIAMANTE	SQS 409 - Calçada, Asa Sul	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	postes de aço de 5 m LED 40W 02 PCR , 03 BP LED	56,9250	R\$ 17.787,35
01/07/2026	26VRR324	985/2026 - DIAMANTE	QNM 10 CONJUNTO H	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	120W, 93M DE REDE ÁREA COM CABO TESTE DE 450M DE	56,2904	R\$ 17.589,06
01/07/2026	26VRR325	986/2026 - DIAMANTE	VIA W-6 (CABO PP CA 10MM2) PISTA CONTORNO DO PARQUE	PLANO PILOTO (RA I)	REPOSIÇÃO	CABO PP ALU 4X10MM2 LANCADO	655,1642	R\$ 204.719,16
01/07/2026	26VRR326	987/2026 - DIAMANTE	QUADRA 15 CASA 90 A , SETOR LESTE	GAMA (RA II)	REPOSIÇÃO	Retirada 01 PAD 7,5m , instalação 01 BP LED 120W	2,8647	R\$ 895,13
01/07/2026	26VRR327	988/2026 - DIAMANTE	DF 001 PRÓXIMO AO VIADUTO DO RIACHO FUNDO	RIACHO FUNDO II (RA XXI)	REPOSIÇÃO	01 PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	14,6865	R\$ 4.589,09
01/07/2026	26VRR328	989/2026 - DIAMANTE	QNP 30 CONJ J - CENTRO DE ENSINO 10	CEILÂNDIA (RA IX)	REPOSIÇÃO	01 PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	14,6865	R\$ 4.589,09
01/07/2026	26VRR329	990/2026 - DIAMANTE	VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ / NÚCLEO BANDEIRANTE	GUARÁ (RA X)	REPOSIÇÃO	01 RETIRADA DE PCR 16M	0,0000	R\$ 0,00

Lista de Serviços de Correção de Vandalismo e Reposições - Abr/2026 a Mar/2027

5.413,9811

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/07/2026	26VRR285	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 05m com luminária LED 40W, e 08m de KIT cabo 2x4mm ² .		9,0	8,0001	8,1533
01/07/2026			PAS 5M LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	1,0	5,6925	5,6925
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	8,0	0,3076	2,4608
01/07/2026	26VRR286	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 pcr16, e reposição de 01 PCR 16m, SUP 04 PET, luminárias LED 240W e 17m de KIT cabo 4x4mm ² .		22,0	14,8150	26,8662
01/07/2026			NR	Não Remunerado	1,0	0,0000	0,0000
01/07/2026			PCR 16M SUP 4 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	3,0	4,9976	14,9928
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/07/2026	26VRR287	REPOSIÇÃO	Execução de 289m de MND, 56m de kit cabo 2x4mm ² , 34m de kit cabo 2x4mm ² , 392m de cabo 4x4mm ² , 477m de cabo 4x10mm ² e 193m de cabo 4x35mm ² ALU, 145m3 de Vala, 08 Bpled 120W, 02 pcr 16m sup 2 pet Led 240W		1.598,0	20,1740	615,5801
01/07/2026			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	289,0	0,8877	256,5453
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	56,0	0,3076	17,2256
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	34,0	0,3076	10,4584
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	392,0	0,1285	50,3720
01/07/2026			CABO 4X10MM2	Instalação de Cabo 4x10 mm2	477,0	0,2078	99,1206
01/07/2026			CABO 4X35MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x35 mm ²	193,0	0,3322	64,1146
01/07/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	145,0	0,4514	65,4530
01/07/2026			BP LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	8,0	2,8647	22,9176
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	2,0	4,9976	9,9952
01/07/2026	26VRR288	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 pcr 16m, reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 17m de cabo 4x4mm ² .		20,0	14,8150	16,8710
01/07/2026			NR	Não Remunerado	1,0	0,0000	0,0000
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/07/2026	26VRR289	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 pcr 16m, reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 17m de cabo 4x4mm².		20,0	14,8150	16,8710
01/07/2026			NR	Não Remunerado	1,0	0,0000	0,0000
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/07/2026	26VRR290	REPOSIÇÃO	Instalado 01 poste de aço de 7,5m com luminária LED 150W, e 11m de cabo 2x4mm².		12,0	15,7865	18,8625
01/07/2026			PAS 7,5M 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	11,0	0,3076	3,3836
01/07/2026	26VRR291	REPOSIÇÃO	Reposição de 07 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W, 119m de Kit 4x4mm², 273m de cabo 4x10mm², 68m3 de vala.		474,0	15,4742	205,5216
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	7,0	9,6889	67,8223
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	7,0	4,9976	34,9832
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	119,0	0,1285	15,2915
01/07/2026			CABO 4X10MM2	Instalação de Cabo 4x10 mm2	273,0	0,2078	56,7294
01/07/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	68,0	0,4514	30,6952
01/07/2026	26VRR292	REPOSIÇÃO	Substituição de 05 PCR 16m, reposição de 04 PAS 7,5m LED 120W, 44m de Kit 2x4mm2.		57,0	27,7998	133,1921
01/07/2026			PCR 16M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	5,0	9,6889	48,4445
01/07/2026			PAS 7,5M LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V2)	4,0	14,9386	59,7544
01/07/2026			LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	4,0	2,8647	11,4588
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	44,0	0,3076	13,5344
01/07/2026	26VRR293	REPOSIÇÃO	Substituído 01 PAS de 10m, 13m kit cabo 2x4mm2.		14,0	15,7865	19,4777
01/07/2026			PAS 10 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	13,0	0,3076	3,9988
01/07/2026	26VRR294	REPOSIÇÃO	Reposição de 19 BP, com luminárias LED 150W, 133m de KIT cabo 2x4mm², 17m de KIT 4x4mm2, 1209m de cabo 4x16mm² ALU aéreo, reposição de instalação de 05 postes circular, 01 PCR 16m sup 2 pet led 240W.		1.385,0	16,8322	490,6192
01/07/2026			BP LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	19,0	3,4051	64,6969
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	133,0	0,3076	40,9108
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/07/2026			CABO 4X16MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x16 mm²	1.209,0	0,3045	368,1405
01/07/2026			NR	Não Remunerado	5,0	0,0000	0,0000

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/07/2026	26VRR295	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, risco de queda.		1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026	26VRR296	REPOSIÇÃO	Remanejamento de 06 PAS 10m, 78m de Kit 2x4mm ² , 253m de cabo 4x4mm ² , 55m3 de vala, 32m de MND.		424,0	3,6882	121,2207
01/07/2026			REMANEJAMENTO COM POSTE	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	6,0	1,9140	11,4840
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	78,0	0,3076	23,9928
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	253,0	0,1285	32,5105
01/07/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	55,0	0,4514	24,8270
01/07/2026			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	32,0	0,8877	28,4064
01/07/2026	26VRR297	REPOSIÇÃO	Remoção de 03 postes de iluminação		3,0	0,0000	0,0000
01/07/2026			NR	Não Remunerado	3,0	0,0000	0,0000
01/07/2026	26VRR298	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 17m de KIT cabo 4x4mm ² .		19,0	14,8150	16,8710
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/07/2026	26VRR299	REPOSIÇÃO	Reposição de 03 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 51m de KIT cabo 4x4mm2.		57,0	14,8150	50,6130
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	3,0	9,6889	29,0667
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	3,0	4,9976	14,9928
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	51,0	0,1285	6,5535
01/07/2026	26VRR300	REPOSIÇÃO	01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 17m de KIT cabo 4x4mm ² .		19,0	14,8150	16,8710
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/07/2026	26VRR301	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 17m de KIT cabo 4x4mm ² .		19,0	14,8150	16,8710
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/07/2026	26VRR302	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 17m de KIT cabo 4x4mm ² .		19,0	14,8150	16,8710
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/07/2026	26VRR303	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W, 17m de KIT 4x4mm2.		19,0	14,8150	16,8710
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/07/2026	26VRR304	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 17m de KIT cabo 4x4mm².		19,0	14,8150	16,8710
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/07/2026	26VRR305	REPOSIÇÃO	(Projeto 26CEB953).Reposição de PAS 7,5 m, reposição de 76 braços (15 retirada de braços fora de padrão), 609m de KIT 2x4mm², 900 m de rede aérea de BT (cabo multiplex 4x16mm²), 321 m de cabo 4x4 mm² subterrâneo, 80m3 de vala.		1.986,0	7,0079	986,7473
01/07/2026			PAS 7,5M LED 70W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V3)	76,0	5,8159	442,0084
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm², cobre, Classe-2.	609,0	0,3076	187,3284
01/07/2026			CABO 4X16MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x16 mm²	900,0	0,3045	274,0500
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	321,0	0,1285	41,2485
01/07/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	80,0	0,4514	36,1120
01/07/2026	26VRR306	REPOSIÇÃO	28 braços pesados com luminárias LED 120W; 940 m de cabo de alumínio quadruplex 4x16 mm².		968,0	3,1682	366,4416
01/07/2026			BP LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	28,0	2,8647	80,2116
01/07/2026			CABO 4X16MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x16 mm²	940,0	0,3045	286,2300
01/07/2026	26VRR307	REPOSIÇÃO	• SQN 306 – Asa Norte (10/07): reposição de 01 PAD 7,5M LED 120W, 22m de kit 2x4mm2; • SQN 404 Bl. O/H – Asa Norte (10/07): reposição de 02PAS 5M LED 40W, 32m de cabo 4x4mm2, 08 m3 de vala, 14m de kit 2x4mm2; • QN 12E Conj 02 – Riacho Fundo II (14/07): isolação de 02 postes de concreto, instalação de 02 BP LED 120W, 14m de kit 2x4mm2, 55 m de cabo quadruplex 4x16 mm² ALU; • QI 02 Conj D – Guará (10/07): reposição de 01 PAS 10m LED 150W, 13m de kit 2x4mm2		179,0	32,7283	86,7114
01/07/2026			PAD 7,5M LED 120W		1,0	0,0000	0,0000
01/07/2026			LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	1,0	2,8647	2,8647

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	22,0	0,3076	6,7672
01/07/2026			PAS 5M LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	2,0	5,6925	11,3850
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	32,0	0,1285	4,1120
01/07/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	8,0	0,4514	3,6112
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	14,0	0,3076	4,3064
01/07/2026			BP LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	2,0	2,8647	5,7294
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	14,0	0,3076	4,3064
01/07/2026			CABO 4X16MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x16 mm ²	55,0	0,3045	16,7475
01/07/2026			PAS 10M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	13,0	0,3076	3,9988
01/07/2026			LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	1,0	3,4051	3,4051
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	13,0	0,3076	3,9988
01/07/2026	26VRR308	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 10m LED 150W, 13m de KIT cabo 2x4mm ² , 538m de cabo 4x16mm ² ALU, duto 2", 134m3 de Vala.		686,0	16,5424	243,7863
01/07/2026			PAS 10M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	13,0	0,3076	3,9988
01/07/2026			CABO 4X16MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x16 mm ²	538,0	0,3045	163,8210
01/07/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	134,0	0,4514	60,4876
01/07/2026	26VRR309	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PAS 10m, com luminaria LED 150W e 13m de KIT cabo 2x4mm ² .		14,0	15,7865	19,4777
01/07/2026			PAS 10M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	13,0	0,3076	3,9988
01/07/2026	26VRR310	REPOSIÇÃO	Remanejamento de 01 PCR 16m e substituição de 92m de cabo 4x16mm ² ALU aéreo.		93,0	2,2185	29,9280
01/07/2026			REMANEJAMENTO PCR 16M	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	1,0	1,9140	1,9140
01/07/2026			CABO 4X16MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x16 mm ²	92,0	0,3045	28,0140
01/07/2026	26VRR311	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PAS 7,5m com luminária LED 150W, e 11m de KIT cabo 2x4mm ² .		12,0	15,7865	18,8625
01/07/2026			PAS 7,5M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	11,0	0,3076	3,3836
01/07/2026	26VRR312	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PAD 10m com luminárias LED 150W e 26m de KIT cabo 2x4mm ² .		28,0	19,1916	26,8816

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/07/2026			PAD 10M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/07/2026			LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	1,0	3,4051	3,4051
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	26,0	0,3076	7,9976
01/07/2026	26VRR313	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PAD 10m com luminárias LED 150W e 26m de kit cabo 2x4mm ² .		26,0	19,1916	26,8816
01/07/2026			PAD 10M LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V1)	1,0	15,4789	15,4789
01/07/2026			LED 150W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V1)	1,0	3,4051	3,4051
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	26,0	0,3076	7,9976
01/07/2026	26VRR314	REPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO 01 PAS 5M, 16M DE CABO 4X10MM, 04M3 DE VALA		21,0	2,5732	7,0444
01/07/2026			REMANEJAMENTO COM POSTE	Remanejamento de 1 (um) ponto de luz com poste	1,0	1,9140	1,9140
01/07/2026			CABO 4X10MM2	Instalação de Cabo 4x10 mm2	16,0	0,2078	3,3248
01/07/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	4,0	0,4514	1,8056
01/07/2026	26VRR315	REPOSIÇÃO	296 M DE MND, 341M DE CABO 4X4M2, 738M DE CABO 4X10MM2, 239M DE CABO 4X25MM2, 255M3 DE VALA, 02 PCR , 01 PCR 16M SUP 2 PET LED 240W, 17M DE KIT CABO 2X4MM2, 02 HASTES DE ATERRAMENTO E 20M DE CORDOALHA.		1.912,0	26,7998	719,8292
01/07/2026			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	296,0	0,8877	262,7592
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	341,0	0,1285	43,8185
01/07/2026			CABO 4X10MM2	Instalação de Cabo 4x10 mm2	738,0	0,2078	153,3564
01/07/2026			CABO 4X25MM2	Instalação de Cabo 4x25 mm2	239,0	0,4414	105,4946
01/07/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	255,0	0,4514	115,1070
01/07/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/07/2026			CABO 2X4MM2	Cabo alimentador - um metro linear - cabo PP 2x4mm ² , cobre, Classe-2.	17,0	0,3076	5,2292
01/07/2026			NR	Não Remunerado	2,0	0,0000	0,0000
01/07/2026			NR	Não Remunerado	20,0	0,0000	0,0000
01/07/2026	26VRR316	REPOSIÇÃO	Substituição de 03 PCR 16m, 51m de Kit 4x4mm2.		54,0	9,8174	35,6202
01/07/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	3,0	9,6889	29,0667
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	51,0	0,1285	6,5535
01/07/2026	26VRR317	REPOSIÇÃO	02 PCR 11M , RETIRADA DE 06 PAS 10M, 53M DE MND, 142M DE CABO 4X4MM2.		203,0	15,9548	95,1723
01/07/2026			PCR 11M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V2)	2,0	14,9386	29,8772
01/07/2026			NR	Não Remunerado	6,0	0,0000	0,0000

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/07/2026			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	53,0	0,8877	47,0481
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	142,0	0,1285	18,2470
01/07/2026	26VRR318	REPOSIÇÃO	Retirada de 01 BP com luminária LED 72W.		1,0	0,0000	0,0000
01/07/2026			NR	Não Remunerado	1,0	0,0000	0,0000
01/07/2026	26VRR319	REPOSIÇÃO	Reposição de 03 PCR 16m, 03 SUP 02 PET, luminárias LED 240W e 51m de KIT cabo 4x4mm ² .		57,0	14,8150	50,6130
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	3,0	9,6889	29,0667
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	3,0	4,9976	14,9928
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	51,0	0,1285	6,5535
01/07/2026	26VRR320	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 02 PET, luminárias LED 240W, 17m de KIT cabo 4x4mm ² .		19,0	14,8150	16,8710
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/07/2026	26VRR321	REPOSIÇÃO	Substituição de 01 PCR 16m, SUP 04 PET, luminárias LED 240W e 17m de KIT cabo 4x4mm ² .		21,0	14,8150	26,8662
01/07/2026			PCR 16M SUP 4 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	3,0	4,9976	14,9928
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/07/2026	26VRR322	REPOSIÇÃO	Reposição de 01 PCR 16m, SUP 04 PET, luminárias LED 240W e 17m de KIT cabo 4x4mm ² .		21,0	14,8150	26,8662
01/07/2026			PCR 16M SUP 4 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	3,0	4,9976	14,9928
01/07/2026			CABO 4X4MM2	Instalação de Cabo 4x4 mm2	17,0	0,1285	2,1845
01/07/2026	26VRR323	REPOSIÇÃO	Substituição de 10 postes de aço de 5 m LED 40W		10,0	5,6925	56,9250
01/07/2026			PAS 5M LED 40W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V4)	10,0	5,6925	56,9250
01/07/2026	26VRR324	REPOSIÇÃO	02 PCR , 03 BP LED 120W, 93M DE REDE AÉREA COM CABO 4XMM2 ALU		98,0	12,8581	56,2904
01/07/2026			PCR 16 M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	2,0	9,6889	19,3778
01/07/2026			BP LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	3,0	2,8647	8,5941
01/07/2026			CABO 4X16MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x16 mm ²	93,0	0,3045	28,3185
01/07/2026	26VRR325	REPOSIÇÃO	TESTE DE 450M DE CABO PP ALU 4X10MM2 LANÇADO NO SOLO, 02 PCR 11 M, 557M3 DE VALA, 143=13M DE CABO 4X16MM2 ALU, 463M DE CABO 4X25MM2 ALU, 78M CABO 4X35MM2 ALU, , 1504M DE DUTO CORRUGADO, 28M DE MND.		3.225,0	17,5265	655,1642

Data	Nº Orçamento	Tipo Serviço	Descrição	Correspondente Tabela 37	Qtde	UC Und	UC Total
01/07/2026			CABO 4X10MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x10 mm ²	450,0	0,2966	133,4700
01/07/2026			PCR 11M	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (V2)	2,0	14,9386	29,8772
01/07/2026			VALA	Rede Subterrânea de IP - Método Destrutivo (MD)	557,0	0,4514	251,4298
01/07/2026			CABO 4X16MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x16 mm ²	143,0	0,3045	43,5435
01/07/2026			CABO 4X25MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x25 mm ²	463,0	0,3155	146,0765
01/07/2026			CABO 4X35MM2 ALU	Cabo de alumínio classe 2 (isolação 0,6/1,0kV) 4x35 mm ²	78,0	0,3322	25,9116
01/07/2026			NR	Não Remunerado	1.504,0	0,0000	0,0000
01/07/2026			MND	Rede Subterrânea de IP - Método Não Destrutivo (MND) - Eletroduto Tubo Corrugado PEAD 2"	28,0	0,8877	24,8556
01/07/2026	26VRR326	REPOSIÇÃO	Retirada 01 PAD 7,5m , instalação 01 BP LED 120W		2,0	2,8647	2,8647
01/07/2026			NR	Não Remunerado	1,0	0,0000	0,0000
01/07/2026			BP LED 120W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (V2)	1,0	2,8647	2,8647
01/07/2026	26VRR327	REPOSIÇÃO	01 PCR 16M SUP 2 PET LED 240W		2,0	14,6889	14,6889
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/07/2026	26VRR328	REPOSIÇÃO	01 PCR 16M SUP 2 PET LED 240W		2,0	14,6889	14,6889
01/07/2026			PCR 16M SUP 2 PET LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz com poste (Praça)	1,0	9,6889	9,6889
01/07/2026			LED 240W	Instalação de 1 (um) ponto de luz sem poste (Praça)	1,0	4,9976	4,9976
01/07/2026	26VRR329	REPOSIÇÃO	01 RETIRADA DE PCR 16M		1,0	0,0000	0,0000
01/07/2026			NR	Não Remunerado	1,0	0,0000	0,0000
